

MAG - Ministerio de Agricultura y Ganadería
Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada
Dirección de Gestión de Proyectos de Irrigación Parcelaria Tecnificada

PROYECTO: K005 MAG-Fomento a la producción agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria

Líder del Proyecto:	Pablo Andrés, Cornejo Hidalgo (pcornejo@mag.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Pablo Andrés, Cornejo Hidalgo	Programas Relacionados:	IE -GMNA - GRAN MINGA NACIONAL AGROPECUARIA
Titular:	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	11.00
CUP:	133600000.0000.375447	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	54,474,685.18
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	20/10/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

DATOS GENERALES

Descripción

Fomentar la optimización integral del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en zonas definidas por el MAGAP (predios Plan Tierras; áreas agropecuarias de sistemas uniprovinciales, biprovinciales y multipropósitos; zonas deficitarias) y la generación permanente de estudios e información para el mejoramiento del manejo del recurso hídrico. La población beneficiaria corresponde a pequeños y medianos agricultores que enfocan su producción a seguridad y soberanía alimentaria dentro del área de intervención. PRODUCTO / SERVICIO: Para finales del año 2018: - 20% de la superficie en manos de pequeños y medianos productores incorporadas a riegotecnificado. - 66.411,36 ha con riego parcelario tecnificado en pequeños y medianos agricultores. - 31.886 beneficiarios directos del proyecto. Línea base- 942.100 hectáreas efectivamente regadas- 1.500.000 Área bajo infraestructura de riego- 303.829 ha agrícolas bajo riego, de pequeños y medianos productores- 50% de eficiencia de aplicación de agua en los métodos de riego. OBJETIVO GENERAL: -Implementar riego tecnificado parcelario para pequeños y medianos productores agrícolas a fin de impulsar la seguridad alimentaria y el cambio de la matriz productiva. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -Implementar tecnologías de uso y aprovechamiento del agua a nivel parcelario para y medianos productores. -Implementar sistemas de cosecha, almacenamiento y aprovechamiento de agua para pequeños y medianos productores a nivel nacional. -Impulsar la gestión ambiental y fortalecimiento de capacidades en la gestión social del agua para la producción agropecuaria.

Beneficios Cualitativos

Garantizar el acceso equitativo a la tecnología de riego parcelario. - Desarrollo productivo y bienestar de los productores y familias rurales.- Mejoramiento de calidad de vida de pequeños y medianos productores rurales garantizando el acceso a un ingreso digno y sostenible.- Contribución al Desarrollo Productivo de campesinos y agricultores en los sectores rurales que se encuentran en el área de influencia de los sistemas de riego. - Optimización del uso y aprovechamiento de los recursos hídricos para la agricultura. - Conservación de fuentes hídricas para riego - Productores con mejores prácticas de manejo de los recursos hídricos para la agricultura.- Disminuye consumo de energía: un productor puede ahorrar hasta 20 veces más energía que la que consume- Genera empleo: un productor familiar puede generar hasta 4 empleos por hectárea (contra 0.6 en promedio para la agricultura latifundista)- Utiliza el agua de manera mas eficiente: una hectárea de riego por gravedad usa la misma cantidad de agua que 4 hectáreas de riego tecnificado en promedio.

Tipo de Beneficiario

La población beneficiaria corresponde a pequeños y medianos agricultores que enfocan su producción a seguridad y soberanía alimentaria dentro del área de intervención, conforme lo que dicta el Plan Nacional del Buen Vivir.


Restricciones

TIEMPO: - El proyecto tiene una duración de 4 AÑOS (48 MESES) COSTO: - El costo total de la vida del proyecto es de USD 205.129.629,27 ALCANCE: - El proyecto se circunscribe a 17 provincias del territorio nacional, con una cobertura de 158 cantones en los que se encuentran: predios entregados por el Plan Tierras y zonas potenciales para tecnificar el riego parcelario donde existe la necesidad de implementar sistemas de cosecha de agua para la producción; y en los que se localiza el área de influencia de los sistemas multipropósito. RECURSOS: - 30 Técnicos (6 diseñadores de sistemas de riego, 6 técnicos de seguimiento y diagnóstico de zonas con aptitud agrícola, 6 técnicos fiscalizadores, 6 topógrafos, 6 técnicos de campo para análisis social y ambiental) - 15 vehículos para movilización

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.69 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

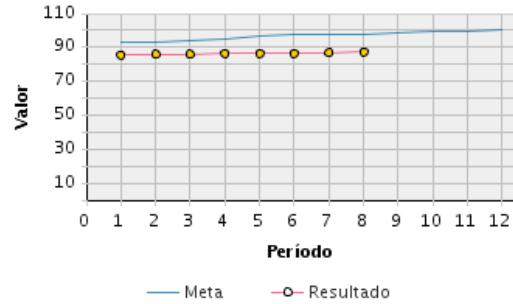

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	94 %	95 %	96 %	97 %	97 %	98 %	99 %	99 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	87 %	87 %	87 %				
Estado												
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2022 1. Del 19 al 23 de septiembre de 2022 se realizó una Visita Técnica de supervisión al Proyecto PIT por parte de funcionarios del Banco Mundial y AECID. 2. El 22 de septiembre de 2022 se suscribió la enmienda al contrato de obra del subproyecto Chiriyacu Lucero de la provincia de Loja, por un valor de USD 47.907,01 sin IVA y añadiéndose 30 días al plazo del convenio de obra. 3. El 28 de septiembre de 2022 se suscribió la enmienda al contrato de obra del subproyecto Cerezal Bellavista de la provincia de Santa Elena, por un valor de USD 90.107,85 sin IVA y añadiéndose 60 días al plazo del convenio de obra. 4. El 28 de septiembre de 2022 se suscribió el Acta de Transferencia del subproyecto El Paraíso de la provincia de El Oro.	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:33 AM
AGOSTO 2022 1. El 09 de agosto de 2022 se realizó el acto de transferencia de las obras del Cruz Gulac Rumi de la provincia de Azuay y La Playa de la provincia de Cañar. 2. El 15 de agosto de 2022 se suscribió la Tercera Enmienda de obra del subproyecto La Bélgica de la provincia de Guayas añadiéndose 60 días al plazo del convenio de obra. 3. El 15 de agosto de 2022 se suscribió la Segunda Enmienda de obra del subproyecto Las Mercedes de la provincia de Guayas añadiéndose 45 días al plazo del convenio de obra. 4. El 15 de agosto de 2022 se suscribió la Primera Enmienda de obra del subproyecto 17 de Abril Nueva Semilla por un valor de USD 52.813,24 sin IVA y añadiéndose 30 días al plazo del convenio de obra. 5. El 18 de agosto de 2022 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Sucuso. 6. El 26 de agosto de 2022 se recibió por parte del Banco Mundial la No Objeción de la adquisición de maquinaria y equipamiento para innovaciones agroambientales de los subproyectos La Y del Guineo, Estero Piedras, Huaquer, Sierra Morena, La Magdalena, Toacaso, Verde Pacayunga y Nueva Esperanza.	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:33 AM
JULIO 2022 1. El 07 de julio de 2022 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Limoncillo de la provincia de Los Ríos. 2. El 21 de julio de 2022 se realizaron los actos de transferencia de las obras Belisario Quevedo y Guayama San Pedro de la provincia de Cotopaxi.	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:32 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2022 1.El 22 de junio de 2022 se capacitó a los funcionarios y consultores de la Dirección Técnica del PIT en la Metodología del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del PIT, esta herramienta permite conocer permanentemente los avances que se generan en cada uno de los componentes que forman parte de los subproyectos PIT.</p>	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:32 AM
<p>MAYO 2022 1.El 31 de mayo de 2022 se realizó la Visita al subproyecto La Libertad de la provincia de Pichincha en conjunto con funcionarios de Banco Mundial, AECID, Unión Europea y Embajada de España, en la misma se constató el funcionamiento del sistema de riego y los resultados de la capacitación y asistencia técnica brindada a los beneficiarios del subproyecto.</p>	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:32 AM
<p>ABRIL 2022 1.Del 4 al 8 de abril de 2022 se realizó la 15 ava. Misión de supervisión del Proyecto de Irrigación Tecnificada por parte del Banco Mundial y AECID. 2.El 12 de abril de 2022 se suscribió el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto Santa Teresita de Guabug de la provincia de Chimborazo. 3.El 13 de abril de 2022 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto El Paraíso de la provincia de El Oro. 4.El 20 de abril de 2022 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Cruz Gulac Rumi de la provincia de Azuay.</p>	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:31 AM
<p>MARZO 2022 1.El 15 de marzo de 2022 se realizó el Evento de Rendición de Cuentas 2021 a la ciudadanía, realizado por medio virtual por el Coordinador del Proyecto de Irrigación Tecnificada encargado, en esta se presentaron los principales avances en la gestión técnica, administrativa y presupuestaria llevada a cabo durante el año 2021, en cumplimiento de la normativa establecida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.</p>	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:31 AM
<p>FEBRERO 2022 1.El 15 de febrero de 2022 se llevó a cabo el Comité Asesor del Proyecto - CAP, mismo que contó con la presencia del Ministro de Agricultura y Ganadería, en la misma se analizaron los principales avances de la gestión en el año 2021 y se presentó la planificación de los principales hitos para el año 2022. 2.El 23 de febrero de 2022 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Belisario Quevedo de la provincia de Cotopaxi. 3.El 26 de febrero de 2022 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto La Playa de la provincia de Cañar.</p>	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:30 AM
<p>ENERO 2022: 1.El 26 de enero de 2022 se aprobó por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería la Programación Anual de Planificación - PAP 2022, correspondiendo al Proyecto de Fomento a la Producción Agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico un monto de USD 16.759.659,99.</p>	Rodriguez Felix, Pamela Soledad	20/10/2022 - 08:29 AM
<p>DICIEMBRE 2021 1.El 7 de diciembre de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto Sucuso de la provincia de Chimborazo. 2.Del 13 al 17 de diciembre de 2021 se realizó una gira de visitas a diferentes subproyectos de la Costa ecuatoriana y se mantuvieron reuniones con tres Prefectos: Los Ríos, Santa Elena y Manabí para trazar hojas de ruta conjuntas y facilitar la implementación de los proyectos de riego.</p>	Toro Castro, Daniel Antonio	26/01/2022 - 01:01 PM
<p>NOVIEMBRE 2021 1.Del 9 al 11 de noviembre de 2021 el PIT, junto con el Banco Mundial y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) realizaron una gira de tres días por seis subproyectos de la Costa y la Sierra ecuatoriana. En la gira se visitaron subproyectos de riego tecnificado en Manabí (Las Ardillas y Arriaga), Cotopaxi (Guayama San Pedro), Pichincha (17 de Junio y Chambitola) e Imbabura (La Magdalena). También se visitó el Territorio Demostrativo Cangahua, ejecutado por Fundación Maquita e implementado con la Contribución Complementaria al PIT de la Unión Europea. 2.El 19 de noviembre de 2021, la Secretaría Nacional de Planificación mediante oficio SNP-SPN-2021-0877-OF, emite el Dictamen de Actualización de Prioridad por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025, del Proyecto Fomento a la Producción Agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria. 3.El 25 de noviembre de 2021, la Directora de The World Bank Group Bolivia, Chile, Ecuador y Perú mediante oficio 245-2021-BM-EC aprueba la extensión de plazo del Proyecto de Irrigación Tecnificada hasta el 31 de diciembre de 2022.</p>	Toro Castro, Daniel Antonio	26/01/2022 - 01:00 PM
<p>OCTUBRE 2021 1.Del 4 al 7 de octubre de 2021 se desarrolló la 14 ava. Misión de Supervisión al Proyecto de Irrigación Tecnificada por parte del Banco Mundial y AECID.</p>	Toro Castro, Daniel Antonio	26/01/2022 - 01:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.El 5 de octubre de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Definitiva de los subproyectos Nueva Esperanza y Sierra Morena de la provincia de Pichincha.</p> <p>3.El 29 de octubre de 2021 el PIT, junto con la Secretaría de Irrigación Parcelaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, inauguró el subproyecto de riego de Sucuso, en Chimborazo. Este sistema dotó de riego a 55.24 hectáreas y benefició a 45 familias productoras de alimentos.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2021</p> <p>1.El 3 de septiembre de 2021 se entrega por parte de la Dirección Jurídica del PIT la Resolución Administrativa de Adjudicación del Proceso Lote 3 y Lote 4, Inversiones en Prevención de Contaminación y Optimización del Uso del Recurso Hídrico en 14 subproyectos.</p> <p>2.El 8 de septiembre de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Putucay de la provincia de Azuay.</p> <p>3.El 9 de septiembre de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto Limoncillo de la provincia de Los Ríos.</p> <p>4.El 15 de septiembre de 2021 se entrega por parte de la Dirección Jurídica del PIT la Resolución Administrativa de Adjudicación del Proceso Lote 1 y Lote 2, Inversiones en Prevención de Contaminación y Optimización del Uso del Recurso Hídrico en 14 subproyectos.</p> <p>5.El 16 de septiembre de 2021 se suscribe el Contrato de Obra del subproyecto Santa Teresita de Guabug de la provincia de Chimborazo.</p>	<p>Toro Castro, Daniel Antonio</p>	<p>26/01/2022 - 01:00 PM</p>
<p>AGOSTO 2021</p> <p>1.El 12 de agosto de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Campo Alegre de la provincia de Tungurahua.</p> <p>2.El 17 de agosto de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto El Paraíso de la provincia de El Oro.</p> <p>3.El 17 de agosto de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto Mundug Yamate de la provincia de Tungurahua.</p> <p>4.El 17 de agosto de 2021 se suscribe por parte el Subsecretario de Irrigación Parcelaria Tecnificada la Resolución Administrativa 032 donde se aprueban las modificaciones del Manual Operativo del Proyecto MOP.</p> <p>5.El 18 de agosto de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Pimampiro de la provincia de Imbabura.</p>	<p>Toro Castro, Daniel Antonio</p>	<p>26/01/2022 - 12:59 PM</p>
<p>JULIO 2021</p> <p>1.El 15 de julio de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto Belisario Quevedo de la provincia de Cotopaxi.</p> <p>2.El 21 de julio de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto San Francisco de Orongo de la provincia de Bolívar.</p> <p>3.El 29 de julio de 2021 el Banco Mundial emite la No Objeción de los cambios propuestos en el Manual Operativo del Proyecto.</p> <p>4.El 30 de julio de 2021, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional en Ecuador presenta su No Objeción al Manual Operativo del Proyecto en los términos expresados por el Banco Mundial.</p> <p>5.El 30 de julio de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Puruhuaypamba de la provincia de Cotopaxi.</p>	<p>Toro Castro, Daniel Antonio</p>	<p>26/01/2022 - 12:59 PM</p>
<p>JUNIO 2021</p> <p>1.El 5 de junio de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto La Playa de la provincia de Cañar.</p> <p>2.El 22 de junio de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto Procafeq de la provincia de Loja.</p> <p>3.El 23 de junio de 2021 se envió el oficio Nro. MAG-SIPT-2021-0124-O, por parte del Subsecretario de Irrigación Parcelaria Tecnificada, al Ministerio de Finanzas solicitando la Ampliación de plazo, para prórroga de proyecto Fomento a la Producción Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico para el Desarrollo Rural y la Soberanía.</p> <p>4.El 28 de junio de 2021 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto Cruz Gulac Rumi de la provincia de Azuay.</p>	<p>Toro Castro, Daniel Antonio</p>	<p>26/01/2022 - 12:59 PM</p>
<p>MAYO 2021</p> <p>1. Debido a retrasos provocados por firmas de enmiendas de obra, así como también a condiciones climáticas desfavorables, y a la aplicación del estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional por presencia de COVID 19 en territorio nacional, no se pudo realizar la entrega recepción provisiona de las siguientes obras: Obras de riego tecnificado (hito 54). - Sucuso, Las Mercedes, Guayama San Pedro, El Paraíso, Cruz Gulac, Orongo y Limoncillo. Obras complementarias (hito 55). - Las Mercedes, y Cruz Gulac Rumi. Obras complementarias (hito 56). - Procafeq, Guayama San Pedro, El Paraíso, La Playa, y Orongo. Obras de riego tecnificado (hito 57). - Nueva Semilla y 16 de Abril.</p>	<p>Romero Solano, César Ricardo</p>	<p>03/06/2021 - 05:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. La Unidad de Gestión del Proyecto PIT, está realizando las acciones pertinentes para reprogramar los hitos.		
<p>Abril 2021:</p> <p>1. Con fecha 22 de abril de 2021 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Voluntad de Dios.</p> <p>2. Levantamiento de las encuestas de seguimiento de los subproyectos: a) El Marco de la parroquia Píntag del canton Quito de la provincial de Pichincha, y b) 17 de Junio de la parroquia Cangahua del canton Cayambe de la provincial de Pichincha.</p> <p>3. Se realizó la gestión ante la Coordinación General de Planificación para consulta de validez de reprogramación 2022 y análisis de espacio para incremento presupuestario del Proyecto de Fomento a la Producción Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria.</p>	Romero Solano, César Ricardo	25/05/2021 - 02:53 PM
<p>Marzo 2021:</p> <p>1. Transferencia de los sistemas de riego de los subproyectos Píllaro Norte y Píllaro Sur a favor de los beneficiarios.</p> <p>2. Con fecha 5 de marzo de 2021 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Píllaro Norte.</p> <p>3. Con fecha 12 de marzo de 2021 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto 17 de Junio.</p> <p>4. Con fecha 16 de marzo de 2021 se registraron los anticipos de obra de los subproyectos: Chambitola, 17 de Abril Nueva Semilla, La Bélgica, Cerezal Bellavista y Chiriyacu Lucero.</p> <p>5. Con fecha 22 de marzo de 2021 se suscribió el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto Y del Guineo.</p> <p>6. Se realizó el levantamiento de las encuestas de seguimiento al subproyecto Palmar Grande de la parroquia Monteolivo del cantón Bolívar, provincia del Carchi.</p>	Romero Solano, César Ricardo	25/05/2021 - 02:51 PM
<p>Febrero 2021:</p> <p>1. La semana del 22 al 26 de febrero de 2021 se llevó a cabo la décimo tercera Misión de Supervisión, por parte de Banco Mundial y AECID, que tuvo como objetivos: i) analizar, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, los avances logrados en la implementación de 48 subproyectos desde la última supervisión realizada en octubre 2020; ii) revisar las acciones a desarrollar para acelerar el ritmo de formulación del último grupo de subproyectos hasta marzo 2021; (iii) monitorear el avance en los resultados esperados del PIT, al 30 de junio del 2021; iv) apoyar a la Unidad de Gestión para lograr una buena implementación del Proyecto, en todos los aspectos, especialmente en salvaguardas y adquisiciones; y v) analizar los avances del sistema de monitoreo y evaluación.</p> <p>2. Con fecha 26 de febrero de 2021 se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto Píllaro Sur.</p>	Romero Solano, César Ricardo	25/05/2021 - 02:48 PM
<p>Enero 2021:</p> <p>1. Se realizó el informe de pagos pendientes del año 2020, y se establecieron los compromisos y pagos solicitados que no se alcanzaron a efectuar.</p> <p>2. Se remitió al Ministerio de Finanzas la información correspondiente al proceso de segunda ampliación de plazo del Proyecto de Irrigación Tecnificada.</p> <p>3. Se realizó el levantamiento de las encuestas de seguimiento en el subproyecto La Libertad de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha.</p>	Romero Solano, César Ricardo	25/05/2021 - 02:46 PM
<p>Diciembre 2020:</p> <p>1. Se adjudicaron y se suscribieron los contratos de las siguientes obras: Chiriyacu Lucero en la provincia de Loja, Chambitola en la provincia de Pichincha, Nueva Semilla - 17 de Abril en la provincia de Los Ríos, Las Ardillas en la provincia de Manabí, Arriaga en la provincia de Manabí, Cerezal Bellavista en la provincia de Santa Elena y La Bélgica en la provincia de Guayas.</p> <p>2. Mediante resolución Nro. 0102 el Viceministro de Finanzas autoriza la ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2021.</p> <p>3. Se suscribió el Acta Entrega Recepción Provisional de los subproyectos "Campo Alegre" y "Puruhuaypamba".</p>	Romero Solano, César Ricardo	25/05/2021 - 02:46 PM
<p>Noviembre 2020:</p> <p>1. Se adjudicó y se suscribió el contrato de la obra Belisario Quevedo en la provincia de Cotopaxi.</p> <p>2. Se elaboró el Informe de Elegibilidad del subproyecto "Santa Teresita de Guabug" para presentación al Comité de Evaluación, Control y Seguimiento SECS; de la misma manera se realizó la primera revisión del subproyecto "La Rinconada".</p> <p>3. Se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva del subproyecto "Verde Pacayunga".</p>	Romero Solano, César Ricardo	12/02/2021 - 08:24 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Se suscribió el Acta Entrega Recepción Provisional del subproyecto "Pinguilí".</p> <p>Octubre 2020:</p> <p>1. Mediante oficio STPE-SPN-2020-0897-OF se emitió el Criterio Favorable a la Certificación Presupuestaria Plurianual, por parte del Subsecretario de Planificación Nacional, por un monto total de US\$ 12.456.996,02 a ser financiados con recursos de préstamos externos del Banco Mundial y AECID para el período 2020-2021.</p> <p>2. Mediante memorando MAG-MAG-2020-0595-OF, el Ministro de Agricultura y Ganadería remite al Ministerio de Finanzas la solicitud de ampliación de plazo desde el 30 de junio de 2021, por 21 meses, hasta el 31 de marzo de 2023.</p> <p>3. Del 5 al 13 de octubre se llevó a cabo la Décima Segunda Misión de Supervisión al Proyecto PIT por parte del Banco Mundial y AECID.</p>	Romero Solano, César Ricardo	12/02/2021 - 08:23 AM
<p>Septiembre 2020:</p> <p>1. Se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva de los subproyectos "La Libertad" y "Santa Ana".</p> <p>2. Se emitió el Informe de Validación del Proceso de Contratación del Técnico Eléctrico, así como para la contratación de los Auxiliares del PIT.</p> <p>3. Se contrató al Técnico Social Guayas, Los Ríos y Santa Elena 2.</p>	Romero Solano, César Ricardo	12/02/2021 - 08:22 AM
<p>Agosto 2020:</p> <p>1. Se adjudicó y se suscribió el contrato de la obra Guayama San Pedro en la provincia de Bolívar.</p> <p>2. Se suscribió el Acta Entrega Recepción Definitiva de los subproyectos "General Plaza", La "Paquita", "Toacaso" y "Huaquer".</p> <p>3. Se suscribió el Acta Entrega Recepción Provisional de los subproyecto "Píllaro Norte", "Píllaro Sur", "Y del Guineo" y "17 de Junio".</p>	Romero Solano, César Ricardo	12/02/2021 - 08:16 AM
<p>Julio 2020:</p> <p>1. Mediante oficio SGSEP-2020-0363-O se emitió el aval del informe justificativo para el incremento presupuestario del proyecto "Fomento a la Producción Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria" por parte de la Secretaria del Gabinete Sectorial Económico y Productivo, por un monto de USD 9.953.139,57 financiado de la siguiente forma: USD 8.137.099,57 con recursos del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo BIRF-BM y USD 1.816.040 con recursos del Instituto de Crédito Oficial del Reino de España - AECID.</p>	Romero Solano, César Ricardo	12/02/2021 - 08:15 AM
<p>Junio 2020</p> <p>El sub proyecto Estero Piedras en la provincia del Azuay cuenta con Acta de Recepción Definitiva.</p> <p>Se está preparando el documento justificativo para ampliación del techo presupuestario que pueda financiar el inicio de 11 obras nuevas de infraestructura.</p> <p>En vista de que el ICO no financiará valores correspondientes al IVA se trabaja en la suscripción de una adenda para que los proyectos financiados por ICO (Unión Europea) puedan ser financiados con la misma fuente de la obra.</p> <p>Obtener las certificaciones presupuestarias para suscribir la totalidad de las enmiendas y pago de planillas de arrastre de obra con nueva fuente de financiamiento del IVA.</p>	Romero Solano, César Ricardo	14/07/2020 - 10:02 PM
<p>Mayo 2020:</p> <p>Se cuenta con la suscripción de una adenda al Convenio de Crédito entre el MEF y Banco Mundial y se está realizando el seguimiento a la firma de la adenda de ICO que permita el financiamiento del IVA por parte de los fondos de la Unión Europea.</p> <p>Se suscribieron parte de las enmiendas para montos complementarios y/o nuevos para las obras pendientes.</p>	Romero Solano, César Ricardo	14/07/2020 - 10:01 PM
<p>Abril 2020:</p> <p>Avance correspondiente a 21 obras de proyectos de riego parcelario a nivel nacional desde inicio del año, de las cuales 5 cuentan con acta de recepción provisional, 1 en la que se ha solicitado la recepción provisional y un avance promedio del 60% considerando que la mayoría de obras iniciaron el mes de mayo y otras en el mes de noviembre.</p>	Romero Solano, César Ricardo	14/07/2020 - 09:58 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se dio seguimiento y apoyo técnico para la suscripción de una adenda al Convenio de Crédito entre el MEF y Banco Mundial, que permita el financiamiento del IVA por parte del Banco Mundial.		
<p>Marzo 2020:</p> <p>Se cumplió con la suscripción de la enmienda con Banco Mundial mediante la cual, este prestamista financiará los valores correspondientes al IVA, los cuales cubría con anterioridad el estado ecuatoriano. 25 sub proyectos se encuentran en ejecución debido a que ya empezaron las obras de Las Mercedes, Campo Alegre, El Paraíso, Limoncillo y Puruhuaypamba. 7 obras se encuentran en etapa de recepción provisional de la obra.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/04/2020 - 07:25 PM
<p>Febrero 2020</p> <p>Debido a que no se entregaron los montos correspondientes al IVA (falta de asignación presupuestaria) no se pudieron realizar las certificaciones presupuestarias para el pago de arrastre de los proyectos, sin embargo se ha intentado no paralizar las obras que necesiten contratos complementarios para continuar su ejecución.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/04/2020 - 07:20 PM
<p>Enero 2020:</p> <p>En el mes de enero se programaron los gastos de acuerdo a los montos asignados por el Ministerio de Finanzas, de igual forma se prepararon los expedientes para tener listos todos los requisitos de las obras nuevas. 21 obras continúan su ejecución normal de acuerdo a los calendarios establecidos.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/04/2020 - 07:03 PM
<p>Diciembre 2019</p> <p>1.- Se realizó la Implementación de 2106 hectáreas con sistemas de irrigación parcelaria tecnificada por un monto \$ 7.708.898,05, beneficiando a 2823 familias de pequeños y medianos productores a en las siguientes provincias: Carchi, Tungurahua, Los Ríos, Pichincha, Loja, Imbabura, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Chimborazo. Dicha inversión incluye la instalación de sistemas de irrigación por aspersión, micro aspersión y goteo, así como la construcción de micro reservorios y reservorios comunitarios y arreglos a la infraestructura principal y secundaria de riego.</p> <p>2. Como complemento a las inversiones en infraestructura, se contrataron 9 planes de capacitación y asistencia técnica para los proyectos de irrigación culminados, los cuales tienen como propósito brindar acompañamiento para un mejor manejo de los cultivos bajo irrigación tecnificada, estos planes beneficiaron a 317 pequeños y medianos productores con una inversión de \$323.135,91 en proyectos de irrigación a nivel nacional.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 05:07 PM
<p>Noviembre 2019</p> <p>En este mes se iniciaron las obras Sucuso, Procafeq y Gulac Cruz Rumi, con lo cual suman 18 sub proyectos en ejecución, con un avance promedio del 70%, algunas de las obras paralizadas ya cuentan con la enmienda y pudieron continuar con los trabajos previstos. Gran parte de las hectáreas ya están operativas.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 05:00 PM
<p>Octubre 2019</p> <p>Como parte del Territorio Demostrativo La Paquita, se arrancó con una consultoría para determinar los caudales de 100 pozos someros y elaborar diseños modulares para 100 productores en los sectores aledaños. Unión Europea a través de los fondos LAIF asignó recursos a la ONG MAQUITA, para la ejecución del Territorio Demostrativo Cangahua, como contraparte del MAG se empezaron a levantar el DIO de las 14 organizaciones beneficiarias.</p> <p>Las 15 obras PIT registran un avance promedio del 65%, sigue en curso la aprobación de las enmiendas.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:54 PM
<p>Septiembre 2019</p> <p>Existen 15 sub proyectos en ejecución el avance de obra es del 52%. Se conformaron los expedientes técnicos para solicitar la certificación de los montos para enmiendas. La ENIP arranca sus módulos para administradores y gestores, así como la capacitación para asesores de riego, dedicados a técnicos.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:50 PM
<p>Agosto 2019</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Las 14 obras en ejecución tienen un avance promedio del 36%, de estas 14 obras, 9 tienen paralizaciones debido a enmiendas que están en proceso de aprobación para culminar los trabajos planificados.</p> <p>En acta de comité directivo LAIF se aprobaron las propuestas para Territorios Demostrativos en Las Mercedes y Cangahua para complementar los proyectos PIT con inversiones que mejoren producción y comercialización.</p>		
<p>Julio 2019</p> <p>Los contratistas de La Magdalena, La Libertad, Huaquer y Estero Piedras, han solicitado incremento de cantidades contractuales o rubros nuevos, los cuales necesitan una certificación presupuestaria para aprobar el pago de estas planillas, se ha optado por paralizar la obra mientras estas certificaciones se viabilizan.</p> <p>Santa Ana, Sierra Morena y Nueva Esperanza no registran planillas aprobadas debido a que iniciaron actividades en junio y julio de este año debido a causas no imputables al contratista y a pesar de contar con el anticipo en el mes de mayo.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:37 PM
<p>Junio 2019</p> <p>A junio del 2019 las 14 obras contratadas tienen un avance promedio del 22%, sin que se presenten grandes novedades. Las obras de arrastre del grupo I, el Marco, Voluntad de Dios y General Plaza, fueron recibidas provisionalmente y entran en un período de 6 meses de prueba.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:31 PM
<p>Mayo 2019</p> <p>Se encuentran en ejecución los siguientes sub proyectos con el siguiente detalle en cuanto a hectáreas y beneficiarios.</p> <p>NoSubproyectoPROVINCIA CANTÓN PARROQUIA Ha FAMILIAS 1HuaquerCarchiMiraJuan Montalvo33,8116 2PinguilíTungurahuaMochaPinguilí200304 3Píllaro NorteTungurahuaPíllaroSan Andres, Presidente Urbina304,21888 4Santa AnaLos RíosBabaGuare118,3133 5Sierra MorenaPichinchaQuitoPifo49,9639 6Nueva EsperanzaPichinchaQuitoPifo47,0126 7Píllaro SurTungurahuaPíllaroPíllaro5801316 8Y del GuineoLojaChaguarpambaSanta Rufina79,5666 9La MagdalenalmbaburalbarraAngochagua90,4462 10La LibertadPichinchaCayambeCangahua107,9195 11ToacazoCotopaxiLatacungaToacaso152,44159 12La Paquita GuayasNaranjitoNaranjito46158 13Estero PiedrasAzuayCuencaMolleturo164267 14Verde PacayungaEl OroChilla y PasajeChilla y Uzhcurrumi4530</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:29 PM
<p>Abril 2019</p> <p>Se encuentran en ejecución para los 11 sub proyectos del grupo 1, los respectivos planes de capacitación y asistencia técnica los cuales son ejecutados por empresas consultoras buscando acompañar la inversión en infraestructura con fortalecimiento de capacidades en producción y comercialización de productos agropecuarios.</p> <p>14 contratos del grupo 2, inició su ejecución en el mes de abril del presente año, tienen programaciones entre 4 a 9 meses de ejecución de obra; de igual forma tienen en su programación contemplada la contratación de planes de capacitación y asistencia técnica, los cuales se implementarán una vez que se concluyan los trabajos de infraestructura.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:13 PM
<p>Marzo 2019</p> <p>Presentación de 1 estudio de irrigación parcelaria tecnificada como parte de la meta de presentación de estudios al PIT para su financiamiento. Este logro se orienta a alcanzar las metas del año 2020 en implementación de ha de irrigación parcelaria tecnificada.</p> <p>Se preparó toda la información pre contractual de los contratados para la ejecución de contratos del grupo II.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:10 PM
<p>Febrero 2019</p> <p>Como ejecución de la ENIP se impartieron los siguientes módulos:</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3 módulos de capacitación impartidos a formadores de la Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria Tecnificada, parte de su programa ampliado de formadores.</p> <p>1 módulo de capacitación impartido del programa de capacitación a gestores y administradores de sistemas de riego de la Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria Tecnificada, parte de su programa ampliado de gestores y administradores</p>		
<p>Como parte del Proyecto PIT, se culminaron los procesos precontractuales de 10 sub proyectos con la respectiva entrega de anticipos. Con el objetivo de empezar a implementar las 2500 ha de irrigación previstas para este año con el proyecto de Fomento Enero 2019</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	14/01/2020 - 04:02 PM
<p>ENERO 2019</p> <p>El Marco Mediante el acta de "Recepción a satisfacción de los rubros nuevos", de fecha 25 de enero se ha recibido los nuevos rubros ejecutados. Mediante oficio número No 63-19, de 22 de enero de 2019, el Ing. Edgar Núñez, Contratista del Subproyecto, El Marco, remitió allng. Luis Heredia, Director Técnico de la UGP-PIT, los planos Asbuilt actualizados del subproyecto El Marco, además solicitó se realice la liquidación económica, pago de planillas No. 6 y Planilla de Rubros Nuevos, el Acta de Recepción Provisional y Acta Definitiva de las Obra. El Administrador de contrato, mediante oficio Nro. UGPPIIT-OFMN-002-EM, da respuesta al oficio número No 63-19, de 22 de enero de 2019 y solicita al contratista la siguiente información, para proceder a la recepción provisional: a) Hoja Técnica y garantías de las válvulas reguladoras de presión instaladas. b) Hoja Técnica y garantías de los aspersores instalados. c) Hoja Técnica y garantías las tuberías, accesorios y válvulas de aire. O cualquier documento remitido por el fabricante que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales instalados en el subproyectos así como la garantía de los mismos.</p> <p>General Plaza El Administrador del contrato se encuentra a la espera de las correcciones del informe de fiscalización previo a la recepción provisional ya que este presentaba errores.</p> <p>Voluntad de Dios Mediante oficio s/n de fecha 03 de enero de 2019, se remitió el levantamiento de la suspensión de trabajos a partir de lunes 07 de enero de 2019 con 21 días de plazo. Mediante el oficio Nro. UGPPIIT-OFMN-002-VD de fecha 28 de enero de 2019 el administrador considera pertinente se suspendan los trabajos a partir del 29 de enero de 2019 CON la finalidad de analizar el funcionamiento del sistema instalado.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	01/02/2019 - 11:30 AM
<p>DICIEMBRE</p> <p>El Marco Con oficio Nro. MRC-61-18de 12 de diciembre el Ingeniero Mario Aguilar remitió la planilla de rubros nuevos de Obra para el trámite correspondiente. Con oficio Nro. MRC-62-18de 14 de diciembre el Ingeniero Mario Aguilar remitió la planilla l de liquidación de Obra para el trámite correspondiente. Mediante memorando Nro. MAG-PIT-2018-0592-M de 27 de diciembre de 2018, el Ing. Luis Heredia, Coordinador Subrogante del proyecto de irrigación Tecnificada para pequeños y Medianos Productores y Productoras, notificó la designación de cambio de administrador de contrato del convenio de Obra Nro. LPN-PIT-001-2016. El 27 de diciembre mediante correo electrónico el nuevo Administrador solicitó al Ing. Mario Aguilar y allng. Washington Cepeda un informe del estado actual del Sub proyecto.</p> <p>General Plaza Con fecha 17 de noviembre de 2018 la contratista solicita a la fiscalización la recepción provisional de la obra, una vez que se ha terminado la ejecución de los rubros. El informe de fiscalización previo a la recepción provisional presentaba errores, por lo que se solicitó se corrija el informe. Se está a la espera del informe corregido para proceder con la conformación del comité de recepción.</p> <p>Voluntad de Dios Mediante el memorando Nro. MAG-DAFPIT-2018-1019-M, de 06 de diciembre de 2018, la Ing. Nathalia Cano Rodao - Directora Administrativa Financiera del PIT, certificó la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de las inversiones adicionales para obras complementarias del subproyecto.</p>	Toledo Medina, Cristian Norman	01/02/2019 - 11:18 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante el memorando Nro. MAG-DTPIT-2018-1227-Mde 26 de diciembre de 2018, se solicitó a la Coordinación de la UGP-PIT, la suscripción de la segunda enmienda. El 27 de diciembre de 2018, se suscribió la segunda enmienda al Convenio Nro. LPN PIT-011-2016.</p> <p>Al momento la obra se encuentra suspendida, se planifica el reinicio de los trabajos para el día 7 de enero de 2019.</p>		
<p>NOVIEMBRE</p> <p>General Plaza Con fecha 14 de noviembre de 2018, se suscribió la Enmienda al Convenio de Obra Nro. EC-MAGAP-8176-036, entre la Unidad de Gestión del Proyecto de Irrigación Tecnificada para pequeños y Medianos Productores y Productoras UGP PIT, y NETAFIMECUADORS.A., cuyo objeto es la ejecución de incrementos y cantidades y rubros nuevos, considerados por un monto que asciende a \$235.097,37.</p> <p>Mediante Oficio S/N de fecha 14 de noviembre de 2018, el Ing. Carlos Sánchez Altamirano, en calidad de Administrador del convenio de obra antes referido, levanta la suspensión de obra y puso como fecha límite para la ejecución de los rubros considerados en la enmienda suscrita, el 17 de noviembre de 2018.</p> <p>Los rubros han sido ejecutados por el contratista en el plazo establecido y las planillas se encuentran en trámite.</p> <p>Voluntad de Dios Mediante Memorando Nro. MAG-DTPIT-2018-1120-M de fecha 23 de noviembre de 2018, se solicitó a la Dirección Administrativa Financiera de la UGP-PIT, la emisión de la certificación presupuestaria a fin de suscribir la segunda enmienda.</p>	<p>Toledo Medina, Cristian Norman</p>	<p>01/02/2019 - 11:02 AM</p>
<p>OCTUBRE</p> <p>El Marco Mediante Oficio Nro. MRC-57-18, el Administrador del Convenio del Subproyecto "El Marco" aprueba la prórroga de plazo hasta el 20 de noviembre de 2018.</p> <p>General Plaza Mediante oficio s/n de fecha 01 de octubre de 2018, el Administrador del Convenio del subproyecto "General Plaza", levanta la suspensión, además menciona que el plazo para la ejecución de todos los trabajos comprendidos en inversiones adicionales es de 30 días, contados a partir (incluido) el 11 de octubre de 2018, por lo tanto el plazo final sería el 9 de noviembre de 2018. La ejecución inicio con normalidad el 11 de octubre y para la fecha se tiene un avance de 90%</p> <p>Voluntad de Dios Mediante oficio Nro. OFMN-PIT-2018-003-0F-EXT de fecha 05 de septiembre de 2018 el Administrador del Convenio del sub-proyecto "Voluntad de Dios" mantiene la suspensión hasta que se apruebe la enmienda o en su defecto el mecanismo que permita la ejecución de los trabajos necesarios para culminar el subproyecto. En referencia al memorando MAG-PIT-2018-0295-M de 21 de septiembre en el que se solicitó se corrijan las observaciones emitidas al requerimiento de "No Objeción" al Banco Mundial, para la implementación del sistema de rebombéo, el día 18 de octubre de 2018 la Dirección Técnica del PIT remite a la Coordinación del PIT solicitado. Mediante correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2018, el Coordinador del Proyecto PIT solicitó al Banco Mundial la "No Objeción" de los requerimientos antes mencionados.</p> <p>El Banco Mundial emitió la "No Objeción" con fecha 25 de octubre.</p>	<p>Toledo Medina, Cristian Norman</p>	<p>01/02/2019 - 11:00 AM</p>
<p>AGOSTO Proyecto El Marco. Mediante oficio # MRC-32-18 de 20 de agosto de 2018 el administrador del contrato levantó la suspensión de obra y prórroga de plazo para la terminación de la obra hasta el 20 de septiembre de 2018. Se solicita se registre el cierre administrativo del contrato para el 20 de octubre de 2018.</p> <p>Proyecto Voluntad de Dios. Mediante memorando Nro. MAG-PIT-2018-0265-M, de fecha 22 de agosto de 2018, se designa nuevo administrador del convenio de obra LPN-PIT-011-2016 a partir del 22 de agosto de 2018. Con Oficio Nro. OFMN-PIT-001-2018 de fecha 22 de agosto de 2018, el administrador del convenio solicitó se mantenga la suspensión por un período de 15 días.</p> <p>Proyecto General Plaza. Mediante memorando Nro. MAG-DTPIT-2018-0538-M de fecha 30 de agosto de 2018, la Dirección Técnica solicita la certificación POA 2018 para la elaboración de la enmienda del convenio de obra No. EC-MAGAP-8176-036.</p>	<p>Peralta Ortiz, Dennis Augusto</p>	<p>04/09/2018 - 11:33 AM</p>
<p>JULIO Proyecto El Marco. En vigencia suspensión de obra por 46 días de contrato.</p>	<p>Peralta Ortiz, Dennis Augusto</p>	<p>04/09/2018 - 08:25 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Proyecto General Plaza. Se recibió No objeción por parte de BM a informe de obras complementarias. Sin embargo se requiere asignación de recursos a solicitud del incremento al techo presupuestario para el presente ejercicio fiscal, en trámite según oficio SENPLADES-CIP-2018-0601-OF.</p> <p>Proyecto Voluntad de Dios. La administración del contrato otorga un plazo de 30 días a partir del 5 de julio de 2018 , para ejecutar rubros faltantes y corregir ejecutados. Por lo que se registra fecha de finalización de obras 6 de agosto.</p>		
<p>JUNIO</p> <p>Proyecto Voluntad de Dios se mantiene suspensión de obra por problemas ocasionados por clima invernal en la zona de proyecto.</p> <p>Proyecto General Plaza. Se aprueba suspensión en espera de aprobación de BM de informe de obras complementarias.</p> <p>Proyecto El Marco. La administración del contrato aprueba una prórroga de 46 días de contrato</p>	Peralta Ortiz, Dennis Augusto	04/09/2018 - 08:11 AM
<p>MAYO</p> <p>Proyecto Voluntad de Dios se aprueba suspensión de obra por problemas ocasionados por clima invernal en la zona de proyecto.</p> <p>Proyecto General Plaza. Se aprueba suspensión de obra hasta abril se espera aprobación de BM de informe de obras complementarias.</p>	Peralta Ortiz, Dennis Augusto	04/09/2018 - 08:11 AM
<p>ABRIL</p> <p>Proyecto Voluntad de Dios se aprueba suspensión de obra por problemas ocasionados por clima invernal en la zona de proyecto.</p> <p>Proyecto General Plaza. Se aprueba suspensión de obra hasta abril se espera aprobación de BM de informe de obras complementarias.</p>	Peralta Ortiz, Dennis Augusto	04/09/2018 - 08:10 AM
<p>MARZO</p> <p>Proyecto Voluntad de Dios se aprueba ampliación de plazo hasta mayo de 2018 por problemas ocasionados por clima invernal en la zona de proyecto.</p> <p>Proyecto General Plaza. Se aprueba suspensión de obra hasta abril.</p>	Peralta Ortiz, Dennis Augusto	04/09/2018 - 08:10 AM
<p>FEBRERO</p> <p>Proyecto San Rafael se firma el acta de recepción provisional el 26 de febrero de 2018.</p> <p>Proyecto Voluntad de Dios se aprueba ampliación de plazo hasta abril de 2018</p> <p>Proyecto General Plaza. Se aprueba suspensión de obra hasta abril.</p>	Peralta Ortiz, Dennis Augusto	04/09/2018 - 08:03 AM
<p>ENERO 2018</p> <p>Proyecto San Rafael realiza inspección de recepción provisional de proyecto.</p> <p>Proyecto La ERA se firma el acta de recepción provisional del proyecto el 15 de Enero de 2018.</p> <p>Proyecto Palo Marcado se firma el acta de recepción provisional del proyecto el 10 de Enero de 2018.</p> <p>Proyecto General Plaza. Se realizan estudios para obras complementarias</p>	Peralta Ortiz, Dennis Augusto	04/09/2018 - 08:02 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General.</p> <p>El retraso en los procesos de contratación, pagos, entrega, y cierre de obras CAUSARÍA aplazamiento en la ejecución física y presupuestaria de los proyectos de irrigación parcelaria tecnificada</p>	10/04/2022	Dennis Augusto Peralta Ortiz	10 %	70	7	0/1
<p>5- PROYECTO. * General.</p> <p>La falta de asignación de recursos CAUSARÍA que no se cumplan las metas de implantación de sistemas de irrigación parcelaria tecnificada.</p>	03/06/2021		10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
3	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
4	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
5	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
6	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
7	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Inauguración Subproyecto Asociación de desarrollo integral de la comunidad de Cutahua, Simiatug	9-Entregables Formales	09/01/2018		09/01/2018		Sí	5.0
2	EJECUCIÓN: Inauguración de Subproyecto Asociación Santa Cecilia de Pucalpa, realizada	9-Entregables Formales	30/01/2018		30/01/2018		Sí	3.0
3	EJECUCIÓN: Inauguración de Subproyecto Junta de Aguas de Riego Palmar Grande, realizada	9-Entregables Formales	30/01/2018		30/01/2018		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Inauguración de Subproyecto de tecnificación de Directorio de Agua del canal Palo Marcado, realizada	9-Entregables Formales	31/01/2018		31/01/2018		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Inauguración Subproyecto Asociación Campesina 15 de Diciembre CAMPOZANO, realizada	9-Entregables Formales	20/04/2018		20/04/2018		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Inauguración Subproyecto Cooperativa Agropecuaria el Marco, Pintag, realizada	9-Entregables Formales	04/06/2018		20/03/2019		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Inauguración de proyecto para el Predio General Plaza, El Carmen, realizada	9-Entregables Formales	22/06/2018		22/06/2018		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Plan de capacitacion proyecto para el Predio General Plaza, El Carmen, realizado	9-Entregables Formales	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Plan de capacitación de Subproyecto Asociación Santa Cecilia de Pucalpa, realizada	9-Entregables Formales	30/06/2018		16/03/2018		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Plan de capacitación de Subproyecto Asociación de Productores Agrícolas San Rafael, realizada	9-Entregables Formales	30/06/2018		22/02/2018		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Plan de capacitación de Subproyecto Junta de Aguas de Riego Palmar Grande, realizada	9-Entregables Formales	30/06/2018		04/03/2018		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Plan de capacitación proyecto para Junta de Regantes del sistema de riego La Era, realizado	9-Entregables Formales	30/06/2018		17/03/2018		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN: Plan de capacitación Subproyecto de Tecnificación del sistema de riego Zhilla San Pedro, realizado	9-Entregables Formales	30/06/2018		19/03/2018		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Plan de capacitación Subproyecto de tecnificación de Directorio de Agua del canal Palo Marcado, realizado	9-Entregables Formales	30/06/2018		03/03/2018		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: Plan de capacitación de Subproyecto Asociación Campesina 15 de Diciembre CAMPOZANO, realizada	9-Entregables Formales	30/06/2018		20/03/2018		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN: Plan de capacitación del subproyecto Asociación de trabajadores agrícolas, autónomos comerciantes, exportadores "Voluntad de Dios", realizado	9-Entregables Formales	30/06/2018		21/03/2018		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Plan de capacitación del Subproyecto Asociación de desarrollo integral de la comunidad de Cutahua, Simiatug, realizada	9-Entregables Formales	30/06/2018		23/03/2018		Sí	3.0
18	EJECUCIÓN: Plan de capacitación Subproyecto Cooperativa Agropecuaria el Marco, Pintag, realizada	9-Entregables Formales	30/06/2018		23/03/2018		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: Inauguración Subproyecto Asociación de trabajadores agrícolas, autónomos comerciantes, exportadores "Voluntad de Dios", realizada	9-Entregables Formales	30/07/2018		30/07/2018		Sí	3.0
20	EJECUCIÓN: Inauguración de proyecto para Junta de Regantes del sistema de riego La Era, realizada	9-Entregables Formales	31/12/2018		23/01/2018		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN: Inauguración de Subproyecto Asociación de Productores Agrícolas San Rafael, realizada	9-Entregables Formales	31/12/2018		30/01/2018		Sí	3.0
22	EJECUCIÓN: Inauguración Subproyecto de Tecnificación del sistema de riego Zhilla San Pedro, realizada	9-Entregables Formales	31/12/2018		29/01/2018		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN: Proyectos con resoluciones de adjudicación y contratos, firmados	9-Entregables Formales	29/01/2019		29/01/2019		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Proyectos con resoluciones de adjudicación y contratos, firmados	9-Entregables Formales	15/02/2019		15/02/2019		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Estudios contratados	9-Entregables Formales	29/03/2019		29/03/2019		Sí	5.0
26	EJECUCIÓN: Proyectos con resoluciones de adjudicación y contratos, firmados	9-Entregables Formales	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	EJECUCIÓN: Proyectos con resoluciones de adjudicación y contratos, firmados	9-Entregables Formales	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Estudios para ejecución , aprobados	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Suscripción de actas de recepción provisional, efectuada.	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Obtener la certificación presupuestaria para pago de planillas de obra y fiscalización, realizada	9-Entregables Formales	28/02/2020		28/02/2020		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Suscripción de una enmienda al Convenio con Banco Mundial para pago del IVA, efectuada.	9-Entregables Formales	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Cerrar cartera de proyectos de grupo 2 y 3, aprobado	9-Entregables Formales	30/04/2020		09/01/2021		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Comprometer recursos asignados y aprobados, realizado	9-Entregables Formales	30/04/2020		31/12/2020		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Suscripción de actas de recepción provisional, realizado	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Culminar Territorio Demostrativo Píllaro Ramal Norte, realizado	9-Entregables Formales	30/06/2020	30/06/2021			No	1.0
36	EJECUCIÓN: Formular cartera de estudios para presentación a la Misión, remitido	9-Entregables Formales	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Implementar PCAT grupo 2, realizado	9-Entregables Formales	30/06/2020		02/12/2020		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Suscripción de actas de recepción provisional, ejecutado	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	1.0
39	EJECUCIÓN: Suscripción de actas de recepción provisional, realizado	9-Entregables Formales	31/08/2020		25/08/2020		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Suscripción de actas de recepción provisional, realizado	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	1.0
41	EJECUCIÓN: Suscripción de actas de recepción provisional, realizado	9-Entregables Formales	31/10/2020	31/10/2020			No	1.0
42	EJECUCIÓN: Suscripción de actas de recepción provisional, realizado	9-Entregables Formales	30/11/2020		06/11/2020		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Programas de capacitación y asistencia técnica por PIT, ENIP y Territorios Demostrativos, impartidos	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
44	EJECUCIÓN: Certificado de reprogramación aprobado	9-Entregables Formales	01/01/2021		11/02/2021		Sí	0.2
45	EJECUCIÓN: Actividades planificadas para el año 2021	5-Entregables Intermedios	29/01/2021		20/01/2021		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Personal del proyecto ejecutados con recursos fiscales contratados	9-Entregables Formales	29/01/2021		05/03/2021		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
47	EJECUCIÓN: Contratos de gastos operativos adjudicados	9-Entregables Formales	26/02/2021		27/04/2021		Sí	0.2
48	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de PCAT de los subproyectos El Marco y Cutahua finalizados.	9-Entregables Formales	03/03/2021		29/04/2021		Sí	0.2
49	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de la obra de riego tecnificado Putucay finalizado.	9-Entregables Formales	29/03/2021		19/03/2021		Sí	0.2
50	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de implementación de riego tecnificado de la obra complementaria del subproyecto Putucay finalizado.	9-Entregables Formales	30/03/2021		26/05/2021		Sí	0.2
51	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de 7 obras de riego tecnificado: Sierra Morena, Procafeq, Nueva Esperanza, Pinguilí, Mundug Yamate, Puruhuaypamba y Y del Guineo finalizados.	9-Entregables Formales	28/04/2021		26/05/2021		Sí	0.2
52	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de implementación de 6 obras complementarias: Pimampiro, Campo Alegre, Pinguilí, Sierra Morena, Nueva Esperanza y Y del Guineo finalizados.	9-Entregables Formales	29/04/2021		26/05/2021		Sí	0.2
53	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de PCAT de la obra La Paquita finalizado.	9-Entregables Formales	30/04/2021		04/05/2021		Sí	0.2
54	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de 7 obras de riego tecnificado: Sucuso, Las Mercedes, Guayama San Pedro, El Paraíso, Cruz Gulac, Orongo y Limoncillo finalizados.	9-Entregables Formales	25/05/2021		31/05/2021		Sí	0.2
55	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de implementación de 2 obras complementarias: Las Mercedes y Cruz Gulac Rumi finalizados.	9-Entregables Formales	26/05/2021		26/05/2021		Sí	0.2
56	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de implementación de 5 obras complementarias: Procafeq, Guayama San Pedro, El Paraíso, La Playa y Orongo finalizados.	9-Entregables Formales	27/05/2021		16/05/2021		Sí	0.2
57	EJECUCIÓN: Construcción de la obra de riego tecnificado finalizado Nueva Semilla y 17 de Abril finalizada.	9-Entregables Formales	28/05/2021	28/05/2021			No	0.2
58	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de implementación de 2 obras complementarias: Limoncillo y Sucuso finalizados.	9-Entregables Formales	25/06/2021		25/06/2021		Sí	0.2
59	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de la obra de riego tecnificado La Playa finalizado.	9-Entregables Formales	26/06/2021		24/06/2021		Sí	0.2
60	EJECUCIÓN: Repotenciación del subproyecto El Marco finalizada.	9-Entregables Formales	27/06/2021	27/06/2021			No	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
61	EJECUCIÓN: Construcción 2 obras de riego tecnificado arrastre: La Bélgica y Las Ardillas finalizadas.	9-Entregables Formales	28/06/2021	28/06/2021			No	0.2
62	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de PCAT de 3 subproyectos: Toacazo, Verde Pacayunga y General Plaza finalizados	9-Entregables Formales	29/06/2021		14/07/2021		Sí	0.2
63	EJECUCIÓN: Paquetes tecnológicos para inversiones en prevención de contaminación y optimización de del uso del recurso hídrico de los Grupos 1, 2 y 3 entregados.	9-Entregables Formales	30/06/2021		30/12/2021		Sí	0.2
64	EJECUCIÓN: Construcción 2 obras de riego tecnificado Belisario Quevedo y Arriaga finalizadas.	9-Entregables Formales	28/07/2021	28/07/2021			No	0.2
65	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de PCAT de 8 obras Sierra Morena, Pinguilí, Nueva Esperanza, La Libertad, Estero Piedras, La Libertad y Y del Guineo finalizados.	9-Entregables Formales	29/07/2021		20/12/2021		Sí	0.2
66	EJECUCIÓN: Puesta en marcha de 10 subproyectos implementadas: Cruz Gulac, El Paraíso, Campo Alegre, Limoncillo, Putucay, Procafeq, Sucuso, Puruhuaypamba, Las Mercedes y Pimampiro.	9-Entregables Formales	30/07/2021	30/07/2021			No	0.2
67	EJECUCIÓN: Construcción 2 obras de riego tecnificado arrastre: Cerezal Bellavista y Chambitola finalizadas.	9-Entregables Formales	30/08/2021		26/08/2021		Sí	0.2
68	EJECUCIÓN: Construcción de la obra de riego tecnificada Chiriyacu Lucero finalizada.	9-Entregables Formales	30/09/2021		29/09/2021		Sí	0.2
69	EJECUCION: Cierre de pagos de PCAT de 3 obras: Pillaro Sur, Voluntad de Dios y Santa Ana finalizados.	9-Entregables Formales	27/10/2021	27/10/2021			No	0.2
70	EJECUCIÓN: Construcción de 3 obras de riego tecnificado Santa Teresita de Guabug, La Rinconada y Guanazán finalizadas.	9-Entregables Formales	28/10/2021	28/10/2021			No	0.2
71	EJECUCION: Puesta en marcha del subproyecto Pillaro Sur implementada.	9-Entregables Formales	29/10/2021	29/10/2021			No	0.2
72	EJECUCIÓN: Construcción de la obras de riego tecnificado Ana Cagrín de Zula finalizada.	9-Entregables Formales	26/11/2021	26/11/2021			No	0.2
73	EJECUCIÓN: Cierre de pagos de PCAT de 11 obras: Cruz Gulac, El Paraíso, 17 de Junio, Campo Alegre, Limoncillo, Putucay, Procafeq, Sucuso, Puruhuaypamba, Las Mercedes y Pimampiro finalizados.	9-Entregables Formales	29/11/2021	29/11/2021			No	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
74	EJECUCIÓN: Puesta en marcha del subproyecto 17 de Junio implementada.	9-Entregables Formales	30/11/2021		18/11/2021		Sí	0.3
75	EJECUCIÓN: Evaluación del Plan Operativo Anual 2021	9-Entregables Formales	15/12/2021		20/12/2021		Sí	0.3
76	EJECUCIÓN: Programación Anual de Planificación 2022 aprobada	4-Inicio de Trabajo	30/01/2022		26/01/2022		Sí	0.11
77	EJECUCION: Plan Operativo Anual 2022 aprobado	9-Entregables Formales	15/02/2022		28/07/2022		Sí	0.09
78	EJECUCION: Plan de Adquisiciones 2022 aprobado	9-Entregables Formales	25/02/2022		11/08/2022		Sí	0.08
79	EJECUCION: Informe de Creación de Necesidad Sub Proyecto "Tintales" aprobado.	9-Entregables Formales	15/03/2022		25/03/2022		Sí	0.1
80	EJECUCIÓN: Informe de Creación de Necesidad Sub Proyecto "Cardón" aprobado.	9-Entregables Formales	15/03/2022		13/04/2022		Sí	0.09
81	EJECUCIÓN: Informe de Creación de Necesidad Sub Proyecto "Puerto la Boca" aprobado.	9-Entregables Formales	15/03/2022		13/04/2022		Sí	0.09
82	EJECUCION: Documentos de Licitación obra Cumbijín aprobados.	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.08
83	EJECUCION: Documentos de Licitación obra Guayabilla Los Bobos aprobados.	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.06
84	EJECUCION: Documentos de Licitación obra La Rinconada aprobados.	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.09
85	EJECUCION: Documentos de Licitación obra Miguel Salazar aprobados.	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.1
86	EJECUCION: Documentos de Licitación obra Repotenciación El Marco aprobados.	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.08
87	EJECUCION: Documentos de Licitación obra Unidos Venceremos aprobados.	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.12
88	EJECUCION: Documentos de Licitación obra Urkuyacu aprobados.	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.09
89	EJECUCION: Documentos de Licitación obra Voluntad de Dios aprobados	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.08
90	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva de la obra de riego tecnificado Belisario Quevedo firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/03/2022		23/02/2022		Sí	0.1
91	EJECUCIÓN: Contrato obra enmienda Nueva Semilla 17 de abril firmado.	9-Entregables Formales	30/03/2022	30/03/2022			No	0.1
92	EJECUCIÓN: Contrato obra Cumbijín firmado	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022			No	0.09
93	EJECUCIÓN: Contrato obra Guayabilla Los Bobos firmado	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022			No	0.1
94	EJECUCIÓN: Contrato obra La Rinconada firmado	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022			No	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
95	EJECUCIÓN: Contrato obra Miguel Salazar firmado	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022			No	0.09
96	EJECUCIÓN: Contrato obra Repotenciación El Marco firmado	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022			No	0.08
97	EJECUCIÓN: Contrato obra Unidos Venceremos firmado	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022			No	0.08
98	EJECUCIÓN: Contrato obra Urcuyacu firmado	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022			No	0.09
99	EJECUCIÓN: Contrato obra Voluntad de Dios firmado	9-Entregables Formales	30/04/2022	30/04/2022			No	0.1
100	EJECUCIÓN: Documento de Especificaciones Técnicas El Cardón aprobado	9-Entregables Formales	30/04/2022		01/06/2022		Sí	0.08
101	EJECUCIÓN: Documento de Especificaciones Técnicas Puerto La Boca aprobado	9-Entregables Formales	30/04/2022		01/06/2022		Sí	0.1
102	EJECUCIÓN: Documento de Especificaciones Técnicas Subproyecto Del Alto Rio Chico aprobado	9-Entregables Formales	30/04/2022		06/06/2022		Sí	0.09
103	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva Enmienda Obra Nueva Semilla 17 de Abril firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022	30/05/2022			No	0.1
104	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Cruz Gulac Rumi firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022		20/04/2022		Sí	0.09
105	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto El Paraíso firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022		13/04/2022		Sí	0.09
106	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto La Playa firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022		26/02/2022		Sí	0.09
107	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Las Mercedes firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022	30/05/2022			No	0.1
108	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Limoncillo firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022		07/07/2022		Sí	0.09
109	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Orongo firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022	30/05/2022			No	0.09
110	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado finalizado Nueva Semilla y 17 de Abril firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022	30/05/2022			No	0.08
111	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado La Playa firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022		26/02/2022		Sí	0.09
112	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022	30/05/2022			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	subproyecto Cruz Gulac Rumi firmado							
113	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra subproyecto El Paraiso firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022		13/04/2022		Sí	0.09
114	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra subproyecto Las Mercedes firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022	30/05/2022			No	0.08
115	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra subproyecto Limoncillo firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022		07/07/2022		Sí	0.08
116	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra subproyecto Orongo firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/05/2022	30/05/2022			No	0.09
117	EJECUCIÓN: Contrato para la ejecución de obra del Subproyecto "Cardón" firmado	9-Entregables Formales	30/05/2022	30/05/2022			No	0.09
118	EJECUCIÓN: Contrato para la ejecución de obra del Subproyecto "Puerto La Boca" firmado	9-Entregables Formales	30/05/2022	30/05/2022			No	0.1
119	EJECUCIÓN: Contrato para la ejecución de obra del Subproyecto "Tintales" firmado	9-Entregables Formales	30/05/2022	30/05/2022			No	0.08
120	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Procafeq firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022	30/06/2022			No	0.09
121	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Sucuso firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022		18/08/2022		Sí	0.1
122	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificad Chiriyacu Lucero firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022	28/10/2022			No	0.09
123	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado arrastre La Bélgica firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022	30/06/2022			No	0.08
124	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado arrastre Las Ardillas firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022	30/06/2022			No	0.08
125	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado arrastre: Cerezal Bellavista firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022	30/06/2022			No	0.1
126	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado arrastre: Chambitola firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022	30/06/2022			No	0.09
127	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado Arriaga firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022	30/06/2022			No	0.08
128	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra subproyecto Sucuso firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2022		18/08/2022		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
129	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva Paquetes tecnológicos para inversiones en prevención de contaminación y optimización del uso del recurso hídrico en lo subproyectos del grupo 4 firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/07/2022	30/07/2022		▼	No	0.08
130	EJECUCION: Pagos de PCAT de obra Pillaro Sur firmado.	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022		▼	No	0.09
131	EJECUCION: Pagos de PCAT de obra Voluntad de Dios firmado.	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022		▼	No	0.08
132	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva Paquetes tecnológicos para inversiones en prevención de contaminación y optimización del uso del recurso hídrico en lo subproyectos del grupo 3 firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/08/2022	30/08/2022		▼	No	0.1
133	EJECUCIÓN: Pagos de PCAT de obra: Campo Alegre firmado.	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022		▼	No	0.04
134	EJECUCIÓN: Pagos de PCAT de obra: El Paraíso firmado.	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022		▼	No	0.09
135	EJECUCIÓN: Pagos de PCAT de obra: Las Mercedes firmado.	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022		▼	No	0.05
136	EJECUCIÓN: Pagos de PCAT de obra: Procafeq firmado.	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022		▼	No	0.1
137	EJECUCIÓN: Pagos de PCAT de obra: Putucay firmado.	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022		▼	No	0.09
138	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra Voluntad de Dios firmado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.13
139	EJECUCIÓN: Informe del Plan de capacitación y asistencia técnica, plan productivo y ambiental del sub proyecto 17 de Junio Pimampiro enviado	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.05
140	EJECUCIÓN: Informe del Plan de capacitación y asistencia técnica, plan productivo y ambiental del sub proyecto El Paraíso enviado	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.14
141	EJECUCIÓN: Informe del Plan de capacitación y asistencia técnica, plan productivo y ambiental del sub proyecto Mundug Yamate enviado	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.1
142	EJECUCIÓN: Informe del Plan de capacitación y asistencia técnica, plan productivo y ambiental del sub proyecto Procafeq enviado	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.14
143	EJECUCIÓN: Informe del Plan de capacitación y asistencia técnica, plan productivo y ambiental del sub proyecto Píllaro Norte enviado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2022	30/09/2022		▼	No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
144	EJECUCIÓN: Informe del Plan de capacitación y asistencia técnica, plan productivo y ambiental del sub proyecto Santa Ana Limoncillo enviado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2022	30/09/2022			No	0.13
145	EJECUCIÓN: Informe del Plan de capacitación y asistencia técnica, plan productivo y ambiental del sub proyecto Sucuso Puruhuaypamba enviado	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	0.05
146	EJECUCIÓN: Informe Puesta en marcha sub proyecto Procafeq enviado	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	0.09
147	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra repotenciación El Marco firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/10/2022	30/10/2022			No	0.09
148	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra Cumbijin firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2022	30/11/2022			No	0.09
149	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra Guayabilla Los Bobos firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2022	30/11/2022			No	0.1
150	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra La Rinconada firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2022	30/11/2022			No	0.08
151	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra Miguel Salazar firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2022	30/11/2022			No	0.08
152	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra Unidos Venceremos firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2022	30/11/2022			No	0.09
153	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra Urkuyacu firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2022	30/11/2022			No	0.09
154	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado La Rinconada firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2022	30/12/2022			No	0.09
155	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado Santa Teresita de Guabug firmado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2022	30/12/2022			No	0.09
156	CIERRE: Hoja de Ruta aprobada para el cierre del proyecto con plazos definidos	9-Entregables Formales	31/12/2022	31/12/2022			No	0.27

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
1	Número de hectáreas tecnificadas con riego parcelario.		37.26 %	946.45	352.62	01/01/2018	Ene-Jun
2	Número de beneficiarios rurales con sistemas de riego implementados		27.21 %	588	160	01/01/2018	Ene-Jun
3	Número de beneficiarios/as que han adquirido y/o mejorado sus conocimientos y destrezas en la		0.00 %	79	0	01/01/2022	Ene-Jun

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
	gestión ambiental, social y productiva del agua						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,851,926.17
Estimado Al Fin Del Proyecto:	54,474,685.18 **
Costo Total:	250,000,000.00
Total Devengado:	40,943,455.99
% Costo Total Devengado:	16.38 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 16.38 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	77,703,307.86	16,759,659.99	0.00	94,462,967.85
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	81,555,234.03	16,759,659.99	0.00	98,314,894.02
Ppto. Codificado	79,279,316.34	16,759,659.99	0.00	96,038,976.33
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	79,279,316.34	16,759,659.99	0.00	96,038,976.33
Ppto. Devengado	37,715,025.19	3,228,430.80	0.00	40,943,455.99
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 37,715,025.19	0.00	0.00	37,715,025.19
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	41,564,291.15	16,759,659.99	0.00	58,323,951.14
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 47.57 %	19.26 %	0.00 %	42.63 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

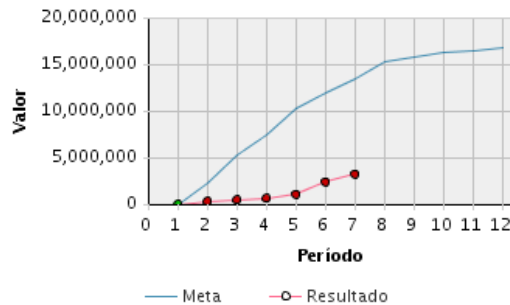

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,223,627.34	283,317.39	2,223,627.34	283,317.39	12.74 %		1.69 %
Mar	3,037,374.14	155,044.79	5,261,001.48	438,362.18	8.33 %		2.62 %
Abr	2,126,037.32	154,044.41	7,387,038.80	592,406.59	8.02 %		3.53 %
May	2,840,024.01	475,673.97	10,227,062.81	1,068,080.56	10.44 %		6.37 %
Jun	1,631,442.68	1,298,621.15	11,858,505.49	2,366,701.71	19.96 %		14.12 %
Jul	1,527,523.97	861,729.09	13,386,029.46	3,228,430.80	24.12 %		19.26 %
Ago	1,827,218.46		15,213,247.92				
Sep	591,353.13		15,804,601.05				
Oct	433,509.22		16,238,110.27				
Nov	223,652.33		16,461,762.60				
Dic	297,897.39		16,759,659.99				
Total	16,759,659.99	3,228,430.80					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la eficiencia de la gestión de proyectos con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los agricultores MEDIANTE la ejecución de proyectos; además, de la generación e implementación de normativas, metodologías, modelos de gestión, propuestas de políticas de seguimiento y evaluación.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 12: Informe final contrato de capacitación Pucalpa.	A6_Informe_final_de_supervisión_de_contrato_de_capacitacion_pucalpa.pdf	01/09/2022
2	ASOCIACIÓN HITO 100: Documento de Especificaciones Técnicas El Cardón aprobado	L1.pdf	01/09/2022
3	ASOCIACIÓN HITO 101: Documento de Especificaciones Técnicas Puerto La Boca aprobado	L2.pdf	01/09/2022
4	ASOCIACIÓN HITO 102: Documento de Especificaciones Técnicas Subproyecto Del Alto Rio Chico aprobado	L3.pdf	01/09/2022
5	ASOCIACIÓN HITO 104: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Cruz Gulac Rumi firmada	L5.pdf	01/09/2022
6	ASOCIACIÓN HITO 105: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto El Paraíso firmada.	L6.pdf	01/09/2022
7	ASOCIACIÓN HITO 106: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto La Playa firmada	L7.pdf	01/09/2022
8	ASOCIACIÓN HITO 108: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Limoncillo firmada	L9.pdf	01/09/2022
9	ASOCIACIÓN HITO 111: Acta Entrega Recepción Definitiva obra de riego tecnificado La Playa firmada.	M3.pdf	01/09/2022
10	ASOCIACIÓN HITO 113: Acta Entrega Recepción Definitiva obra subproyecto El Paraíso firmado	M6.pdf	01/09/2022
11	ASOCIACIÓN HITO 115: Acta Entrega Recepción Definitiva obra subproyecto Limoncillo firmado	M8.pdf	01/09/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	ASOCIACIÓN HITO 121: Acta Entrega Recepción Definitiva obra complementaria subproyecto Sucuso firmado	N5.pdf	01/09/2022
13	ASOCIACIÓN HITO 128: Acta Entrega Recepción Definitiva obra subproyecto Sucuso firmado	O3.pdf	01/09/2022
14	ASOCIACIÓN HITO 13: Informe final contrato de capacitación San Rafael.	A7_Informe_final_de_supervisión_de_contrato_de_capacitación_San_Rafael.pdf	04/09/2018
15	ASOCIACIÓN HITO 14: Informe final contrato de capacitación Palmar Grande.	A5_Informe_Final_de_supervisión_de_contrato_de_capacitación_Palmar_Grande.pdf	04/09/2018
16	ASOCIACIÓN HITO 15: Informe final contrato de capacitación La Era.	A3_Informe_final_de_supervisión_de_contrato_de_capacitación_La_Era.pdf	04/09/2018
17	ASOCIACIÓN HITO 16: Informe final contrato de capacitación Zilla.	A8_Informe_final_de_supervisión_de_contrato_de_capacitación_Zilla.pdf	04/09/2018
18	ASOCIACIÓN HITO 17: Informe final contrato de capacitación Palo Marcado.	A4_Informe_final_de_supervisión_de_contratación_de_capacitación_Palo_Marcado.pdf	04/09/2018
19	ASOCIACIÓN HITO 18: Informe final contrato de capacitación Camposano.	A1_Informe_final_de_supervisión_de_contrato_capacitación_Camposano.pdf	04/09/2018
20	ASOCIACIÓN HITO 20: Informe final contrato de capacitación Cutahua.	A2_Informe_final_de_supervisión_de_contrato_de_capavitación_Cutahua.pdf	04/09/2018
21	ASOCIACIÓN HITO 31: Suscripción de una enmienda al Convenio con Banco Mundial para pago del IVA, efectuada.	A31.pdf	26/05/2021
22	ASOCIACIÓN HITO 33: Comprometer recursos asignados y aprobados, realizado	D6.pdf	01/09/2022
23	ASOCIACIÓN HITO 33: Comprometer recursos asignados y aprobados, realizado	D6.pdf	01/09/2022
24	ASOCIACIÓN HITO 37: Implementar PCAT grupo 2, realizado	E1.pdf	01/09/2022
25	ASOCIACIÓN HITO 39: Suscripción de actas de recepción provisional, realizado	E3.rar	01/09/2022
26	ASOCIACIÓN HITO 42: Suscripción de actas de recepción provisional, realizado	E6.rar	01/09/2022
27	ASOCIACIÓN HITO 44: Certificado de reprogramación aprobado	A44.pdf	26/05/2021
28	ASOCIACIÓN HITO 45: Actividades planificadas para el año 2021	E9.pdf	01/09/2022
29	ASOCIACIÓN HITO 46: Personal del proyecto ejecutados con recursos fiscales contratados	A46.pdf	26/05/2021
30	ASOCIACIÓN HITO 47: Contratos de gastos operativos adjudicados	A47.pdf	26/05/2021
31	ASOCIACIÓN HITO 48: Cierre de pagos de PCAT de los subproyectos El Marco y Cutahua finalizados.	F3.rar	01/09/2022
32	ASOCIACIÓN HITO 49: Cierre de pagos de la obra de riego tecnificado Putucay finalizado.	A49.pdf	27/05/2021
33	ASOCIACIÓN HITO 49: Cierre de pagos de la obra de riego tecnificado Putucay finalizado.	F4.pdf	01/09/2022
34	ASOCIACIÓN HITO 50: Cierre de pagos de implementación de riego tecnificado de la obra complementaria del subproyecto Putucay finalizado.	A50.pdf	26/05/2021
35	ASOCIACIÓN HITO 51: Sierra Morena, Procafeq, Nueva Esperanza, Pinguilí, Mundug Yamate, Puruhuaypamba y Y del Guineo finalizados.	A51.pdf	26/05/2021
36	ASOCIACIÓN HITO 52: Cierre de pagos de implementación de 6 obras complementarias: Pimampiro, Campo Alegre, Pinguilí, Sierra Morena, Nueva Esperanza y Y del Guineo finalizados.	A52.pdf	26/05/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
37	ASOCIACIÓN HITO 53: Cierre de pagos de PCAT de la obra La Paquita finalizado.	A53.pdf	02/06/2021
38	ASOCIACIÓN HITO 54: Cierre de pagos de 7 obras de riego tecnificado: Sucuso, Las Mercedes, Guayama San Pedro, El Paraíso, Cruz Gulac, Orongo y Limoncillo finalizados.	F9.rar	01/09/2022
39	ASOCIACIÓN HITO 55: Cierre de pagos de implementación de 2 obras complementarias: Las Mercedes y Cruz Gulac Rumi finalizados.	G1.pdf	01/09/2022
40	ASOCIACIÓN HITO 56: Cierre de pagos de implementación de 5 obras complementarias: Procafeq, Guayama San Pedro, El Paraíso, La Playa y Orongo finalizados.	G2.rar	01/09/2022
41	ASOCIACIÓN HITO 58: Cierre de pagos de implementación de 2 obras complementarias: Limoncillo y Sucuso finalizados.	G4.pdf	01/09/2022
42	ASOCIACIÓN HITO 59: Cierre de pagos de la obra de riego tecnificado La Playa finalizado.	G5.pdf	01/09/2022
43	ASOCIACIÓN HITO 62: Cierre de pagos de PCAT de 3 subproyectos: Toacazo, Verde Pacayunga y General Plaza finalizados	G8.pdf	01/09/2022
44	ASOCIACIÓN HITO 63: Paquetes tecnológicos para inversiones en prevención de contaminación y optimización de del uso del recurso hídrico de los Grupos 1, 2 y 3 entregados.	G9.pdf	01/09/2022
45	ASOCIACIÓN HITO 65: Cierre de pagos de PCAT de 8 obras Sierra Morena, Pinguilí, Nueva Esperanza, La Libertad, Estero Piedras, La Libertad y Y del Guineo finalizados.	H2.rar	01/09/2022
46	ASOCIACIÓN HITO 67: Construcción 2 obras de riego tecnificado arrastre: Cerezal Bellavista y Chambitola finalizadas.	H4.rar	01/09/2022
47	ASOCIACIÓN HITO 68: Construcción de la obra de riego tecnificad Chiriyacu Lucero finalizada.	H5.pdf	01/09/2022
48	ASOCIACIÓN HITO 74: Puesta en marcha del subproyecto 17 de Junio implementada.	I2.pdf	01/09/2022
49	ASOCIACIÓN HITO 75: Evaluación del Plan Operativo Anual 2021	I3.pdf	01/09/2022
50	ASOCIACIÓN HITO 76: Programación Anual de Planificación 2022 aprobada	I4.pdf	01/09/2022
51	ASOCIACIÓN HITO 77: Plan Operativo Anual 2022 aprobado	I5.rar	01/09/2022
52	ASOCIACIÓN HITO 78: Plan de Adquisiciones 2022 aprobado	I6.pdf	01/09/2022
53	ASOCIACIÓN HITO 79: Informe de Creación de Necesidad Sub Proyecto "Tintales" aprobado.	I7.pdf	01/09/2022
54	ASOCIACIÓN HITO 80: Informe de Creación de Necesidad Sub Proyecto "Cardón" aprobado.	I8.pdf	01/09/2022
55	ASOCIACIÓN HITO 81: Informe de Creación de Necesidad Sub Proyecto "Puerto la Boca" aprobado.	I9.pdf	01/09/2022
56	ASOCIACIÓN HITO 90: Acta Entrega Recepción Definitiva de la obra de riego tecnificado Belisario Quevedo firmada	J9.pdf	01/09/2022
57	Hito suscripción de actas de recepción provisional 2020 "La Libertad"	I__ACTA_LA_LIBERTAD.pdf	15/04/2020
58	Hito suscripción de actas de recepción provisional 2020 "Verde Pacayunga"	Verde_Pacayunga_Acta_recepción_provisional_opt.pdf	15/04/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	Resumen de certificaciones presupuestarias obtenidas para el pago de contratos de obra y fiscalización	Resumen_de_certificaciones_presupuestarias.xls	15/04/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Romero Solano, César Ricardo	Gerente	Subsecretario	cromero@mag.gob.ec	
