

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)													ESTADO: En Ejecución							
SIGADE																					
BIP 001600011700																					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA						
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución									
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares	52,032,800.00		2,902,300.00	54,935,100.00	1,231,700.00	406,859.73	1,638,559.73	3.0	50,801,100.00	2,495,440.27	53,296,540.27	97.0	2,053,439.83	413,175.61	2,466,615.44	4.5					
Lempiras	1,203,955,739.52		67,154,578.32	1,271,110,317.84	28,499,567.28	9,414,083.08	37,913,650.36	3.0	1,175,456,172.24	57,740,495.24	1,233,196,667.48	97.0	47,513,312.15	9,560,222.56	57,073,534.71	4.5					
Nota: Primer desembolso otorgado en el mes de septiembre del 2013.																					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada									
	26/02/13					29/11/2013	29/11/2013				23/09/2019										
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)				%							
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego		41,757,100.00				1,390,000.00				43,147,100.00				78.5							
Asistencia técnica y Comercialización		1,097,450.00				120,000.00				1,217,450.00				2.2							
Organización y Desarrollo Local		1,171,700.00				120,000.00				1,291,700.00				2.4							
Gestión Ambiental		495,450.00				80,000.00				575,450.00				1.0							
Unidad Coordinadora del Programa		7,511,100.00				1,192,300.00				8,703,400.00				15.8							
TOTAL		52,032,800.00				2,902,300.00				54,935,100.00				100.0							
Objetivos del Proyecto																					
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																					
Descripción del Proyecto																					
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho																					
Beneficiarios																					
30,506 beneficiarios directos (Familias: 4,358)																					
Metas Globales																					
El Programa ejecutará cuatro grandes Proyectos y 92 pequeños sistemas de riego en 11 Departamentos del País																					

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 001600011700		

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	23.9
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42.1
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	3.7
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	61.6
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	161,872,460.00	21,643,420.00	183,515,880.00	3,436,290.00	152,480.00	3,588,770.00	2.0
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	23.9
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42.1
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44		55,554.61	3.7
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85		46,021.76	61.6
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	6,704,931.18	896,493.71	7,601,424.88	142,334.82		6,315.89	2.0

METAS

GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-16		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Prog. 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Sistemas de Riego Instalados a Productores (as)	Sistemas de Riego	16				4				4						
Hectareas de tierra agrícolas de productires (as) con acceso a riego	Hectáreas	285														

Problemática

- 1- Proyecto Selguapa: Se lanzó nuevamente el Proceso de Licitación internacional para la construcción del Proyecto, el 2 de febrero se realizó la homologación del Proyecto, la socialización con los diferentes oferentes.
- 2- Proyecto San Sebastián: El proceso de la Construcción y Supervisión, el 1 de febrero se llevó a cabo la apertura de las ofertas económicas, las mismas serán evaluadas en este proceso.
- 3- Proyecto Oloman: El proceso de la Construcción y Supervisión, el BCIE dió la no objeción para abrir el sobre económico, sin embargo algunos participantes presentaron reclamos y el BCIE está investigando al respecto.
- 4- Proyecto Sulaco: El proceso de la Construcción y Supervisión el BCIE dió la no objeción para abrir el sobre económico, sin embargo algunos participantes presentaron reclamos y el BCIE está investigando al respecto.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Agilizar los procesos con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma	UAP-SAG-SEFIN-BCIE	31/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Ing. Marco Antonio Silva/Coordinador del Proyecto Hector Irías/Especialista de Monitoreo German Rodriguez/Administrador	Licda. Margie Godoy	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo 2017

Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US\$

Elaborada por: Karina Maldonado

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE:GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería						Sector:	Agroforestal y Turismo				Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería			
TOTAL PROYECTO																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.0	0.0	0.0	30,000,000.0	8,036,400.0		8,036,400.0	26.8	21,963,600.0		21,963,600.0	90.3	11,038,532.9	233,335.4	11,271,868.3	37.6
Lempiras	724,269,000.0			724,269,000.0	194,017,179.7		194,017,179.7	26.8	530,251,820.3		530,251,820.3	90.3	266,495,572.8	5,633,254.1	272,128,826.9	37.6
FIDA 816-HN																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	3,100,000.0		3,100,000.0	31.0	6,900,000.0		6,900,000.0	90.3	3,100,000.0		3,100,000.0	31.0
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	74,841,130.0		74,841,130.0	31.0	166,581,870.0		166,581,870.0	90.3	74,841,130.0		74,841,130.0	31.0
OPEP-1418-P																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	1,300,000.0		1,300,000.0	13.0	8,700,000.0		8,700,000.0		1,300,000.0		1,300,000.0	13.0
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	31,384,990.0		31,384,990.0	13.0	210,038,010.0		210,038,010.0		31,384,990.0		31,384,990.0	13.0
BCIE 2086																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Nacional (X)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	10,000,000.0			10,000,000.0	1,500,000.0		1,500,000.0	15.0	8,500,000.0		8,500,000.0	85.0	485,561.8		485,561.8	4.9
Lempiras	241,423,000.0			241,423,000.0	36,213,450.0		36,213,450.0	15.0	205,209,550.0		205,209,550.0	85.0	11,722,579.1		11,722,579.1	4.9
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	01/09/2010 FIDA 23/05/2013 BCIE 01/05/2012 OFID						23/11/2010 FIDA 23/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID		23/11/2010 FIDA 24/11/2013 BCIE 01/05/2012 OFID				01/09/2017 FIDA 31/12/2019 BCIE 30/06/2018 OFID			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
Acceso a Mercados y Desarrollo de encadenamientos Empresariales			20,292,000.00										20,292,000.0		67.6	
Desarrollo Humano y Territorial			7,916,000.00										7,916,000.0		26.4	
Gestión del Programa			1,792,000.00										1,792,000.0		6.0	
TOTAL			30,000,000.00										30,000,000.0		100.0	

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).				ESTADO: En Ejecución
SIGADE:GE01097					
BIP N.1600011100					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería	Sector:	Agroforestal y Turismo	Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería

Objetivos del Proyecto

Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.

Descripción del Proyecto

El Programa EmprendeSur es una iniciativa del Gobierno de la República a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Bando Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el apoyo administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha iniciativa esta enmarcada en el documento "Visión de País 2010-2038" y el Plan de Nación 2010-2022.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

El programa desarrollara sus acciones en la Regiones 11, 12 y 13 del Modelo Territorial de Honduras, definida por el nuevo Gobierno (2010), la cual fue establecida de acuerdo al potencial de las cuencas hidrográficas de los ríos Choluteca, Goascorán, Nacaome, Negro y Sampile; además de características socioeconómicas comunes, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. La Región 4 comprende los departamentos de Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9).

Beneficiarios

Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no-agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas Lenca. El programa contempla atender 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización, caminos rurales y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, inversiones para el desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal

Metas Globales

- i. Crecimiento económico del sector rural;
- ii. Pobreza extrema en las Regiones 11, 12 y 13 reducida;
- iii. Desnutrición infantil reducida de acuerdo a la meta nacional;
- iv. 40000 Hogares beneficiarios directos incrementan en 10% su ingreso per cápita;
- v. 10% de incremento en la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los hogares beneficiarios;
- vi. Incremento en negocios establecidos entre hogares beneficiarios y empresarios comerciales;
- vii. Hogares beneficiarios cuentan con negocios o empresas funcionando al cierre del proyecto; organizaciones manejadas por mujeres tienen actividades comerciales;
- viii. 122 Organizaciones rurales insertas y operando en las cadenas de valor al cierre del proyecto, ix. 9600 beneficiarios rurales se benefician del sistema financiero rural

PRESUPUESTO CONSOLIDADO TODOS LOS ORGANISMOS

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2011	16,060,835.0		16,060,835.0	16,060,840.0		16,060,840.0	7,841,470.0		7,841,470.0	48.8
Año 2012	80,281,080.0		80,281,080.0	67,509,510.0	4,438,040.0	71,947,550.0	22,301,640.0	4,438,040.0	26,739,680.0	37.2
Año 2013	47,539,530.0		47,539,530.0	47,539,530.0		47,539,530.0	37,705,080.0		37,705,080.0	79.3
Año 2014	115,000,000.0		115,000,000.0	19,216,450.0		19,216,450.0	8,605,780.0		8,605,780.0	44.8
Año 2015	140,287,810.0		140,287,810.0	140,287,810.0		140,287,810.0	51,753,300.0		51,753,300.0	36.9
Año 2016	103,480,690.0		103,480,690.0	104,975,140.0		104,975,140.0	97,992,890.0		97,992,890.0	93.3
Año 2017	56,522,100.0		56,522,100.0	56,522,100.0		56,522,100.0	15,976,240.0		15,976,240.0	28.3
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2011	844,418.24		844,418.24	844,418.24		844,418.24	412,274.97		412,274.97	48.8
Año 2012	4,220,876.97		4,220,876.97	3,549,395.90	233,335.44	3,782,731.34	1,172,536.28	233,335.44	1,405,871.71	37.2
Año 2013	2,308,338.07		2,308,338.07	2,301,342.87		2,301,342.87	1,825,266.61		1,825,266.61	79.3
Año 2014	5,583,960.92		5,583,960.92	933,077.44		933,077.44	417,863.82		417,863.82	44.8
Año 2015	6,062,986.64		6,811,840.42	6,271,920.55		6,271,920.55	2,313,761.87		2,313,761.87	36.9
Año 2016	4,472,249.16		5,024,627.21	4,536,836.60		4,536,836.60	4,235,076.32		4,235,076.32	93.3
Año 2017	2,971,719.24		2,744,497.37	2,341,206.10		2,341,206.10	661,753.02		661,753.02	28.3

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CONVENIO N. FIDA 816-HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE:GE01097																
BIP N.1600011100																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería						Sector:		Agroforestal y Turismo				Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados.	Proyecto	3			1					1	1				1	100
Planes de Negocios y desarrollo aprobados por organismo financiador.	Planes	15			4					4	4				4	100
Sistema de riego instalados para cultivos de huertos familiares de Familias rurales pobres.	Sistema de Riego	2,000			500					500	500				500	100
Capacitación y asistencia técnica brindada a grupos organizados	Capacitación	10			4					4	2				2	50
Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	40			10					10	10				10	100
Problemática																
El FIDA aprobó ampliación al plazo de cierre del Proyecto hasta el 30 de septiembre de 2019, con el propósito de ejecutar la totalidad de los recursos. El Proyecto esta solicitando ampliación al Presupuesto 2017, en vista que el presupuesto vigente no ajusta para realizar diferentes actividades.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Dar seguimiento a las actividades del programa.										UE-UAP-SAG				31/03/2017		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Gerente Ing. Arturo Oliva Email: aoliva03@yahoo.com Tel: 99697945 Planificador Joel Ulises Sevilla								Lic. Elan Tabora								

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 59.7% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1


Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 95% (L.442,990,506) está financiado con fondos externos y el 5% (L.24,213,420) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	467,203,926
Presupuesto Vigente	467,203,926
Congelamiento	52,221,375
Presupuesto Vigente Ajustado	414,982,551
Ejecutado I Trimestre-17	23,179,198
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trimestre/Vigente Ajustado)	6%
Comprometido (Devengado + comprometido)	29,635,690
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente Ajustado)	7%

Fuente: SIAFI al 31 de Marzo, 2017

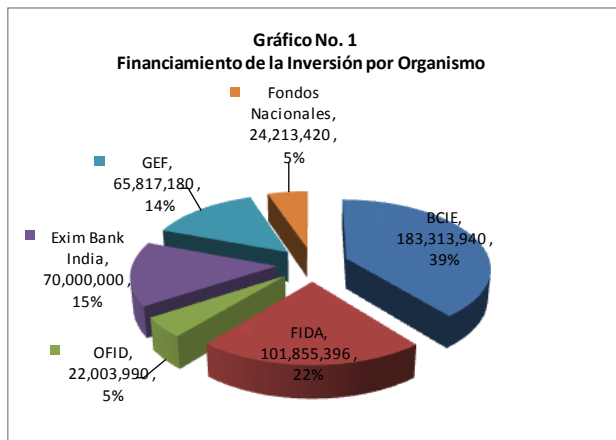

Al primer trimestre se logró ejecutar L.23,179,198 representativo del 6% de ejecución respecto al vigente ajustado, y comprometido representa una ejecución del 7% en relación al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en cinco (5) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales. A continuación se detallan los principales proyectos prioritarios de la institución:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)	BCIE-1947 FIDA 759	330,484,140	2010 - 2017 2008-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	4,100,000	4,100,000	1,415,371	35%
Acumulado 2017	4,100,000	4,100,000	1,415,371	35%
Acumulado Vida del Proyecto*/	330,484,140	328,362,949	254,533,232	78%

Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto PROMECOM, en el presente año ha realizado las siguientes actividades:
 Aprobación del primer producto de 4 consultorías de cierre de Proyecto.
 Aprobación del Plan de Cierre y la recuperación de la cuenta especial
 Aprobación por parte de BCIE de la modificación del Plan Global de Inversiones.
 95% de avance en ejecución e implementación de las últimas 25 inversiones en tiempo record.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	BCIE-2086 FIDA- 759 OFID-1418	679,077,000	2013 -2019 2010-2017 2012-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	56,522,096	56,522,096	15,976,245	28%
Acumulado 2017	56,522,096	56,522,096	15,976,245	28%
Acumulado Vida del Proyecto*/	679,077,000	671,028,000	261,477,337	39%
Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Programa EMPRENDESUR, tiene programado realizar en el presente año 20 planes de desarrollo organizacional, al primer trimestre ejecutó 6 planes de negocios cumpliendo con su meta física en el trimestre de un 100%.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Participación de la SEFIN en el Taller de Arranque del Proyecto PROLENCA y Taller de Lanzamiento para oficializar las operaciones del Proyecto.

Conclusiones

- Al primer trimestre los proyectos no presentan avances físicos y financieros significativos, debido a que los existen en proceso varias licitaciones que representan un alto nivel compromiso financiero.

Recomendaciones

- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos por parte de los organismos financiadores, toma de decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a problemas.
- La Eficiencia de los recursos asignados a la institución, que permita el logro de metas programadas.
- Agilidad en los procesos de los proyectos que son gestionados a través de la Unidad Administradora de Proyectos.

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No Convenio: FIDA-743-HN BCIE 1947		MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO											ESTADO: En Ejecución																				
SIGADE: 01026																																	
BIP: 001600010300																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería																		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%									
Dólares		13,406,000.00		0.00		1,180,000.00		14,586,000.00		9,211,981.00		635,904.79		9,847,885.79		67.5		4,194,019.00		544,095.21		4,738,114.21		32.5		9,966,251.02		1,021,681.47		10,987,932.49		75.3	
Lempiras		323,651,673.80		0.00		28,487,914.00		352,139,587.80		222,398,408.90		15,352,204.33		237,750,613.22		67.5		101,253,264.90		13,135,709.67		114,388,974.58		32.5		240,608,222.07		24,665,740.59		265,273,962.65		75.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
mar-08		11 de marzo de 2008		58-2008				7 de diciembre de 2008		Enero de 2009				Junio de 2016		31/06/2017																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%																	
Desarrollo Organizacional y Gestión Territorial		4,000,057.31						163,535.26						4,163,592.57		28.57																	
Inserción y Posicionamiento en el Mercado		6,153,875.38						213,644.01						6,367,519.38		43.70																	
Gestión y Administración del Proyecto		2,530,838.32						802,820.74						3,333,659.05		22.88																	
Sin Asignación		706,229.00						0.00						706,229.00		4.85																	
TOTAL		13,391,000.00						1,180,000.00						14,571,000.01		100.00																	
Objetivos del Proyecto																																	
Reducir significativamente la pobreza de los habitantes rurales del departamento de Yoro.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Fortalecimiento de las organizaciones de productores y las comunidades, para incrementar la productividad y la competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el crecimiento económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como la reducción de la pobreza del país.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Los 11 municipios que conforman el departamento de Yoro: 1. Yoro, 2. Arenal, 3. El Negrito, 4. El Progreso, 5. Jocón, 6. Morazán, 7. Olanchito, 8. Santa Rita, 9. Sulaco, 10. Victoria, 11. Yorito.																																	
Beneficiarios																																	
El grupo objetivo del proyecto está conformado por la población rural que vive en condiciones de pobreza y de extrema pobreza en el Departamento de Yoro. Se distinguen tres tipos de hogares: a) Hogares pobres extremos , que no tienen tierra propia y cultivan granos básicos (maíz, sorgo y frijoles) en pequeñas parcelas inferiores a tres manzanas, alquiladas por temporadas. De acuerdo con los índices de pobreza del Censo, este grupo se caracteriza por tener un mínimo de dos NBI. Se estima que este segmento represente el 40% de la población rural total, lo que se traduce en un total de 100,000 personas o aproximadamente 17,000 hogares. En estas zonas, se encuentran 23 de las 31 tribus toluapanas que viven en estado de extrema pobreza y a las que el proyecto prestará atención particular. b) Hogares pobres , que incluyen familias campesinas con tierra propia, con o sin títulos de propiedad. La parcela de estas familias es generalmente inferior a las cinco manzanas y está ubicada en laderas. Además de producir granos básicos, se dedican también al cultivo de café tradicional. En general la articulación directa con el mercado es muy reducida. Se estima que este grupo incluye un número de 13,000 familias rurales por un total de 73,000 personas. c) Hogares menos pobres , que incluyen aquellas familias de productores que generalmente tienen tierra de propiedad superior a las cinco manzanas y que están ubicadas en las zonas productivas y dotadas de mejor infraestructura. Este grupo se caracteriza por tener mejores capacidades productivas y empresariales así como mayores oportunidades de acceso a fuentes de crédito, asistencia técnica y mercados. Generalmente, estos grupos han sido beneficiarios de la reforma agraria y están asentados en tierras debidamente tituladas por el INA, sobre todos en las zonas rurales de El Progreso y Santa Rita. Este segmento es bastante heterogéneo e incluye cafetaleros que exportan café orgánico a través de gremios o cooperativas, así como ganaderos y productores de palma africana del sector reformado. Aunque este segmento no representa al grupo-objetivo de beneficiarios directos del proyecto, su participación en tejido socioeconómico local así como en algunas de las organizaciones campesinas con las que el proyecto trabajará, su inserción en los mercados locales crea las condiciones para que un mínimo porcentaje de este grupo acceda a los recursos del proyecto.																																	
Metas																																	
8000 familias atendidas con enfoque de género incorporar 30% mujeres y 70% hombres a servicios y recursos del proyecto incorporar 10% jóvenes a servicios y recursos del proyecto 122 organizaciones con mayor capacidad para formular planes de desarrollo y de negocios 20 planes de negocios aprobados extrema pobreza del departamento reducida en 20% 10 sitios patrimoniales indígenas incluidos en planes de desarrollo.																																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO

ESTADO:
En Ejecución

No Convenio:
FIDA-743-HN
BCIE 1947

SIGADE: 01026

BIP: 001600010300

Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector:	Agroforestal y Turismo	Sub Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería
--	--	----------------	------------------------	--------------------	--

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.
Año 2009	21,113,460.00	603,975.73	21,717,435.73	21,113,460.00	603,980.00	21,717,440.00	6,309,346.35	507,235.36	6,816,581.71	31.39%
Año 2010	49,214,199.95	6,046,400.00	55,260,599.95	49,214,200.00	2,572,970.00	51,787,170.00	5,838,970.79	2,572,970.00	8,411,940.79	15.22%
Año 2011	64,752,900.00	4,204,000.00	68,956,900.00	69,847,150.00	4,165,210.00	74,012,360.00	31,926,550.00	4,175,210.00	36,101,760.00	52.35%
Año 2012	56,954,234.00	2,955,774.00	59,910,008.00	56,054,230.00	2,955,770.00	59,010,000.00	37,806,520.00	2,955,770.00	40,762,290.00	68.04%
Año 2013	82,957,475.00	1,998,650.00	84,956,125.00	82,957,480.00	1,998,650.00	84,956,130.00	76,064,320.00	1,998,650.00	78,062,970.00	91.89%
Año 2014	55,500,000.00	3,600,000.00	59,100,000.00	11,601,660.00	3,100,000.00	14,701,660.00	1,903,660.00	2,993,800.00	4,897,460.00	8.29%
Año 2015	41,225,490.00	1,786,320.00	43,011,810.00	41,225,490.00	1,786,320.00	43,011,810.00	15,546,280.00	1,786,320.00	17,332,600.00	40.30%
Año 2016	71,166,640.00	4,899,800.00	76,066,440.00	31,996,640.00	4,899,800.00	36,896,440.00	26,957,280.00	2,589,720.00	29,547,000.00	80.08%
Año 2017	1,500,000.00	2,600,000.00	4,100,000.00	1,500,000.00	2,600,000.00	4,100,000.00	241.46	1,173,900.00	1,174,141.46	28.64%

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2009	1,117,403.98	31,964.67	1,149,368.66	1,117,403.98	31,964.90	1,149,368.88	333,914.42	26,844.81	360,759.23	31.39%
Año 2010	2,604,601.19	319,998.31	2,924,599.50	2,604,601.19	136,171.28	2,740,772.48	309,020.37	136,171.28	445,191.65	15.22%
Año 2011	3,426,967.84	222,491.55	3,649,459.38	3,696,574.77	220,438.63	3,917,013.41	1,689,673.51	220,438.63	1,910,112.14	52.34%
Año 2012	2,994,439.22	155,403.47	3,149,842.69	2,947,120.40	155,403.26	3,102,523.66	1,987,724.50	155,403.26	2,143,127.76	68.04%
Año 2013	4,028,098.25	97,046.81	4,125,145.06	4,028,098.49	97,046.81	4,125,145.30	3,693,392.96	97,046.81	3,790,439.77	91.89%
Año 2014	2,694,868.10	174,802.25	2,869,670.35	563,332.31	150,524.16	713,856.48	92,434.46	145,367.50	237,801.96	8.29%
Año 2015	1,843,089.56	79,754.97	1,922,844.53	1,843,089.56	79,861.94	1,922,951.50	695,035.68	79,861.94	774,897.62	40.30%
Año 2016	3,075,694.08	211,760.54	3,287,454.62	1,382,837.19	211,760.54	1,594,597.72	1,165,045.12	111,923.04	1,276,968.16	80.08%
Año 2017	62,131.61	107,694.79	169,826.40	62,131.61	107,694.79	169,826.40	10.00	48,624.20	48,634.20	28.64%

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017					% Ejecución	Programación 2018
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Consolidación de la información de los componentes del Proyecto	Porcentaje	40	40	100%	40					40	40				40	100

Problemática
El Proyecto se encuentra en proceso de cierre financiero.
Aprobación del Plan de cierre del Proyecto
Aprobación por parte del BCIE del Plan Global de Inversiones

Acción			Acciones Propuestas			Responsable			Fecha		
dar seguimiento para que las actividades de cierre del Proyecto se realicen en tiempo y forma						UAP-SAG/FIDA			31/03/2017		

Contactos de la Unidad Ejecutora				Contactos Organismo Financiero			
Gustavo Argeñal/ Coordinador General del PROMECOM				FIDA: Contacto: Glayson Ferrarri/ g.ferraridosantos@ifad.org BCIE: Contacto Elan Tabora/etabora@bcie			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA													PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I				ESTADO: En Ejecución																	
SIGADE																																		
BIP 001600012200																																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)						Sector:		Productivo		Sub Sector:		RIEGO																			
Costo y Financiamiento						Desembolsos						Ejecución US\$																						
Tipo de Fondos:			Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)*		Desembolsado				Por Desembolsar																					
Moneda			Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares			26,500,000.0						26,500,000.0		4,502,868.0		0.0		4,502,868.0		17.0		21,997,132.0		0.0		21,997,132.0		83.0		4,538,775.4		0.0		4,538,775.4		17.1	
Lempiras			639,770,950.0				0.0		639,770,950.0		108,709,590.1		0.0		108,709,590.1		17.0		531,061,359.9		0.0		531,061,359.9		83.0		109,576,476.6		0.0		109,576,476.6		17.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
			15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015				15/01/2018																			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%																	
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			14,500,000.0						0.0						14,500,000.0		54.7																	
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN			8,558,823.5						0.0						8,558,823.5		32.3																	
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			1,764,705.9						0.0						1,764,705.9		6.7																	
GESTIÓN AMBIENTAL			882,352.9						0.0						882,352.9		3.3																	
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO			794,117.7						0.0						794,117.7		3.0																	
TOTAL			26,500,000.0						0.0						26,500,000.0		100.0																	
Objetivos del Proyecto																																		
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																																		
Descripción del Proyecto																																		
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
Departamento del Paraiso, Municipio de Danli, Valle de Jamastran																																		
Beneficiarios																																		
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																																		
Metas Globales																																		
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																											
	Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																			
Programación Año 2015	43,658,105.0			43,658,105.0		43,658,105.0			43,658,105.0		-			-	-																			
Programación Año 2016	89,000,000.0			89,000,000		105,020,000.0			105,020,000.0		105,020,000.00			105,020,000	100																			
Programación Año 2017	7,000,000.0			70,000,000		70,000,000.0			70,000,000.0		-		0.0	-	-																			

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA		PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE															
BIP 001600012200															
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)					Sector:		Productivo			Sub Sector:		RIEGO	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.		
Programación Año 2015		1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-		-		-	-		
Programación Año 2016		4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37		-		4,538,775.37	100		
Programación Año 2017		289,947.5		2,899,475.2	2,899,475.2		2,899,475.2	-		-		-	-		
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2016		Programación 2017					Ejecutado 2017				% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componentes:															
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	1,000													
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1													
Problemática															
La Empresa APOLLO, presentó a la SAG la programación de la ejecución del proyecto, pendiente inicio de la obra física. La maquinaria viene en camino al país vía marítima.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Seguimiento al plan de trabajo presentado por la Empresa Apollo										SAG				31/03/2017	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Ing. Juan Carlos Colindres/Director de Riego y Drenaje/SAG; correo: juancarlos.colindrez@yahoo.es Ing. Ramon Carcamo/Asistente Secretario de Estado de la SAG															

Ficha Actualizada al 31 de Marzo de 2017, Tipo de Cambio US\$.1.00 L.24.1423
Elaborada por: Karina Maldonado/Especialista en Proyectos

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN		PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)											ESTADO: En Ejecución				
SIGADE: GE01154																	
BIP 001600012300																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA						Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	14,300,000.00	3,000,000.00		17,300,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	8.1	15,900,000.00		15,900,000.00	91.9	191,354.13		191,354.13	1.1	
Lempiras	345,234,890.00	72,426,900.00		417,661,790.00	33,799,220.00		33,799,220.00	8.1	383,862,570.00		383,862,570.00	91.9	4,360,807.52		4,360,807.52	1.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013			23/09/2020				
Componentes 1/		Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%					
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales		3,672,431.00				3,672,431.00				3,672,431.00		21.2					
Desarrollo Productivo y de Negocios		4,047,169.00				3,000,000.00				7,047,169.00		40.7					
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social		1,424,006.00								1,424,006.00		8.2					
Organización y Gestión		5,156,394.00								5,156,394.00		29.8					
TOTAL		14,300,000.00				3,000,000.00				17,300,000.00		100.0					
Objetivos del Proyecto																	
Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Proyecto.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																	
Beneficiarios																	
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																	
Metas Globales																	
Alcanzar 400,000 hectareas de tierra agrícola con sistemas de riego, satisfaciendo la seguridad alimentaria																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2016	19,197,560.00			7,974,540.00		7,974,540.00	2,407,850.00		2,407,850.00	30.2							
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	153,095,950.00		153,095,950.00	2,107,410.00		2,107,410.00	1.4							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2016				344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94	30.2							
Año 2017	6,341,398.71		6,341,398.71	6,341,398.71		6,341,398.71	87,291.19		87,291.19	1.4							

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE01154		
BIP 001600012300		

METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Prog. 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de caminos rurales terciarios	Kilómetro	15														
Asistencia Técnica brindada a organizaciones en postproducción y comercialización.	Organización	60														
Planes de Inversión aprobados a Organizaciones de productores rurales	Plan de Inversión	10														
Planes de Inversión elaborados	Plan	15					2		2							
Planes de fortalecimiento organizacional elaborados para el desarrollo agro empresarial a productores/as organizados.	Plan	30														

Problemática
 En este I trimestre se llevó a cabo el Taller de Arranque del Proyecto PRO LENCA con el Objetivo de realizar la inducción al equipo de la UGP y a representantes de los organismos nacionales vinculados con la ejecución, sobre los aspectos estratégicos, operativos y administrativos, para el cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto; dicho taller fue impartido por el FIDA con el apoyo de las Instituciones Gubernamentales vinculadas a la ejecución del Proyecto como es la SAG, SEFIN, MiAmbiente y otros Proyecto de la UAP/SAG.

Lanzamiento del Proyecto PRO-LENCA, con el objetivo de oficializar el inicio de operaciones del mismo, en este lanzamiento se contó con la participación del Señor Presidente Constitucional de la República, funcionarios del FIDA, Alcaldes de área de influencia del Proyecto, representantes de instituciones, ONGs, representantes de organizaciones, patronatos y personal de la Unidad Gerencial del Proyecto PRO- LENCA, entre otros.

Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades	UAP-SAG-SEFIN-FIDA	31/03/2017
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Carlos Cruz/Coordinador del UAP Iliana Rodríguez/Especialista de Monitoreo	Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño	

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de Marzo 2017
 Tipo de Cambio L.24.1423 por 1 US\$
