

**ARCFZ - Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario**  
**Coordinación General de Inocuidad de los Alimentos**  
**Dirección de Inocuidad de los Alimentos**

**PROYECTO: K001** ARCFZ Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias

Líder del Proyecto:	Quintana Garzón, Natalia Piedad (natalia.quintana@agrocalidad.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Almeida Granja, Wilson Patricio	Programas Relacionados:	
Titular:	Moreno Valarezo, Carla Rebeca	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	133340000.0000.386568	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,943,022.84
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	17/02/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	12/09/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Paz Caicedo, Valeria Natasha	Fecha del siguiente Hito:	05/10/2023

**DATOS GENERALES**

Descripción
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b> El proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias pretende mejorar el sistema de gestión de la inocuidad agropecuario mediante la ejecución de componentes específicos para cumplir con las exigencias nacionales e internacionales. Los componentes son 1) implementar procesos para asegurar la inocuidad en las cadenas agroalimentarias, 2) establecer sistemas de gestión para mitigación de riesgo en cadenas agroalimentarias, 3) implementar el Plan Nacional para la mitigación y control de la resistencia a los antimicrobianos, 4) asegurar la trazabilidad aplicada a cadenas priorizadas, y 5) Socializar los sistemas de inocuidad a los actores de las cadenas agroalimentarias.</p> <p><b>PRODUCTO / SERVICIO:</b> El proyecto mejorará el sistema de gestión de la inocuidad agropecuaria, aumentando la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva.</p> <p><b>LÍNEA BASE:</b> Número de notificaciones a incumplimientos de normativa internacional por presencia de contaminantes en productos agroexportables (reducción) Para cuantificar la línea base se ha considerado el promedio de las notificaciones recibidas en los últimos cuatro años. Con el accionar del proyecto se busca que cada año sean menos las notificaciones recibidas mercados internacionales por presencia de contaminantes en la agroexportación.</p> <p>Porcentaje de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica Es un indicador que se calcula anualmente tomando en cuenta el número de actores sancionados, en comparación con el número total de actores registrados en el Sistema Nacional de Producción Orgánica.</p> <p>Porcentaje de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias Es un indicador que se calcula para incrementar el 0,02% anualmente el número de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias. Las Unidades de Producción universo son 842.891 (Censo agropecuario de 2000), y la línea base fue calculada según las unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias certificadas en el año 2021 (835).</p> <p>Número de actores capacitados en temáticas RAM Considerando desde el inicio de la iniciativa de mitigar la resistencia antimicrobiana en el año 2019, a la fecha se cuenta con una línea base de 1232 actores.</p> <p>Porcentaje de implementación del plan de trazabilidad en la producción primaria agropecuaria No existe un sistema de trazabilidad de inocuidad que pueda cumplir con los requerimientos impuestos por los mercados internacionales, por lo que la línea base de este indicador es cero. Este indicador busca tener un sistema de trazabilidad 100% operativo, sin embargo, la meta se plantea al 50% en función de la adopción del sistema a nivel de los productores, conforme los productores de las diferentes cadenas productivas vayan adoptando el sistema, se podrá incrementar el porcentaje de adopción.</p> <p>Número de actores capacitados en temáticas de inocuidad. Es un indicador de cumplimiento anual, que cuantifica el número personas capacitadas en temas de inocuidad, vs el número de personas planificadas a socializar.</p> <p><b>OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:</b> Mejorar el sistema de gestión de la inocuidad agropecuario mediante la ejecución de componentes específicos para cumplir con las exigencias nacionales e internacionales.</p> <p><b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementar procesos para asegurar la inocuidad en las cadenas agroalimentarias.</li> <li>2. Establecer sistemas de gestión para mitigación de riesgo en cadenas agroalimentarias.</li> <li>3. Implementar el Plan Nacional para la mitigación y control de la resistencia a los antimicrobianos.</li> <li>4. Asegurar la trazabilidad aplicada a cadenas priorizadas.</li> </ol>

## DATOS GENERALES

### Descripción

5. Socializar los sistemas de inocuidad a los actores de las cadenas agroalimentarias.

### Beneficios Cualitativos

Busca mejorar los procesos de inocuidad asegurando la calidad de los productos agropecuarios en su fase primaria de consumo nacional y aumentar los flujos comerciales a través de la reducción de las notificaciones internacionales por eventos de inocuidad, mediante la aplicación de exigencias nacionales e internacionales.

El proyecto mejorará el sistema de gestión de la inocuidad agropecuaria, aumentando la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva.

### Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios directos serán los productores agropecuarios - cuantificados a través de las UPAs- dedicadas a la producción de alimentos en fase primaria para el consumo interno del Ecuador y aquellas UPAs cuya producción se destina a la agroexportación.

Los beneficiarios indirectos son los habitantes del Ecuador quienes consumen alimentos de producción nacional. Se benefician de manera indirecta del accionar del proyecto ya que debido a la ejecución de las actividades de los diferentes componentes se busca aumentar la garantía de inocuidad de los alimentos.

### Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 4 años

COSTO: 28.152.671,38 USD

ALCANCE: Incrementar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del 13.35% al 17.67%

RECURSOS: 1.1.1 Contratación de personal en planta central y provincias para el control y supervisión de médicos veterinarios Vincular para 2023, 2024 y 2025; 31 profesionales de tercer nivel en medicina veterinaria o Ingenieros Zootecnistas para las Direcciones Distritales y la Dirección de Inocuidad de Alimentos, que serán catalogados como supervisores sanitarios y que serán vinculados bajo modalidad de contratos ocasionales, con remuneración de servidor público 5 Vincular para 2022 un profesional para la Dirección de Inocuidad y 2 profesionales 2023, 2024 y 2025 con formación de tercer nivel con perfil pecuario 2 técnicos pecuario y que cumplan el perfil de analista de certificación de producción primaria y buenas prácticas 3, que serán vinculados bajo modalidad de contratos ocasionales, con remuneración de servidor público 5.

1.1.2 Contratación de personal bajo facturación para inspección sanitaria: Vincular para 2023, 2024 y 2025, 203 profesionales de tercer nivel, que por mandato de Ley y de regulaciones internacionales deberán ser de formación exclusiva en medicina veterinaria, que serán catalogados como inspectores sanitarios y serán vinculados bajo modalidad de prestación de servicios profesionales, debiendo contar con movilización y equipo tecnológico portátil propio (computador), con remuneración de servidor público 5 (SP%) más IVA.

1.1.3 Compra de sellos de clausura y actas de decomiso

1.2.1 Contrato de personal bajo facturación para monitoreo: Para esta actividad se ha considerado la vinculación de recurso humano para el territorio, en total 32 técnicos (servidor público 5 -sp5-) y 1 técnico para planta central (servidor público 1 - sp1-) para poder realizar las actividades de la leche en su fase de producción primaria con alcance en inocuidad de alimentos. Su contratación será por facturación de servicios profesionales que deben contar con vehículo y equipos portátiles propios.

1.2.2 Adquisición de computadoras para técnicos Para la ejecución de esta actividad también se ha considerado la Adquisición de una computadora portátil para el técnico de cada provincia (23) que va a ser contratado para realizar las actividades de vigilancia de la leche en su fase de producción primaria con alcance en inocuidad de alimentos tanto en campo como en oficina.

1.2.3 Adquisición de equipos de protección para realización de monitoreo La vigilancia de la leche en su fase de producción primaria con alcance en inocuidad de alimentos conlleva labores de muestreo en campo, por lo que deben ser provisto al personal equipos de protección personal para salvaguardar la seguridad ocupacional.

1.2.4. Adquisición de equipos para realización de monitoreos Adquisición de equipos para realización de análisis de detección de suero de leche en campo (maletines). Cada maletín cuantificado por provincia incluye una mini centrifuga de campo, lector portátil de bolsillo, Caja de transportación, micropipeta (100 µl a 1.000 µl) e incubadora portátil. Es considerado 1 maletín por provincia y la compra se va a realizar en el año 2023.

1.2.5 Adquisición de reactivos para la realización de monitoreos Los reactivos contemplados a ser adquiridos son test inmunocromatográfico para la detección cualitativa de glicomacropéptido de caseína que puede ser utilizada tanto en leche cruda, como en leche pasteurizada y leche UHT. La presentación es en cajas de 48 kit cada una.

1.2.6 Adquisición de equipos para realización de monitoreos Compra de 23 potenciómetros (1 por cada provincia) para que sean utilizados por los técnicos a ser contratados en provincias para realizar análisis en campo.

1.2.7 Servicio de calibración de equipos Compra de 23 potenciómetros (1 por cada provincia) para que sean utilizados por los técnicos a ser contratados en provincias para realizar análisis en campo.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 41.73 %  
 Fecha de Inicio: 17/02/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

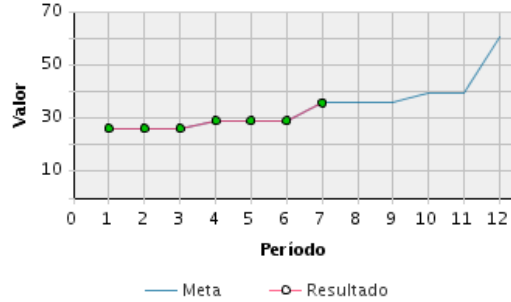

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	26 %	26 %	26 %	29 %	29 %	29 %	36 %	36 %	36 %	40 %	40 %	60 %
	Avance real acumulado											
	26 %	26 %	26 %	29 %	29 %	29 %	36 %					
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●					

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>AGOSTO 2023:</b> Durante este periodo se realizaron las gestiones para la contratación por reemplazo de un técnico (Morona Santiago), se realizaron las gestiones para la contratación de 1 técnico adicional 1 (DCS-PC), solicitud aprobada por DE.</p> <p>Se subieron los resúmenes ejecutivos del año 2022, en virtud de las solicitudes de autorización emitidas por la CGIA mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2023-000668-M, 000669-M, 000670-M, 000673-M y 000674-M y autorizadas por la DGPE mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2023-001264-M, 001265-M, 001266-M, 001290-M y 001291-M y mediante ticket de GPLI 314209, 314213, 314214, 314215 y 314211.</p> <p>C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado: la DG-Sante de la Comisión Europea, emitió 3 notificaciones por incumplimiento de normativa internacional, en pitahaya y banano, en: Países Bajos, Polonia y España. Adicionalmente, se realizó la revisión de la documentación de las notificaciones recibidas por incumplimiento y realizó la coordinación para visitas in situ (con provincia), se realizó una reunión con la DAJ a fin de aclarar los vacíos legales con respecto a la propuesta de normativa que se desarrolla. Hito cumplido 29.</p> <p>C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado: Hito cumplido 30: ejecución del 93 % del operativo de cacao orgánico, con 24 muestras tomadas en: Pichincha, El Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y Los Ríos. se realizó una reunión de trabajo con operadores grupales, que servirá de insumo para consolidar el sustento técnico del manual de registro de auditores del SIC, se atendieron 14 notificaciones de los OC relacionadas con NC y causas administrativas de los operadores orgánicos, reunión de trabajo con OC para tratar temas sobre la Resolución 105, se emitieron 5 notificaciones de incumplimiento a los OC como parte del proceso de control y vigilancia, elaboración de sustentos técnicos - Instructivo general para promover y regular la producción orgánica, ecológica, biológica en el Ecuador. Hito cumplido 30.</p> <p>C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado: Para fortalecer la certificación de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias se desarrolló el curso para la formación de Implementadores de Buenas Prácticas Agropecuarias a través de la plataforma MOODLE de la Agencia. Así mismo, se realizó la articulación con varios actores como el MAG, GIZ, FIEDS, IICA entre otros, para buscar apoyo para los productores para que puedan implementar las BPA. Hito cumplido 31.</p> <p>C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado: se realizó el acercamiento con varias empresas privadas (Chemical Pharm, Industria y Soluciones en Salud Inhesol) que trabajan en el sector agroproductivo interesadas en temáticas RAM, lo que permite adaptar el material didáctico a ser presentado de acuerdo al interés en las temáticas de mejora de la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. Hito cumplido 32.</p>	Quintana Garzón, Natalia Piedad	04/09/2023 - 04:01 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>C5. I1. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado: respecto a las cargas en el Sistema GUIA de las capacitaciones ejecutadas en el mes de agosto 2023, no se tuvo inconveniente con el mismo; logrando cargar la información respectiva (incluidos anexos) a nivel nacional. Es importante mencionar que se está dando seguimiento a una falla detectada en el Sistema GUIA, la cual tiene relación a los archivos adjuntos en el mismo; los cuales se cargan, pero no se los puede visualizar en el reporte generado desde Planta Central.. Hito cumplido 33.</p> <p>En lo que respecta al componente 4, el Acuerdo Ministerial desarrollado interinstitucionalmente (con el apoyo de la asistencia técnica de la Unión Europea), se espera la revisión y aprobación del Acuerdo Ministerial.</p>		
<p>JULIO 2023: Durante este periodo se realizaron las gestiones para la contratación por reemplazo de 1 analista de difusión (DCS-PC) Y 2 técnicos-veterinarios (Pichincha y Santa Elena), se gestionó el ingreso de un analista de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 3 adicional (Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2023-000767-M).</p> <p>Se subió los resúmenes ejecutivos del año 2022, en virtud de las solicitudes de autorización emitidas por la CGIA mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2023-000668-M, 000669-M, 000670-M, 000673-M y 000674-M y autorizadas por la DGPE mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2023-001264-M, 001265-M, 001266-M, 001290-M y 001291-M y mediante ticket de GPLI 314209, 314213, 314214, 314215 y 314211.</p> <p>C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado: se recibió de SENASA - Argentina, 3 notificaciones por incumplimiento de normativa internacional, en banano y piña. Así mismo, se mantuvo una reunión con la CSV y la DDAT-tipo A Pichincha, 12 de julio a fin de revisar la Resolución 004: "GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE NOTIFICACIONES DE INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS", y el 24 de julio, una reunión con la CGIA a fin de definir directrices para continuar con el proceso de notificaciones hacia los agroexportadores. Hito cumplido 29.</p> <p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado: Inicio del operativo de toma de muestras de cacao en Pichincha. Se atendieron 23 notificaciones de Organismos de Certificación relacionados con NC y causas administrativas de operadores orgánico. Se culminó el levantamiento de requerimientos para la mejora del proceso de registro de operador orgánico (Sistema GUIA). Emisión de la R0193 sobre la transición para la implementación de los capítulos V y VI - Manual para el control de los productos orgánicos. Finalmente, se están elaborando los sustentos técnicos para la actualización del Instructivo de la normativa general para promover y regular la producción orgánica - ecológica - biológica en el Ecuador. Hito cumplido 30.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado: para fortalecer la certificación de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias se desarrolló el curso para la formación de Implementadores de Buenas Prácticas Agropecuarias a través de la plataforma MOODLE de la Agencia. Se realizó la socialización de la actualización de normativas para fortalecer la implementación y certificación. Así mismo, se realizó la articulación con varios actores como el MAG, GIZ, FIEDS, IICA entre otros para buscar apoyo para los productores para que puedan implementar las BPA. Hito cumplido 31.</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado: Se dictaron charlas a representantes de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de material reproductivo de la especie bovina. El evento se realizó el jueves 13 de julio, en AEB de Buatría (AEB), ubicado en Aloasí, cantón Mejía. Hito cumplido 32.</p> <p>C5. I1. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado: En virtud de los daños en el sistema GUIA (módulo de registro de capacitaciones), se requirió cargar nuevamente la información desde abril a junio a nivel nacional. El 24 de julio, se solicitó a nivel nacional la carga de información, dando prioridad a lo realizado durante el mes de julio y de esta manera se obtuvo el dato de 2758 actores capacitados en el mes de julio 2023. Hito cumplido 33.</p> <p>En lo que respecta al componente 4, el Acuerdo Ministerial desarrollado interinstitucionalmente (con el apoyo de la asistencia técnica de la Unión Europea), se espera la revisión y aprobación del Acuerdo Ministerial por parte de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>04/08/2023 - 10:19 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2022: Contratación de 1 analista de difusión 3. El personal contrato es el siguiente: GRUPO DE GASTO 71: 8 funcionarios: 5 DIA, 1 DDO, 1 DPGE y 1 DAF. GRUPO DE GASTO 73: 65 funcionarios: 8 DIA, 3 DDO, 3 DCS, 15 DDAT, 36 DDyJ.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>01/08/2023 - 08:55 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se han realizados las acciones correspondientes para la gestión y adquisición de productos y servicios relacionados con la contratación pública, para lo cual, se han desarrollado 2 subastas, 9 ínfimas, 9 catálogos y 1 pago al exterior (CIAO).</p> <p>Los procesos correspondientes a Adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación (Contrato 0079) y Material impreso para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos (Contrato 0053), fueron suscritos 08 de diciembre y el 08 de noviembre del año en curso, respectivamente, los mismos que cuentan con una vigencia de 30 días.</p> <p>Adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación (Contrato 0079): no se pudo liquidar la adquisición ya que el contratante emitió una factura incorrecta; se procedió a solicitar el cambio de factura -a más tardar hasta el 19 de diciembre- sin embargo, no fue factible, por lo tanto, se indicó a la empresa que no se podría liquidar en el año 2022, esta compra,</p> <p>Material impreso para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos (Contrato 0053): los insumos debieron entregarse hasta el 08 de diciembre, sin embargo, los mismos no fueron entregados en la fecha pactada por lo cual el proveedor ha solicitado prórroga de 30 días, sin embargo, el administrador de contrato indicó que se entregaría una prórroga de 12 días, misma que finalizó el 20 de diciembre. Es importante mencionar que el 19 de diciembre, el área requirente se puso en contacto con el proveedor, quien mencionó que al momento ha impreso el 40% del total de la compra, y que se podría realizar la entrega parcial, sin embargo, se informó, que se requerirá el 100% de la entrega, conforme lo establece el contrato.</p> <p>Es importante mencionar que se ha designado presupuesto a varias provincias, sin embargo, el mismo ha sido devuelto desde finales de septiembre hasta el mes de noviembre (particularmente en las provincias de Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El Oro).</p> <p>Todos los procesos relacionados con contratación pública se debieron remitir a más tardar hasta el 12 de diciembre del año en curso, conforme las directrices emitidas mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2022-002047-M, del 06 de diciembre del presente año.</p> <p>Finalmente, durante el mes de diciembre, se realizaron 2 reprogramaciones al POA.</p> <p>Se han preparado los términos de referencia del personal que se prevé será contratado para el año 2023 (servicios profesionales), y así mismo, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001401-M, se solicitó a la DE la aprobación del distributivo del personal para el año 2023.</p> <p>Así también se presentaron los siguientes informes:</p> <p>C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado. Hito cumplido 13.</p> <p>C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado. Hito cumplido 14.</p> <p>C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado. Hito cumplido 15.</p> <p>C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado. Hito cumplido 16.</p> <p>C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado. Hito cumplido 18.</p> <p>A fin de regularizar el ingreso de información en GPR, mediante memorando AGR-AGROCALIDAD-CIA-2023-000667, 669, 670, 673 y 674, se solicitó la autorización a la DGPE, este requerimiento también se realizó mediante GLPI: 314209 - 314211 - 314213 - 314214 - 314215.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2022: Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DCS-2022-000242-M, del 10 de noviembre del año en curso, la Dirección de Comunicación Social, realizó la solicitud de contratación de dos Analistas de Difusión 3, quienes -se esperaba- ingresen el 15 de noviembre del año en curso, sin embargo, a la fecha mencionada, solamente ingresó un profesional, motivo por el cual, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001314-M, del 16 de noviembre, se realice la solicitud de contratación por reemplazo, del Analista de Difusión 3, pendiente de contrato, quien se prevé ingresará a la institución a partir del 01 de diciembre del año en curso.</p> <p>Así mismo, a partir del 01 de noviembre del año en curso, ingresaron tres profesionales a la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos, para lo cual, en la Dirección de Inocuidad de Alimentos se incorporaron: 1 analistas de certificación de producción primaria y buenas prácticas y 1 analista de vigilancia y control de producción primaria, mientras que en la Dirección de Orgánicos ingresó 1 Analista de Control de Productos y Actores Orgánicos 3.</p> <p>En cuanto a los procesos de contratación pública, se encuentran en curso dos procesos de subasta inversa, el proceso Nro. SIE.ARCFIZ-41-2022, sobre "Adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación", se ha emitido la adjudicación y se firmó la Resolución 0379, el pasado 28 de noviembre del año en curso, por un valor de \$ 7.900,00; mientras que el proceso Nro. SIE.ARCFIZ-40-2022, sobre "Material impreso para la Coordinación</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>01/08/2023 - 08:53 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>General de Inocuidad de Alimentos", tiene contrato firmado al 08 de noviembre del año en curso, con una duración de 30 días.</p> <p>En lo que refiere a los procesos de catálogo electrónico, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DTIC-2022-000490-M, del 16 de noviembre de 2022, la DTIC solicitó la autorización de la adquisición de equipos informáticos, así mismo, mediante Resolución 0363 se inició el proceso de "Adquisición de rollos de papel para el monitoreo efectivo de parámetros sanitarios con alcance en inocuidad en la cadena láctea".</p> <p>Finalmente, en lo que respecta a los procesos de ínfimas cuantías, durante el mes noviembre se ha solicitado - a la Dirección Administrativa Financiera- la gestión de compra de insumos para el monitoreo efectivo de parámetros sanitarios con alcance en inocuidad en la cadena láctea, cajas térmicas, mismas que se están recibiendo en bodega y se está preparando la información para pago.</p> <p>El pasado 12 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Coordinador General de Inocuidad de Alimentos (S), solicitó informar el estado de los procesos de compras con respecto al presupuesto asignado en provincia.</p> <p>Durante el mes de noviembre se realizaron 1 reforma y 1 reprogramación del POA y por ende del PAC.</p> <p>Así también se presentaron los siguientes informes:</p> <p>C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado. Hito cumplido 13.</p> <p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado. Hito cumplido 14.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado. Hito cumplido 15.</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado. Hito cumplido 16.</p> <p>C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado. Hito cumplido 18.</p> <p>A fin de regularizar el ingreso de información en GPR, mediante memorando AGR-AGROCALIDAD-CIA-2023-000667, 669, 670, 673 y 674, se solicitó la autorización a la DGPE, este requerimiento también se realizó mediante GLPI: 314209 - 314211 - 314213 - 314214 - 314215.</p>		
<p>OCTUBRE2022: Contratación de 4 técnicos distritales de inocuidad de alimentos (Loja), 1 analista distrital y de articulación territorial (Cañar) - Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001151-M, y 1 analista de Control de Productos y Actores Orgánicos 3 (planta central), Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001149-M, así mismo, en virtud de los acuerdos en directorio, se solicitó la contratación de 2 analistas de difusión 3 - Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001190-M.</p> <p>En función de las directrices emitidas por DE, se realizaron varios cambios con respecto al personal del grupo 71 y 73 (en planta central), para lo cual, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001188-M, se solicitó la autorización de cambio de distributivo actual del grupo 71 y autorización de desvinculación Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias, y mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001199-M, se solicitó la autorización para contratación de personal, dichas solicitudes, respondieron a los requerimientos emitidos por la DPGE y DAF, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2022-002149-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2022-001691-M, respectivamente.</p> <p>Con el propósito de mantener al personal DIA (por cambio del grupo 71 al grupo 73), mediante se solicitó la autorización de contratación de 1 analista de CPPyBP3 y un analista de VyCCPP</p> <p>Se solicitó 3 reformas presupuestarias (Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001126-M, Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001135-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001191-M), así mismo, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001092-M, se realizó la reprogramación mensual del POA.</p> <p>Se se realizaron las gestiones para obtener los avales y certificaciones presupuestarias correspondientes a 8 procesos relacionados a ínfimas cuantías y catálogos electrónicos.</p> <p>Con respecto a los procesos de subasta inversa, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001158-M, se realizó la solicitud de criterio jurídico sobre Proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA para la "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TÉCNICOS DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN", Código SIE-ARCFIZ-41-2022, y se realizaron los trámites respectivos para gestionar el contrato del proceso Subasta Inversa Electrónica N° SIE-ARCFIZ-40 -2022, correspondiente a "MATERIAL IMPRESO PARA LA COORDINACION GENERAL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS".</p> <p>Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001130-M, se emitió respuesta sobre la matriz de ejecución de las metas físicas (III trimestre).</p> <p>Así también se presentaron los siguientes informes:</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>01/08/2023 - 08:44 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado. Hito cumplido 13.</p> <p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado. Hito cumplido 14.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado. Hito cumplido 15.</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado. Hito cumplido 16.</p> <p>C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado. Hito cumplido 18.</p> <p>A fin de regularizar el ingreso de información en GPR, mediante memorando AGR-AGROCALIDAD-CIA-2023-000667, 669, 670, 673 y 674, se solicitó la autorización a la DGPE, este requerimiento también se realizó mediante GLPI: 314209 - 314211 - 314213 - 314214 - 314215.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022: Se realizaron las gestiones correspondientes para contratar el perfil pendiente en la provincia de Manabí, mismo que se planificó contratar a partir del 01 de septiembre del año en curso, esta solicitud se realizó a través de Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000812-M. En este sentido, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000961-M, del 08 de septiembre del año en curso, se solicitó la autorización para la contratación de dos técnicos de inocuidad de alimentos en las provincias de Cotopaxi y Esmeraldas, esto, en virtud de que se presentaron las renunciaciones.</p> <p>Por otro lado, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001002-M, del 15 de septiembre, se solicitó la autorización de contratación por reemplazo para el cargo de analista de la información 3 y analista administrativo financiero 1, y, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001007-M, del 16 de septiembre del año en curso, se solicitó la contratación para el cargo de analista de certificación de producción primaria y buenas prácticas 3 (en este último reemplazo se realizó para el grupo 71), mientras que para los reemplazos citados anteriormente, se realizaron para el grupo de gasto 73.</p> <p>Adicionalmente, considerando que al 30 de septiembre del año en curso, se debía incluir la acción de mitigación "Capacitar a los actores en temas de cultura de inocuidad de alimentos", con relación al riesgo "La falta de fortalecimiento del sistema de inocuidad en las cadenas agroalimentarias CAUSARÍA incumplimiento de la normativa nacional e internacional", al respecto, se solicitó una prórroga de tiempo mediante correo electrónico del 28 de septiembre del año en curso, por lo cual, dicha solicitud fue aprobada por la DPGE mediante ticket 289 163, en este mismo sentido, mediante correo electrónico del 21 de septiembre, se solicitó aprobar el cambio del resultado del indicador JULIO-SEPTIEMBRE "Número de actores capacitados en temáticas de inocuidad", para lo cual, dicha solicitud se realizó mediante ticket 288546. Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000942-M, del 06 de septiembre se realizó la solicitud de la sexta reprogramación del POA (edición 20).</p> <p>En cuanto a los procesos de compras públicas, se solicitó la publicación de subastas inversas del proceso correspondiente a "Adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación", dicha solicitud se realizó mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000937-M, del 05 de septiembre del año en curso, así mismo, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000938-M, de la misma fecha, se solicitó la gestión para la contratación del servicio de material impreso para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos.</p> <p>Así también se presentaron los siguientes informes:</p> <p>C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado. Hito cumplido 8.</p> <p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado. Hito cumplido 9.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado. Hito cumplido 10.</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado. Hito cumplido 11.</p> <p>C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado. Hito cumplido 12.</p> <p>A fin de regularizar el ingreso de información en GPR, mediante memorando AGR-AGROCALIDAD-CIA-2023-000667, 669, 670, 673 y 674, se solicitó la autorización a la DGPE, este requerimiento también se realizó mediante GLPI: 314209 - 314211 - 314213 - 314214 - 314215.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>31/07/2023 - 06:10 PM</p>
<p>AGOSTO 2022: Se realizaron las gestiones correspondientes para realizar las contrataciones pendientes a partir del primero de agosto de 2022, esto considerando que quedó pendiente la contratación de 5 técnicos, ya que quedaron vacantes por contratar, para las provincias</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>31/07/2023 - 05:59 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de Orellana (1 técnico de inocuidad de alimentos), Santa Elena (1 analista administrativo), y 3 técnicos en planta central (Analista de Vigilancia y Control de Contaminantes, Analista de Evaluación de Insumos para producción orgánica agropecuaria 3 y Analista de la información 3); estas contrataciones, se realizaron en virtud de que el mes anterior no se logró cubrir estas vacantes, por tal motivo, las solicitudes para contratación, se realizaron a través de los siguientes memorandos: AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000671-M, AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000735-M, AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000670-M, AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000758-M y AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000774-M, cabe recalcar que estas contrataciones refieren a personal del grupo de gasto 73.</p> <p>En este sentido, con el propósito de cubrir la vacante pendiente para el grupo de gasto 71 (para la Dirección de Orgánicos), se realizó la solicitud de contratación Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000631-M, y dicha funcionaria fue contratada a partir del 01 de agosto del año en curso.</p> <p>En cuanto a reprogramaciones al POA, se realizaron dos, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000865-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000865-M, del 22 y 30 de agosto del año en curso, mismas que fueron aprobadas por la DPGE mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2022-001672-M.</p> <p>Así también se presentaron los siguientes informes:</p> <p>C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado. Hito cumplido 8.</p> <p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado. Hito cumplido 9.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado. Hito cumplido 10.</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado. Hito cumplido 11.</p> <p>C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado. Hito cumplido 12.</p> <p>A fin de regularizar el ingreso de información en GPR, mediante memorando AGR-AGROCALIDAD-CIA-2023-000667, 669, 670, 673 y 674, se solicitó la autorización a la DGPE, este requerimiento también se realizó mediante GLPI: 314209 - 314211 - 314213 - 314214 - 314215.</p>		
<p>JULIO 2022: Se realizaron las gestiones correspondientes para realizar las contrataciones pendientes a partir del primero de julio de 2022, esto considerando que quedó pendiente la contratación de 8 técnicos a nivel nacional y 1 analista TICs, de este total, de los cuales, solamente ingresaron 6 técnicos a nivel nacional (Carchi, Los Ríos, Napo y Santa Elena) y no se contrató el analista TICs.</p> <p>Por otro lado, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000554-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000668-M, se solicitó a la máxima autoridad la redistribución del personal (grupo 73), para incrementar 1 técnico distrital y de articulación territorial de Inocuidad de Alimentos (Pichincha), 3 Analistas Administrativos 1 (Sucumbíos, Santa Elena y Planta Central) y 1 Analista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos 3, quienes, quienes se integraron al proyecto el 01 y 15 de julio de 2022.</p> <p>Adicionalmente, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000649-M, del 05 de julio de 2022, se remitieron Directrices sobre ingreso del personal de grupo de gasto 73 a julio 2022_ Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias, y mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000709-M, del 15 de julio, se informó sobre los responsables territoriales a nivel nacional_Proyecto Nacional para el Mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias</p> <p>En lo que respecta a los procesos de compras, se realizaron las siguientes gestiones:</p> <p>Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000743-M: solicitud de adquisición de materiales de oficina para desarrollo de actividades inherentes a los procesos de capacitación de los sistemas de inocuidad implementados a nivel nacional.</p> <p>Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000760-M: Solicitud de gestión para la contratación del servicio de "Material Impreso para la Coordinación General e Inocuidad de Alimentos".</p> <p>Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000763-M: Solicitud gestión de compra para la adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación.</p> <p>Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2022-001146-M, se convocó a un taller para realizar la revisión fichas GPR proyectos de inversión, para lo cual, en dicho espacio se acordó realizar todos los ajustes relacionados con los hitos e indicadores del 1er trimestre, sin embargo, para el proyecto de inocuidad queda pendiente finalizar el taller a fin de revisar los indicadores pendientes y proceder a los ajustes correspondientes, mismos que serán aprobados en el marco de la mencionada convocatoria.</p> <p>Así también se presentaron los siguientes informes:</p> <p>C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado. Hito cumplido 8.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>31/07/2023 - 05:38 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado. Hito cumplido 9.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado. Hito cumplido 10.</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado. Hito cumplido 11.</p> <p>C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado. Hito cumplido 12.</p> <p>A fin de regularizar el ingreso de información en GPR, mediante memorando AGR-AGROCALIDAD-CIA-2023-000667, 669, 670, 673 y 674, se solicitó la autorización a la DGPE, este requerimiento también se realizó mediante GLPI: 314209 - 314211 - 314213 - 314214 - 314215.</p>		
<p>JUNIO 2022: Se solicitó la autorización de contratación de personal del grupo de gasto 73, para ingreso a partir del 01 de junio de 2022, para lo cual, se contempló la siguiente contratación: 46 técnicos a nivel nacional (2 por provincia), y 14 analistas para planta central (9 analistas Dirección de Inocuidad de Alimentos, 2 analistas Dirección de Orgánicos, 2 analistas TICs y 1 analista DIRCOM), de este total planificado (60 técnicos), ingresaron 38 técnicos a nivel nacional y 13 técnicos en planta central, quedando pendiente la contratación de 9 técnicos: Carchi (1), El Oro (1), Los Ríos (2), Napo (2), Orellana (1), Santa Elena (1). Planta Central: analista TICs (1). Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000524-M, del 01 de junio, se emitieron las directrices sobre ingreso de los técnicos del grupo 73, para lo cual, se realizó una capacitación sobre los temas técnicos tanto en temas de vigilancia como certificación, inherentes al cumplimiento de las metas y propósito del indicador.</p> <p>Adicionalmente, mediante correo electrónico del 16 de junio, el Coordinador General de Inocuidad de Alimentos remitió los formatos de documentos que se requiere para proceder con el pago del grupo de gasto 73 (730606), para lo cual, tras reuniones mantenidas con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica y Dirección General Administrativa Financiera, se procedió a realizar un taller a nivel nacional con todos los técnicos del grupo 73, a fin de explicar -de manera general- sobre el llenado de formatos e informes previo pago de honorarios, en función de lo estipulado en Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2022-000285-M, del 18 de marzo del año en curso.</p> <p>Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000554-M, del 13 de junio, se solicitó a la máxima autoridad la modificación del distributivo actual del "Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias", en virtud de la actual necesidad institucional; en dicha solicitud se requirió la contratación adicional de: 3 servidores SP1 (personal administrativo): Planta Central, Sucumbíos y Santa Elena, 1 servidor SP1 (Técnico Distrital y Articulación Territorial de Inocuidad de Alimentos 3): Pichincha, en tal virtud, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000594-M, Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000595-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000597-M, se solicitó la autorización de contratación de los técnicos pendientes y nuevos para contratar.</p> <p>Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000569-M, se solicitó la 4ta reforma al POA edic. 10, con el propósito de solicitar avales y certificaciones presupuestarias para el pago de membresía CIAO, impresión de material para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos, Adquisición de Materiales de Oficina, y adquisición de prendas de protección, esta solicitud se realizó mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000570-M.</p> <p>Así también se presentaron los siguientes informes:</p> <p>C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado. Hito cumplido 3.</p> <p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado. Hito cumplido 4.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado. Hito cumplido 5.</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado. Hito cumplido 6.</p> <p>C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado. Hito cumplido 7.</p> <p>A fin de regularizar el ingreso de información en GPR, mediante memorando AGR-AGROCALIDAD-CIA-2023-000667, 669, 670, 673 y 674, se solicitó la autorización a la DGPE, este requerimiento también se realizó mediante GLPI: 314209 - 314211 - 314213 - 314214 - 314215.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>31/07/2023 - 05:32 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2022: El proyecto de inversión dio inicio a partir del mes de mayo 2022, por lo cual, ingresaron un total de 8 servidores a la Coordinación de Inocuidad de Alimentos. Durante este mes, se trabajó en la elaboración de los términos de referencia e informes justificativos, así como solicitud de avales y certificación presupuestaria, y solicitud de designación de administradores de contratos, para iniciar con el proceso de contratación de técnicos a nivel nacional y en planta central (personal planificado: 46 técnicos a nivel nacional, dos por provincia, y 3 analistas en planta central para las áreas de TICs y comunicación). Así mismo, se trabajó en la planificación de metas para el cumplimiento de indicadores del proyecto, así como en la preparación de lineamientos técnicos para garantizar el cumplimiento del propósito y metas del proyecto. Así también se presentaron los siguientes informes:</p> <p>C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado. Hito cumplido 3.</p> <p>C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado. Hito cumplido 4.</p> <p>C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado. Hito cumplido 5.</p> <p>C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado. Hito cumplido 6.</p> <p>C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado. Hito cumplido 7.</p> <p>A fin de regularizar el ingreso de información en GPR, mediante memorando AGR-AGROCALIDAD-CIA-2023-000667, 669, 670, 673 y 674, se solicitó la autorización a la DGPE, este requerimiento también se realizó mediante GLPI: 314209 - 314211 - 314213 - 314214 - 314215.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>31/07/2023 - 05:29 PM</p>
<p>JUNIO 2023: Durante este periodo se realizaron las gestiones para la contratación por reemplazo de 8 vacantes pendientes, así mismo, se gestionó el ingreso de 1 técnico adicional para Cañar (autorizado con Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DIA-2023-000061-M). Así mismo, con el propósito de regularizar la información cargada al sistema GPR y SIPeIP (año 2022 y I trimestre 2023), durante el mes de junio se trabajó en los informes de hitos e indicadores, para lo cual, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2023-000668-M, 000669-M, 000670-M, 000673-M y 000674-M, se solicitó la autorización de carga de información regularizada para periodos anteriores (2022), conforme los talleres previos mantenidos con la DPGE; para lo cual, con Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2023-001264-M, 001265-M, 001266-M, 001290-M y 001291-M, se autorizaron las solicitudes; así mismo, mediante GPLI 314209, 314213, 314214, 314215 y 314211, se solicitó autorización para carga de información 2022 y 2023.</p> <p>Es importante mencionar que se cargó al 06 de junio, se cargó la cédula presupuestaria del mes de mayo, para lo cual, se solicitó la autorización de carga a destiempo mediante GPLI 312643, así mismo, mediante GPLI 312759 se solicitó la autorización de cambio de fecha del plan de acción (solicitud autorizada).</p> <p>C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado: se revisó el portal RASFF Rapid Alert System Feed and Food), de la Unión Europea en donde se observa una notificación por incumplimiento de normativa internacional, esta alerta sanitaria advierte sobre la presencia de la sustancia no autorizada Clorpirifos en banano procedente de Ecuador en Polonia. Hito cumplido 24.</p> <p>C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado: Se ejecutó el plan de vigilancia 2023 dirigido a operadores orgánicos de riesgo y se realizaron las notificaciones a los OC respecto a operadores con incumplimientos de normativa. Se realizaron 2 talleres de sensibilización sobre medidas adicionales de control establecidas por la CE a los productos orgánicos de alto riesgo. Se crearon capacidades técnicas sobre la ISO/IEC 17065 y 17067, en 4 profesionales contratados por el proyecto, y, se aprobó el "Manual para el control de los productos orgánicos" que contribuye al fortalecimiento del sistema de control de la producción orgánica. Hito cumplido 25.</p> <p>C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado: Para fortalecer la certificación de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias se desarrolló el curso para la formación de Implementadores de BPA a través de la plataforma MOODLE de la Agencia. Así mismo, se realizó la articulación con varios actores como el MAG, GIZ, FIEDS, IICA entre otros para buscar apoyo para los productores para que puedan implementar las BPA. Hito cumplido 26.</p> <p>C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado: se realizaron las gestiones de acercamiento con la Corporación Favorita (empresa Tipti S.A.), donde se realizaron sensibilizaciones acerca la RAM. Hito cumplido 27.</p> <p>C5. 11. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado: Se realizó la revisión del material oficial de los temas de capacitación (en materia de inocuidad de alimentos), los cuales requirieron generar ajustes de forma y fondo para estandarizar el material de capacitación a nivel nacional; así mismo, se logró tener acceso a los archivos que se cargan en el aplicativo a nivel provincial mediante una mejora del sistema. Hito cumplido 28.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>05/07/2023 - 02:20 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En lo que respecta al componente 4, el Acuerdo Ministerial desarrollado interinstitucionalmente, ingresó a un proceso de revisión por parte de los actores involucrados y se encuentra en subsanación de observaciones, con fecha límite de presentación al 10 de julio.</p>		
<p>MAYO 2023: Durante este periodo se realizaron las gestiones para la contratación por reemplazo de 2 técnicos de inocuidad en Guayas y Santa Elena y un analista para la DTICS, teniendo 68 contratados de un total de 71. Así mismo, se han realizado los procesos de contratación pública conforme los lineamientos emitidos por la DAF.</p> <p>C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado: se realizó el seguimiento al portal RASFF Rapid Alert System Feed and Food), de la Unión Europea en donde no se observa ninguna notificación por incumplimiento de normativa internacional. Hito cumplido 24.</p> <p>C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado: conforme el plan de vigilancia 2023, se realizaron auditorías a operadores individuales y grupales en de Tungurahua, Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Imbabura, Manabí y Cotopaxi, para verificar el cumplimiento del "Instructivo de la normativa general para promover y regular la producción orgánica - ecológica - biológica en el Ecuador". Se realizó 1 notificación a un Organismo de Certificación debido a una No Conformidad encontrada en un operador, y, se atendieron 7 notificaciones de los Organismos de Certificación relacionados con No Conformidades y causas administrativas de los operadores orgánicos, al momento se está realizando seguimiento. Hito cumplido 25.</p> <p>C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado: se han realizado cursos virtuales ("Implementadores de Buenas Prácticas Agropecuarias"), articulaciones con entidades públicas y privadas para metas de certificación a implementadores a nivel nacional; articulación con organismos de cooperación internacional para capacitarse en "metodologías de capacitación en Buenas prácticas Agropecuarias" mediante talleres para auditorías con técnicos de la Agencia. Además, se han realizado reuniones con la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina (SUB-AFC), articulación con el Proyecto PIDARA y CREA con el fin de que se fomenten las capacidades de formación en implementación y certificación de BPA a los actores de las cadenas agroalimentarias. Hito cumplido 26.</p> <p>C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado: el técnico a cargo adaptó el material didáctico, incluyendo información de mayor índole técnico-práctico a ser presentado en las temáticas de mejora de la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos, esto debido a que, las capacitaciones están previstas presentarse a público con perfiles de tercer nivel en medicina veterinaria y zootecnia. Hito cumplido 27.</p> <p>C5. 11. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado: taller de alineamiento de directrices a las provincias; en el cual se estableció directrices puntuales sobre el proceso de capacitación, solicitud de material técnico utilizado para dictar las capacitaciones; para lo cual se ha solicitado a los responsables técnicos, emitan las presentaciones que se enviarán a provincia, a fin de estandarizar las mismas; definición de temas y subtemas de capacitación, mejoras solicitadas previamente (por parte de DIA a DTICS), para lo cual se definieron las 2 primeras mejoras y se estableció el documento funcional con el que el desarrollador trabajará en las mismas. Hito cumplido 28.</p> <p>En el contexto del componente 4, se han ejecutado 3 reuniones con la participación del grupo técnico de la Agencia, Subsecretaría de Redes e Innovación Agropecuaria y consultores UE. El documento borrador final de Acuerdo Ministerial, aún no ha sido socializado al interno del MAG, sin embargo, se ha estructurado un esquema para el proceso de reconocimiento de los sistemas de trazabilidad.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>05/06/2023 - 05:51 PM</p>
<p>ABRIL 2023: Durante este periodo se realizaron las gestiones para la contratación por reemplazo de un técnico de inocuidad de la provincia de Guayas y dos analistas para la Dirección de Orgánicos y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, teniendo 68 contratados de un total de 71. Así mismo, se han realizado los procesos de contratación pública conforme los lineamientos emitidos por la Dirección Administrativa Financiera en el mes de marzo.</p> <p>C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado: se realizó el seguimiento al portal RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), de la Unión Europea, en donde no se observa ninguna notificación por incumplimiento de normativa internacional. Hito cumplido 24.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>03/05/2023 - 03:52 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado: con el objetivo de sensibilizar a los productores de banano y cacao orgánico, el 13 de abril, se desarrolló de manera virtual la "Socialización de medidas adicionales para productos provenientes de terceros países", con la presencia de 31 participantes. Se obtuvieron los resultados del análisis de laboratorio de todas las muestras tomadas en el operativo de banano orgánico, desarrollado en el primer trimestre. Los resultados evidencian que no se encontraron residuos de productos no permitidos para la orgánica en las muestras tomadas, por lo que no se efectuaron notificaciones a los organismos de certificación. Finalmente, se atendieron 9 notificaciones de los Organismos de Certificación relacionados con No Conformidades y causas administrativas de los operadores orgánicos. Hito cumplido 25.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado: cursos virtuales mediante el MOODLE en la plataforma de la Agencia ("Implementadores de Buenas Prácticas Agropecuarias"), articulaciones con entidades públicas y privadas (PIDARA; AFC-MAG; Proamazonía) para metas de certificación a implementadores a nivel nacional; articulación con organismos de cooperación internacional (Cooperación Técnica Alemana GIZ- IICA) para fomentar la certificación de Buenas prácticas Agropecuarias mediante talleres para auditorías con técnicos de la Agencia. Hito cumplido 26</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado: El pasado 25 y 27 de abril se llevaron a cabo capacitaciones en temáticas de resistencia a los antimicrobianos, cuyo énfasis fue buscar el apoyo de los responsables de la toma de decisiones contribuyendo al cambio social, con relación a un uso moderado de antimicrobianos. Hito cumplido 27.</p> <p>C5. 11. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado: Se realizaron gestiones con la DTICS relacionadas a mejoras al aplicativo del módulo de Registro de Capacitación de la herramienta del Sistema GUIA, debido a que no se puede verificar los respaldos de cada capacitación ingresada; por lo tanto, los técnicos distritales envían vía mail los respaldos para ser validados. Durante el mes de abril, se logró capacitar a 2.184 actores de la cadena agroalimentaria. Nota: En el número de actores especificado, no se encuentra lo reportado por la provincia de Pichincha, debido a que la carga que realizaron en el Sistema GUIA, específicamente los respaldos. Hito cumplido 28.</p> <p>En el contexto del Componente 4, se han ejecutado 7 reuniones, estas se realizaron con la participación del grupo técnico de la Agencia, Subsecretaría de Redes e Innovación Agropecuaria y el grupo de consultores de la Unión Europea. Con el documento consensuado y en proceso de elevación a acuerdo ministerial, se formalizará el proceso de elaboración de resolución técnica de la Agencia.</p>		
<p>MARZO 2023:</p> <p>C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado: Se solicitó información al agroexportador de la notificación 2023.1249, mediante Sistema de Gestión Quipux, con Oficio Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2023-000164-OF, del 24 de marzo de 2023, el exportador mediante correo ha solicitado una prórroga de 15 días para la entrega de la documentación. Es importante indicar que, no se ha recibido ninguna notificación por incumplimiento de normativa durante este mes (marzo). Hito cumplido 19.</p> <p>C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado: Se realizó el plan de vigilancia 2023, dirigido a operadores orgánicos de riesgo. Se reforzó las medidas de control a través de un operativo de banano orgánico que incluyó la toma de 40 muestras en predios registrados, en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Se elaboró la propuesta final del "Manual para el control de los productos orgánicos" previo a la emisión de la correspondiente Resolución Técnica. Hito cumplido 20</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado: Cursos virtuales mediante el MOODLE en la plataforma de la Agencia ("Implementadores de Buenas Prácticas Agropecuarias"), articulaciones con entidades públicas y privadas (PIDARA; AFC-MAG; Proamazonía) para metas de certificación a implementadores a nivel nacional; articulación con organismos de cooperación internacional (Cooperación Técnica Alemana GIZ- IICA) para fomentar la certificación de Buenas prácticas Agropecuarias mediante talleres para auditorías con técnicos de la Agencia. Hito cumplido 21</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado: las actividades correspondientes al mes de marzo del año 2023, se enfocaron en impulsar un cambio de comportamiento social, y, potenciar un uso responsable de los antimicrobianos, enfocados en una comunicación eficaz y consiste a través de capacitación presencial a los actores técnicos relevantes. En este sentido, se planificó una capacitación enfocada en el uso consciente de los antibióticos al personal de la Coordinación General de Alimentos, misma actividad que se desarrolló en el mes de reporte de este resumen ejecutivo. Hito cumplido 22</p> <p>C5. 11. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado: Se puso en ambiente de producción al módulo de Registro de Capacitación de la herramienta del Sistema GUIA, lo cual facilitará el registro y la descarga de información consolidada relacionada a los actores capacitados a nivel nacional. Adicionalmente se han remitido las metas que cada</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>27/04/2023 - 05:52 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>provincia a nivel nacional debe cumplir con respecto a las capacitaciones enfocadas en temas de inocuidad. Hito cumplido 23</p> <p>En lo que respecta al cumplimiento del componente 4, se indica lo siguiente: Con la participación de los representantes delegados del grupo de trazabilidad de la Agencia, se realizó la revisión de los documentos borrador de Acuerdo Ministerial de la Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria, esto con la finalidad de contar con el documento borrador y consensado entre la Subsecretaría de Redes e Innovación Agropecuaria, Agrocalidad y los consultores de la Unión Europea, este documento fue solicitado por la máxima autoridad del MAG hasta el 24 de marzo de 2023.</p> <p>Se autoriza a subir el resumen ejecutivo de enero 2023 corregido, mediante GLPI 307550</p>		
<p><b>FEBRERO 2023:</b></p> <p>C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado: se realizó el seguimiento al portal RASFF, en donde se observa 1 notificación por incumplimiento de normativa internacional en Bélgica, por presencia de contaminantes en maracuyá de Ecuador. En tal virtud, mediante correo electrónico del 23 de febrero, se solicitó a la CSV, información del exportador. Hito cumplido 19.</p> <p>C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado: 28 de febrero (Guayaquil): sensibilización a productores de banano orgánico, "Taller sobre medidas adicionales de control implementadas por la UE para productos orgánicos de terceros países", 86 participantes. Adicionalmente, se está desarrollando el curso virtual "Normativa Orgánica Ecuatoriana", con 56 inscritos. 24 de febrero, socialización del plan de vigilancia de los actores orgánicos. Desarrollo del Instructivo para el control de los productos orgánicos ecuatorianos, con el que se establecerán disposiciones para la producción, procesamiento, comercialización (importación y exportación de productos orgánicos). Se atendieron 17 notificaciones de los OC relacionados con NC y causas administrativas de los operadores orgánicos, al momento se está realizando el seguimiento respectivo. Hito cumplido 20.</p> <p>C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado: se han realizado las siguientes acciones: cursos virtuales en la plataforma de la Agencia y MAG - SEAL (Implementadores de BPA), capacitaciones virtuales con el CYD (a 100 productores articulados a las cadenas agroalimentarias), articulación con público-privada (PIATER-MAG para metas de certificación a implementadores a nivel nacional; Nestlé para conseguir el reconocimiento de esquemas equivalentes), articulación con organismos de cooperación internacional para fomentar la certificación de BPA. Hito cumplido 21.</p> <p>C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado: elaboración del cronograma de distribución de actores capacitados a ser ejecutado en tres cuatrimestres de 2023. Las capacitaciones se realizarán por parte de Planta Central; el analista a cargo elaboró la actualización de la información técnica a ser presentada en las jornadas de capacitación que se prevé dirigir estudiantes y otros actores de las cadenas agroalimentarias. Temáticas a compartir: RAM y UAM. Hito cumplido 22.</p> <p>C5. 11. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado): revisión del manual del módulo de Registro de Capacitaciones, con la finalidad de verificar el aplicativo, ajustar detalles y elevarlo al ambiente de producción. Aplicativo que mejorará de forma eficiente el desarrollo del Proyecto Nacional de Mejoramiento del Sistema de Inocuidad en Cadenas Agroalimentarias. Para el primer trimestre, a nivel nacional, se debe cumplir con 5.000 capacitaciones. Hito cumplido 22.</p> <p>En lo que respecta al cumplimiento del componente 4, se indica lo siguiente: dentro de la Agencia, se ha conformado el grupo de trazabilidad; el mismo tiene el objetivo de revisar, desarrollar y proponer normativa para la trazabilidad conforme sus competencias, se ha realizado la revisión de los documentos borrador de: Acuerdo Ministerial de la Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria, y Lineamientos Generales de Trazabilidad del Proyecto de Asistencia Técnica Internacional de la UE. Se ha llevado a cabo 4 reuniones durante este mes, se realizó un cuadro comparativo de los documentos borradores, lo que permitió emitir las observaciones pertinentes para la elaboración del borrador del acuerdo ministerial, con la finalidad que este documento faculte a la Agencia el desarrollo de la Resolución de Trazabilidad.</p> <p>Se autoriza a subir el resumen ejecutivo de enero 2023 corregido, mediante GLPI 307550</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>27/04/2023 - 05:48 PM</p>
<p><b>ENERO 2023:</b> Entre las actividades relevantes se citan las siguiente: C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado, se puede dar a conocer que, en el mes de enero del 2023, se hizo seguimiento al portal RASFF generada por la Unión Europea en donde no se mostró ninguna notificación, de la misma manera no se registró ninguna notificación por parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Hito cumplido 19</p> <p>C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado, se elaboró la planificación para el control y vigilancia a los operadores orgánicos, la cual contempla inspección y toma de muestras a operadores orgánicos con alcances de producción, procesamiento y comercialización en varias provincias del país.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>27/04/2023 - 05:43 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Adicionalmente, se elaboró la planificación para el operativo de banano y cacao orgánicos, los cuales se encuentran en el listado de productos de alto riesgo emitido por la Unión Europea. Por otra parte, se elaboró la planificación para la capacitación a operadores orgánicos sobre la Normativa orgánica ecuatoriano. Asimismo, se articuló con la empresa privada para la ejecución del taller de sensibilización frente a medidas adicionales de conteos emitidas por la Unión Europea para productos de alto riesgo. Hito cumplido 20.</p> <p>C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado, se realizaron las planificaciones para distribución de metas en provincia. Hito cumplido 21.</p> <p>C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado; se procedió a establecer la programación, distribución y cálculo de número de actores capacitados en temáticas de resistencia a los antimicrobianos destinadas a ser cumplidas en la provincia de Pichincha cantón Quito; para de esta manera dar cumplimiento al componente 3, actividad 3.1 en cuanto a la mejora de la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos, siguiendo los lineamiento de ejecución del Proyecto Nacional para el Mejoramiento del Sistema de la Inocuidad en Cadenas Agroalimentarias. Hito cumplido 22.</p> <p>C5. 11. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado; durante el mes de enero se realizó la distribución de metas por provincia, con la finalidad de cumplir la meta establecida para el año 2023, misma que es 25000 personas/actores capacitados en temas de inocuidad, conforme lo establece el Proyecto Nacional de Mejoramiento del Sistema de Inocuidad en Cadenas Agroalimentarias. Hito cumplido. Hito cumplido 22</p> <p>En el contexto del C4 del Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias, se han ejecutado las siguientes actividades durante enero 2023. Tres reuniones virtuales mediante plataforma TEAMS, a partir del 19 de enero con los siguientes temas de trabajo: Avances en los lineamientos nacionales de trazabilidad, que se han ejecutado por el grupo focal cadena de cacao, Documentación y planificación de los Pilotos de trazabilidad, Acuerdo de Coalición entre agrupaciones, empresas y actores de la cadena de cacao. Se autoriza a subir el resumen ejecutivo de enero 2023 corregido, mediante GLPI 307550</p>		
<p>MARZO 2023:</p> <p>Hito cumplido (C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado): Se solicitó información al agroexportador de la notificación 2023.1249, mediante Sistema de Gestión Quipux, con Oficio Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2023-000164-OF, del 24 de marzo de 2023, el exportador mediante correo ha solicitado una prórroga de 15 días para la entrega de la documentación. Es importante indicar que, no se ha recibido ninguna notificación por incumplimiento de normativa durante este mes (marzo).</p> <p>Hito cumplido (C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado): Se realizó el plan de vigilancia 2023, dirigido a operadores orgánicos de riesgo. Se reforzó las medidas de control a través de un operativo de banano orgánico que incluyó la toma de 40 muestras en predios registrados, en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Se elaboró la propuesta final del "Manual para el control de los productos orgánicos" previo a la emisión de la correspondiente Resolución Técnica.</p> <p>Hito cumplido (C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado): Cursos virtuales mediante el MOODLE en la plataforma de la Agencia ("Implementadores de Buenas Prácticas Agropecuarias"), articulaciones con entidades públicas y privadas (PIDARA; AFC-MAG; Proamazonía) para metas de certificación a implementadores a nivel nacional; articulación con organismos de cooperación internacional (Cooperación Técnica Alemana GIZ- IICA) para fomentar la certificación de Buenas prácticas Agropecuarias mediante talleres para auditorías con técnicos de la Agencia.</p> <p>Hito cumplido (C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado): las actividades correspondientes al mes de marzo del año 2023, se enfocaron en impulsar un cambio de comportamiento social, y, potenciar un uso responsable de los antimicrobianos, enfocados en una comunicación eficaz y consiste a través de capacitación presencial a los actores técnicos relevantes. En este sentido, se planificó una capacitación enfocada en el uso consciente de los antibióticos al personal de la Coordinación General de Alimentos, misma actividad que se desarrolló en el mes de reporte de este resumen ejecutivo.</p> <p>Hito cumplido (C4.I1. EJECUCIÓN - Informe de implementación del sistema de trazabilidad en la producción, aprobado): Con la participación de los representantes delegados del grupo de trazabilidad de la Agencia, se realizó la revisión de los documentos borrador de Acuerdo Ministerial de la Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria, esto con la finalidad de contar con el documento borrador y consensuado entre la Subsecretaría de Redes e Innovación Agropecuaria, Agrocalidad y los consultores de la Unión Europea, este documento fue solicitado por la máxima autoridad del MAG hasta el 24 de marzo de 2023.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>05/04/2023 - 03:56 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hito cumplido (C5. I1. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado): Se puso en ambiente de producción al módulo de Registro de Capacitación de la herramienta del Sistema GUIA, lo cual facilitará el registro y la descarga de información consolidada relacionada a los actores capacitados a nivel nacional. Adicionalmente se han remitido las metas que cada provincia a nivel nacional debe cumplir con respecto a las capacitaciones enfocadas en temas de inocuidad.</p>		
<p>FEBRERO 2023: Hito cumplido (C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado): se realizó el seguimiento al portal RASFF, en donde se observa 1 notificación por incumplimiento de normativa internacional en Bélgica, por presencia de contaminantes en maracuyá de Ecuador. En tal virtud, mediante correo electrónico del 23 de febrero, se solicitó a la CSV, información del exportador.</p> <p>Hito cumplido (C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado): 28 de febrero (Guayaquil): sensibilización a productores de banano orgánico, "Taller sobre medidas adicionales de control implementadas por la UE para productos orgánicos de terceros países", 86 participantes. Adicionalmente, se está desarrollando el curso virtual "Normativa Orgánica Ecuatoriana", con 56 inscritos. 24 de febrero, socialización del plan de vigilancia de los actores orgánicos. Desarrollo del Instructivo para el control de los productos orgánicos ecuatorianos, con el que se establecerán disposiciones para la producción, procesamiento, comercialización (importación y exportación de productos orgánicos). Se atendieron 17 notificaciones de los OC relacionados con NC y causas administrativas de los operadores orgánicos, al momento se está realizando el seguimiento respectivo.</p> <p>Hito cumplido (C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado): se han realizado las siguientes acciones; cursos virtuales en la plataforma de la Agencia y MAG - SEAL (Implementadores de BPA), capacitaciones virtuales con el CYD (a 100 productores articulados a las cadenas agroalimentarias), articulación con público-privada (PIATER-MAG para metas de certificación a implementadores a nivel nacional; Nestlé para conseguir el reconocimiento de esquemas equivalentes), articulación con organismos de cooperación internacional para fomentar la certificación de BPA.</p> <p>Hito cumplido (C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado): elaboración del cronograma de distribución de actores capacitados a ser ejecutado en tres cuatrimestres de 2023. Las capacitaciones se realizarán por parte de Planta Central; el analista a cargo elaboró la actualización de la información técnica a ser presentada en las jornadas de capacitación que se prevé dirigir estudiantes y otros actores de las cadenas agroalimentarias. Temáticas a compartir: RAM y UAM.</p> <p>Hito cumplido (C4.I1. EJECUCIÓN - Informe de implementación del sistema de trazabilidad en la producción, aprobado): Dentro de la Agencia, se ha conformado el grupo de trazabilidad; el mismo tiene el objetivo de revisar, desarrollar y proponer normativa para la trazabilidad conforme sus competencias, se ha realizado la revisión de los documentos borrador de: Acuerdo Ministerial de la Subsecretaría de Redes de Innovación Agropecuaria, y Lineamientos Generales de Trazabilidad del Proyecto de Asistencia Técnica Internacional de la UE. Se ha llevado a cabo 4 reuniones durante este mes, se realizó un cuadro comparativo de los documentos borradores, lo que permitió emitir las observaciones pertinentes para la elaboración del borrador del acuerdo ministerial, con la finalidad que este documento faculte a la Agencia el desarrollo de la Resolución de Trazabilidad.</p> <p>Hito cumplido (C5. I1. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado): revisión del manual del módulo de Registro de Capacitaciones, con la finalidad de verificar el aplicativo, ajustar detalles y elevarlo al ambiente de producción. Aplicativo que mejorará de forma eficiente el desarrollo del Proyecto Nacional de Mejoramiento del Sistema de Inocuidad en Cadenas Agroalimentarias. Para el primer trimestre, a nivel nacional, se debe cumplir con 5.000 capacitaciones.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>03/03/2023 - 06:05 PM</p>
<p>ENERO 2023: Entre las actividades relevantes se citan las siguiente: Hito cumplido (C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado), se puede dar a conocer que en el mes de enero del 2023, se hizo seguimiento al portal RASFF generada por la Unión Europea en donde no se mostró ninguna notificación, de la misma manera no se registró ninguna notificación por parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.</p> <p>Hito cumplido (C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado), se elaboró la planificación para el control y vigilancia a los operadores orgánicos, la cual contempla inspección y toma de muestras a operadores orgánicos</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>23/02/2023 - 05:59 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>con alcances de producción, procesamiento y comercialización en varias provincias del país. Adicionalmente, se elaboró la planificación para el operativo de banano y cacao orgánicos, los cuales se encuentran en el listado de productos de alto riesgo emitido por la Unión Europea. Por otra parte, se elaboró la planificación para la capacitación a operadores orgánicos sobre la Normativa orgánica ecuatoriano. Asimismo, se articuló con la empresa privada para la ejecución del taller de sensibilización frente a medidas adicionales de conteos emitidas por la Unión Europea para productos de alto riesgo.</p> <p>Hito cumplido (C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado), se realizaron las planificaciones para distribución de metas en provincia.</p> <p>Hito cumplido (C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado), se procedió a establecer la programación, distribución y cálculo de número de actores capacitados en temáticas de resistencia a los antimicrobianos destinadas a ser cumplidas en la provincia de Pichincha cantón Quito; para de esta manera dar cumplimiento al componente 3, actividad 3.1 en cuanto a la mejora de la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos, siguiendo los lineamiento de ejecución del Proyecto Nacional para el Mejoramiento del Sistema de la Inocuidad en Cadenas Agroalimentarias.</p> <p>Hito cumplido (C4.I1. EJECUCIÓN - Informe de implementación del sistema de trazabilidad en la producción, aprobado), en el contexto del C4 del Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias, se han ejecutado las siguientes actividades durante enero 2023.</p> <p>Tres reuniones virtuales mediante plataforma TEAMS, a partir del 19 de enero con los siguientes temas de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Avances en los lineamientos nacionales de trazabilidad, que se han ejecutado por el grupo focal cadena de cacao.</li> <li>.Documentación y planificación de los Pilotos de trazabilidad.</li> <li>.Acuerdo de Coalición entre agrupaciones, empresas y actores de la cadena de valor del Cacao Ecuatoriano.</li> </ul> <p>Hito cumplido (C5. I1. Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado), durante el mes de enero se realizó la distribución de metas por provincia, con la finalidad de cumplir la meta establecida para el año 2023, misma que es 25000 personas/ actores capacitados en temas de inocuidad, conforme lo establece el Proyecto Nacional de Mejoramiento del Sistema de Inocuidad en Cadenas Agroalimentarias.</p>		
<p>DICIEMBRE 2022: Para el mes de diciembre del año en curso, se dio únicamente un ingreso para la Dirección de Comunicación Social, para el cargo de Analista de Difusión 3 (SP5). A diciembre de 2022, el personal contrato es el siguiente:</p> <p>GRUPO DE GASTO 71:</p> <p>.8 funcionarios: 5 Dirección de Inocuidad de Alimentos, 1 Dirección de Orgánicos, 1 Dirección de Planificación y Gestión Estratégica y 1 Dirección Administrativa Financiera.</p> <p>GRUPO DE GASTO 73:</p> <p>.65 funcionarios: 8 Dirección de Inocuidad de Alimentos, 3 Dirección de Orgánicos, 3 Dirección de Comunicación Social, 15 Direcciones Distritales y de Articulación Territorial, 36 Dirección Distritales y Jefaturas.</p> <p>Desde mayo a diciembre 2022, se han realizados las acciones correspondientes para la gestión y adquisición de productos y servicios relacionados con la contratación pública, para lo cual, se han desarrollado 2 subastas inversas, 9 infimas cuantías, 9 catálogos electrónicos y 1 proceso que se le ha catalogado como "otros" (pago de membresía CIAO).</p> <p>ALERTA: Los procesos correspondientes a Adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación (Contrato 0079) y Material impreso para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos (Contrato 0053), fueron suscritos 08 de diciembre y el 08 de noviembre del año en curso, respectivamente, los mismos que cuentan con una vigencia de 30 días.</p> <p>Específicamente para lo que respecta al proceso de Adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación (Contrato 0079), no se pudo liquidar dicha adquisición en virtud de que el contratante emitió una factura incorrecta, motivo por el cual, se procedió a solicitar el cambio de factura -a más tardar hasta el 19 de diciembre- sin embargo, no fue factible, por lo tanto, se indicó a la empresa que no se podría liquidar en el año 2022, esta compra,</p> <p>En lo que refiere al proceso de Material impreso para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos (Contrato 0053), los insumos debieron entregarse hasta el 08 de diciembre, sin embargo, los mismos no fueron entregados en la fecha pactada por lo cual -al igual que en el caso arriba descrito-, es importante mencionar que el proveedor ha solicitado prórroga de 30 días, sin embargo, el administrador de contrato indicó que se entregaría una prórroga de 12 días, misma que finalizó el 20 de diciembre. Es importante mencionar que el 19 de diciembre, el área requirente se puso en contacto con el proveedor, quien mencionó que al momento ha impreso el</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>22/12/2022 - 04:41 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>40% del total de la compra, y que se podría realizar la entrega parcial, sin embargo, se informó (por parte del administrador de contrato), que se requerirá el 100% de la entrega, conforme lo establece el contrato.</p> <p>Por otro lado, es importante mencionar que se ha designado presupuesto a varias provincias, sin embargo, el mismo ha sido devuelto desde finales de septiembre hasta el mes de noviembre (particularmente en las provincias de Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El Oro).</p> <p>Todos los procesos relacionados con contratación pública se debieron remitir a más tardar hasta el 12 de diciembre del año en curso, conforme las directrices emitidas mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2022-002047-M, del 06 de diciembre del presente año.</p> <p>Finalmente, durante el mes de diciembre, se realizaron 2 reprogramaciones al POA.</p> <p>Durante el mes de diciembre, se han preparado los términos de referencia del personal que se prevé será contratado para el año 2023 (servicios profesionales), y así mismo, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001401-M, se solicitó a la máxima autoridad la aprobación del distributivo del personal para el año 2023.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2022: Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DCS-2022-000242-M, del 10 de noviembre del año en curso, la Dirección de Comunicación Social, realizó la solicitud de contratación de dos Analistas de Difusión 3, quienes -se esperaba- ingresen el 15 de noviembre del año en curso, sin embargo, a la fecha mencionada, solamente ingresó un profesional, motivo por el cual, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001314-M, del 16 de noviembre, se realice la solicitud de contratación por reemplazo, del Analista de Difusión 3, pendiente de contrato, quien se prevé ingresará a la institución a partir del 01 de diciembre del año en curso.</p> <p>Así mismo, a partir del 01 de noviembre del año en curso, ingresaron tres profesionales a la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos, para lo cual, en la Dirección de Inocuidad de Alimentos se incorporaron: 1 analistas de certificación de producción primaria y buenas prácticas y 1 analista de vigilancia y control de producción primaria, mientras que en la Dirección de Orgánicos ingresó 1 Analista de Control de Productos y Actores Orgánicos 3.</p> <p>En cuanto a los procesos de contratación pública, se encuentran en curso dos procesos de subasta inversa, el proceso Nro. SIE.ARCFIZ-41-2022, sobre "Adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación", se ha emitido la adjudicación y se firmó la Resolución 0379, el pasado 28 de noviembre del año en curso, por un valor de \$ 7.900,00; mientras que el proceso Nro. SIE-ARCFIZ-40-2022, sobre "Material impreso para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos", tiene contrato firmado al 08 de noviembre del año en curso, con una duración de 30 días.</p> <p>En lo que refiere a los procesos de catálogo electrónico, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DTIC-2022-000490-M, del 16 de noviembre de 2022, la DTIC solicitó la autorización de la adquisición de equipos informáticos, así mismo, mediante Resolución 0363 se inició el proceso de "Adquisición de rollos de papel para el monitoreo efectivo de parámetros sanitarios con alcance en inocuidad en la cadena láctea".</p> <p>Finalmente, en lo que respecta a los procesos de ínfimas cuantías, durante el mes noviembre se ha solicitado - a la Dirección Administrativa Financiera- la gestión de compra de insumos para el monitoreo efectivo de parámetros sanitarios con alcance en inocuidad en la cadena láctea, cajas térmicas, mismas que se están recibiendo en bodega y se esta preparando la información para pago.</p> <p>El pasado 12 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Coordinador General de Inocuidad de Alimentos (S), solicitó informar el estado de los procesos de compras con respecto al presupuesto asignado en provincia.</p> <p>Durante el mes de noviembre se realizaron 1 reforma y 1 reprogramación del POA y por ende del PAC, dichas solicitudes fueron emitidas a la Dirección de Planificación Estratégica y Dirección Administrativa Financiera, respectivamente.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>01/12/2022 - 10:31 AM</p>
<p>OCTUBRE2022: Se realizaron las gestiones correspondientes para contratar 4 técnicos distritales de inocuidad de alimentos (en la provincia de Loja), 1 analista distrital y de articulación territorial en la provincia de Cañar - Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001151-M, y 1 analista de Control de Productos y Actores Orgánicos 3 (planta central), Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001149-M, así mismo, en virtud de los acuerdos en directorio, se solicitó la contratación de 2 analistas de difusión 3, para lo cual, dicha solicitud fue realizada mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001190-M.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>17/11/2022 - 04:24 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Por otro lado, en función de las directrices emitidas por parte de la máxima autoridad, se realizaron varios cambios con respecto al personal del grupo 71 y 73 (en planta central), para lo cual, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001188-M, se realizó la solicitud de autorización de cambio de distributivo actual del grupo 71 y autorización de desvinculación Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias, y mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001199-M, se realizó la solicitud de autorización para contratación de personal para el "Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias", dichas solicitudes, respondieron a los requerimientos emitidos por la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica y a la Dirección Administrativa Financiera, realizadas mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2022-002149-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2022-001691-M, respectivamente.</p> <p>Con el propósito de mantener al personal de la Dirección de Inocuidad de Alimentos (por cambio del grupo 71 al grupo 73), mediante se solicitó a autorización de contratación de un analista de Certificación de Producción Primaria y Buenas Prácticas 3 y un analista de vigilancia y control de contaminantes en la producción primaria.</p> <p>Durante el mes de octubre se realizó la solicitud de tres reformas presupuestarias, y las mismas fueron solicitadas mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001126-M, Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001135-M y mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001191-M, así mismo, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001092-M (del 04 de octubre del año en curso), se realizó la reprogramación mensual del POA, correspondiente al mes de septiembre.</p> <p>Por otro lado, durante el mes de octubre se realizaron las gestiones para obtener los avales y certificaciones presupuestarias correspondientes a 8 procesos relacionados a ínfimas cuantías y catálogos electrónicos correspondientes a la adquisición de insumos para cumplir con el propósito del proyecto.</p> <p>Con respecto a los procesos de subasta inversa, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001158-M, se realizó la solicitud de criterio jurídico sobre Proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA para la "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE Á 'PROTECCIÓN PARA LOS TÉCNICOS DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN", Código SIE-ARCFIZ-41-2022, y se realizaron los trámites respectivos para gestionar el contrato del proceso Subasta Inversa Electrónica N° SIE-ARCFIZ-40 -2022, correspondiente a "MATERIAL IMPRESO PARA LA COORDINACION GENERAL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS".</p> <p>Finalmente, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001130-M, se emitió respuesta con respecto al el envío de la matriz de ejecución de las metas físicas correspondientes al tercer trimestre 2022, del "Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias".</p> <p>El presente resumen ejecutivo se sube a la fecha, en virtud de la solicitud realizada y aprobada mediante GLPI con número de ticket 293875.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022: Se realizaron las gestiones correspondientes para contratar el perfil pendiente en la provincia de Manabí, mismo que se planificó contratar a partir del 01 de septiembre del año en curso, esta solicitud se realizó a través de Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000812-M. En este sentido, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000961-M, del 08 de septiembre del año en curso, se solicitó la autorización para la contratación de dos técnicos de inocuidad de alimentos en las provincias de Cotopaxi y Esmeraldas, esto, en virtud de que se presentaron las renunciaciones.</p> <p>Por otro lado, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001002-M, del 15 de septiembre, se solicitó la autorización de contratación por reemplazo para el cargo de analista de la información 3 y analista administrativo financiero 1, y, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-001007-M, del 16 de septiembre del año en curso, se solicitó la contratación para el cargo de analista de certificación de producción primaria y buenas prácticas 3 (en este último reemplazo se realizó para el grupo 71), mientras que para los reemplazos citados anteriormente, se realizaron para el grupo de gasto 73.</p> <p>Por otro lado, con el propósito de regularizar los documentos e información ingresada al sistema GPR (para hitos e indicadores), en virtud de la reunión de trabajo con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, el pasado 15 de agosto del año en curso (misma que tuvo como propósito estandarizar la información en GPR), al respecto, se realizaron los cambios</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>05/10/2022 - 10:35 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>pertinentes en conjunto con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, esto, en virtud de que se ingresó información de las metas cumplidas (del 2do trimestre), en el sistema SIPEIP.</p> <p>Adicionalmente, considerando que al 30 de septiembre del año en curso, se debía incluir la acción de mitigación "Capacitar a los actores en temas de cultura de inocuidad de alimentos", con relación al riesgo "La falta de fortalecimiento del sistema de inocuidad en las cadenas agroalimentarias CAUSARÍA incumplimiento de la normativa nacional e internacional", al respecto, se solicitó una prórroga de tiempo mediante correo electrónico del 28 de septiembre del año en curso, por lo cual, dicha solicitud fue aprobada por la DPGE mediante ticket 289 163, en este mismo sentido, mediante correo electrónico del 21 de septiembre, se solicitó aprobar el cambio del resultado del indicador JULIO-SEPTIEMBRE "Número de actores capacitados en temáticas de inocuidad", para lo cual, dicha solicitud se realizó mediante ticket 288546.</p> <p>Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000942-M, del 06 de septiembre se realizó la solicitud de la sexta reprogramación del POA (edición 20).</p> <p>En cuanto a los procesos de compras públicas, se solicitó la publicación de subastas inversas del proceso correspondiente a "Adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación", dicha solicitud se realizó mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000937-M, del 05 de septiembre del año en curso, así mismo, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000938-M, de la misma fecha, se solicitó la gestión para la contratación del servicio de material impreso para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos.</p>		
<p>AGOSTO 2022: Se realizaron las gestiones correspondientes para realizar las contrataciones pendientes a partir del primero de agosto de 2022, esto considerando que quedó pendiente la contratación de 5 técnicos, ya que quedaron vacantes por contratar, para las provincias de Orellana (1 técnico de inocuidad de alimentos), Santa Elena (1 analista administrativo), y 3 técnicos en planta central (Analista de Vigilancia y Control de Contaminantes, Analista de Evaluación de Insumos para producción orgánica agropecuaria 3 y Analista de la información 3); estas contrataciones, se realizaron en virtud de que el mes anterior no se logró cubrir estas vacantes, por tal motivo, las solicitudes para contratación, se realizaron a través de los siguientes memorandos: AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000671-M, AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000735-M, AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000670-M, AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000758-M y AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000774-M, cabe recalcar que estas contrataciones refieren a personal del grupo de gasto 73.</p> <p>En este sentido, con el propósito de cubrir la vacante pendiente para el grupo de gasto 71 (para la Dirección de Orgánicos), se realizó la solicitud de contratación Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000631-M, y dicha funcionaria fue contratada a partir del 01 de agosto del año en curso.</p> <p>Por otro lado, con el propósito de regularizar los documentos e información ingresada al sistema GPR (para hitos e indicadores), se realizó una reunión de trabajo con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, el pasado 15 de agosto del año en curso, en donde se revisó cada uno de los hitos e indicadores (correspondientes al 1ero y 2do trimestre del año 2022), como producto de esta reunión, se manifestó que se requiere enviar GLPI y memos de autorización para su debida regularización, considerando que el objeto fue homologar la información ingresada en el SIPEIP. Los GLPI (para la solicitud de autorización de carga de informes de los indicadores del primer trimestre), fueron enviados con los siguientes números de caso: 284609, 284527, 284575, 284568 y 284686. Así mismo, Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000900-M, Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000899-M, Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000898-M, Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000897-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000896-M, del 29 de agosto, se solicitó de la autorización de cambio de metas en cero, con respecto a los indicadores del primer trimestre, para lo cual la DPGE emitió su respectiva autorización mediante memorando AGR-AGROCALIDAD_DPGE-2022-001663-M, AGR-AGROCALIDAD_DPGE-2022-001667-M, AGR-AGROCALIDAD_DPGE-2022-001666-M, AGR-AGROCALIDAD_DPGE-2022-001665-M y AGR-AGROCALIDAD_DPGE-2022-001664-M. Finalmente, en lo que respecta al cambio de anexos de informes de indicadores para el 2do trimestre, se realizó dicha solicitud mediante los siguientes casos de GLPI: 284623, 284579, 284569, 284688.</p> <p>En cuanto a reprogramaciones al POA, se realizaron dos, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000865-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000865-M, del 22 y 30 de agosto del año en curso, mismas que fueron aprobadas por la DPGE mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2022-001672-M.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>02/09/2022 - 04:56 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2022: Se realizaron las gestiones correspondientes para realizar las contrataciones pendientes a partir del primero de julio de 2022, esto considerando que quedó pendiente la contratación de 8 técnicos a nivel nacional y 1 analista TICs, de este total, de los cuales, solamente ingresaron 6 técnicos a nivel nacional (Carchí, Los Ríos, Napo y Santa Elena) y no se contrató el analista TICs.</p> <p>Por otro lado, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000554-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000668-M, se solicitó a la máxima autoridad la redistribución del personal (grupo 73), para incrementar 1 técnico distrital y de articulación territorial de Inocuidad de Alimentos (Pichincha), 3 Analistas Administrativos 1 (Sucumbíos, Santa Elena y Planta Central) y 1 Analista de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos 3, quienes, quienes se integraron al proyecto el 01 y 15 de julio de 2022.</p> <p>Adicionalmente, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000649-M, del 05 de julio de 2022, se remitieron Directrices sobre ingreso del personal de grupo de gasto 73 a julio 2022_ Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias, y mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000709-M, del 15 de julio, se informó sobre los responsables territoriales a nivel nacional_Proyecto Nacional para el Mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias</p> <p>En lo que respecta a los procesos de compras, se realizaron las siguientes gestiones:</p> <p>.Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000743-M: solicitud de adquisición de materiales de oficina para desarrollo de actividades inherentes a los procesos de capacitación de los sistemas de inocuidad implementados a nivel nacional.</p> <p>.Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000760-M: Solicitud de gestión para la contratación del servicio de "Material Impreso para la Coordinación General e Inocuidad de Alimentos".</p> <p>.Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000763-M: Solicitud gestión de compra para la adquisición de prendas de protección para los técnicos de vigilancia y certificación.</p> <p>Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2022-001146-M, se convocó aun taller para realizar la revisión fichas GPR proyectos de inversión, para lo cual, en dicho espacio se acordó realizar todos los ajustes relacionados con los hitos e indicadores del primer trimestre, sin embargo, para el proyecto de inocuidad queda pendiente finalizar el taller a fin de revisar los indicadores pendientes y proceder a los ajustes correspondientes, mismos que serán aprobados en el marco de la mencionada convocatoria.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>05/08/2022 - 03:03 PM</p>
<p>FEBRERO 2022: Mediante Oficio SNP-SPN-2022-0208-OF del 17 de febrero de 2022, la Secretaría Nacional de de Planificación emitió el dictamen de prioridad para el "Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias", por el período 2022 - 2025 con CUP 133340000.0000.386568, por un monto de USD 985.575,64 . El proyecto será ejecutado para mejorar el sistema de gestión de la inocuidad agropecuario para cumplir con las exigencias nacionales e internacionales. Se debe mencionar que la Secretaría Nacional de Planificación, emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos solicitado, condicionada a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fuente de financiamiento por parte del ente rector de las finanzas públicas, conforme en la ley; y, el cual es concordante con las competencias asignadas a esta Secretaría de Estado. Hasta la fecha la Agencia ha realizado las gestiones necesarias para obtener el presupuesto asignado para el proyecto y no encontramos en espera de la designación presupuestaria. Por lo que no se han podido ejecutar las actividades establecidas en el proyecto, en este sentido los hitos e indicadores se encuentran en ejecución 0 teniendo INCUMPLIMIENTO en su planificación. El presente resumen se carga a la presente fecha, en virtud del GLPI nro. 279153 con su respectiva aprobación, y conforme reunión mantenida el 07 de julio de 2022, convocada mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2022-001146-M.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>07/07/2022 - 10:34 PM</p>
<p>JUNIO 2022: Desde la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos, se solicitó la autorización de contratación de personal del grupo de gasto 73, para ingreso a partir del 01 de junio de 2022, para lo cual, se contempló la siguiente contratación: 46 técnicos a nivel nacional (2 por provincia), y 14 analistas para planta central (9 analistas Dirección de Inocuidad de Alimentos, 2 analistas Dirección de Orgánicos, 2 analistas TICs y 1 analista DIRCOM), de este total planificado (60 técnicos), ingresaron 38 técnicos a nivel nacional y 13 técnicos en planta central, quedando pendiente la contratación de 9 técnicos: Carchi (1), El Oro (1), Los Ríos (2), Napo (2), Orellana (1), Santa Elena (1). Planta Central: analista TICs (1). Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000524-M, del 01 de junio, se emitieron las directrices sobre ingreso de los técnicos del grupo 73, para lo cual, se realizó una capacitación sobre los temas técnicos tanto en temas de vigilancia como certificación, inherentes al cumplimiento de las metas y propósito del indicador.</p> <p>Adicionalmente, mediante correo electrónico del 16 de junio, el Coordinador General de Inocuidad de Alimentos remitió los formatos de documentos que se requiere para proceder con el pago del grupo de gasto 73 (730606), para lo cual, tras reuniones mantenidas con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica y Dirección General Administrativa Financiera, se procedió a</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>05/07/2022 - 11:21 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>realizar un taller a nivel nacional con todos los técnicos del grupo 73, a fin de explicar -de manera general- sobre el llenado de formatos e informes previo pago de honorarios, en función de lo estipulado en Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAF-2022-000285-M, del 18 de marzo del año en curso.</p> <p>Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000554-M, del 13 de junio, se solicitó a la máxima autoridad la modificación del distributivo actual del "Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias", en virtud de la actual necesidad institucional; en dicha solicitud se requirió la contratación adicional de: 3 servidores SP1 (personal administrativo): Planta Central, Sucumbíos y Santa Elena, 1 servidor SP1 (Técnico Distrital y Articulación Territorial de Inocuidad de Alimentos 3): Pichincha, en tal virtud, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000594-M, Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000595-M y Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000597-M, se solicitó la autorización de contratación de los técnicos pendientes y nuevos para contratar.</p> <p>Mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000569-M, se solicitó la 4ta reforma al POA edic. 10, con el propósito de solicitar avales y certificaciones presupuestarias para el pago de membresía CIAO, impresión de material para la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos, Adquisición de Materiales de Oficina, y adquisición de prendas de protección, esta solicitud se realizó mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CIA-2022-000570-M.</p>		
<p>MAYO 2022: El proyecto de inversión dio inicio a partir del mes de mayo del año en curso, por lo cual, ingresaron un total de 8 servidores a la Coordinación de Inocuidad de Alimentos. Durante este mes, se trabajó en la elaboración de los términos de referencia e informes justificativos, así como solicitud de avales y certificación presupuestaria, y solicitud de designación de administradores de contratos, para iniciar con el proceso de contratación de técnicos a nivel nacional y en planta central (personal planificado: 46 técnicos a nivel nacional, dos por provincia, y 3 analistas en planta central para las áreas de TICs y comunicación). Así mismo, se trabajó en la planificación de metas para el cumplimiento de indicadores del proyecto, así como en la preparación de lineamientos técnicos para garantizar el cumplimiento del propósito y metas del proyecto.</p> <p>Con el propósito de regularizar el ingreso de información en el sistema GPR, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (en reunión mantenida el 23 de junio de 2022), se procedió a solicitar la carga del presente resumen ejecutivo -a destiempo- mediante GLPI con nro. de caso 279158, en el cual se presentó la justificación del caso. Así mismo para los meses de febrero y abril, se solicitó la autorización para la carga de los resúmenes ejecutivos, esta solicitud se realizó mediante GLPI con nro. de casos 279153 y 279157; respectivamente.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>25/06/2022 - 07:47 PM</p>
<p>ABRIL 2022: Justificación reprogramación de hito Nro. 3: C1.I1. EJECUCIÓN - Informe de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales). Hito Nro. 4: C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica. Hito Nro. 5: C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias. Hito Nro. 6: C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM. Hito Nro. 7: C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad. Debido que hasta la fecha la Agencia ha realizado las gestiones necesarias para obtener el presupuesto asignado para el proyecto y nos encontramos en espera de la designación presupuestaria. Por lo que no se han podido ejecutar las actividades establecidas en el proyecto, en este sentido los hitos e indicadores se encuentran en ejecución 0 teniendo INCUMPLIMIENTO en su planificación.</p>	<p>Quintana Garzón, Natalia Piedad</p>	<p>17/05/2022 - 02:49 PM</p>
<p>MARZO 2022: Justificación reprogramación de hito Nro. 3: C1.I1. EJECUCIÓN - Informe de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales). Hito Nro. 4: C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica. Hito Nro. 5: C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias. Hito Nro. 6: C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM. Hito Nro. 7: C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad. Debido que hasta la fecha la Agencia ha realizado las gestiones necesarias para obtener el presupuesto asignado para el proyecto y nos encontramos en espera de la designación presupuestaria. Por lo que no se han podido ejecutar las actividades establecidas en el proyecto, en este sentido los hitos e indicadores se encuentran en ejecución 0 teniendo INCUMPLIMIENTO en su planificación.</p>	<p>Villalba Esteves, Carlos Andrés</p>	<p>06/04/2022 - 08:12 AM</p>
<p>MARZO 2022: Mediante Oficio SNP-SPN-2022-0208-OF del 17 de febrero de 2022, la Secretaría Nacional de de Planificación emitió el dictamen de prioridad para el "Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias", por el período 2022 - 2025 con CUP 133340000.0000.386568, por un monto de USD 985.575,64 . El proyecto será</p>	<p>Villalba Esteves, Carlos Andrés</p>	<p>31/03/2022 - 10:34 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ejecutado para mejorar el sistema de gestión de la inocuidad agropecuario para cumplir con las exigencias nacionales e internacionales. Se debe mencionar que la Secretaría Nacional de Planificación, emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos solicitado, condicionada a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fuente de financiamiento por parte del ente rector de las finanzas públicas, conforme en la ley; y, el cual es concordante con las competencias asignadas a esta Secretaría de Estado. Hasta la fecha la Agencia ha realizado las gestiones necesarias para obtener el presupuesto asignado para el proyecto y nos encontramos en espera de la designación presupuestaria. Por lo que no se han podido ejecutar las actividades establecidas en el proyecto, en este sentido los hitos e indicadores se encuentran en ejecución 0 teniendo INCUMPLIMIENTO en su planificación.		

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La renuncia de los técnicos CAURARÍA incumplimiento en la ejecución de las actividades planificadas	08/05/2023	Natalia Piedad Quintana Garzón	50	80	40	0/1

*Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. * General.</b> La falta de fortalecimiento del sistema de inocuidad en las cadenas agroalimentarias CAUSARÍA incumplimiento de la normativa nacional e internacional	08/05/2023	Natalia Piedad Quintana Garzón	80 %	90	72	0/2

*Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1*

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
2	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
3	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
4	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
5	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
6	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
7	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
8	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
9	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
10	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
11	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
12	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
13	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
14	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
15	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
17	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
18	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
19	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
20	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
22	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
23	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
24	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	006. DEFINICIÓN - Proyecto Nacional para mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias - PROINOCUIDAD, aprobado	4-Inicio de Trabajo	17/02/2022		17/02/2022		Sí	0.02
2	006. PLANIFICACIÓN - Dictamen de prioridad para el "Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias con CUP: 133340000.0000.386568" - Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, aprobado	4-Inicio de Trabajo	17/02/2022		17/02/2022		Sí	0.02
3	C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2022		05/07/2022		Sí	2.92
4	C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2022		05/07/2022		Sí	0.28
5	C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2022		05/07/2022		Sí	3.33
6	C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2022		05/07/2022		Sí	0.75
7	C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2022		05/07/2022		Sí	0.13
8	C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	0.83
9	C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	2.01
10	C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	4.44

HITOS








	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	0.63
12	C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2022		05/10/2022		Sí	1.09
13	C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	5-Entregables Intermedios	16/12/2022		16/12/2022		Sí	0.42
14	C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/12/2022		16/12/2022		Sí	2.05
15	C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/12/2022		16/12/2022		Sí	5.56
16	C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/12/2022		16/12/2022		Sí	0.73
17	C3.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	16/12/2022		16/12/2022		Sí	0.0
18	C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2022		22/12/2022		Sí	1.03
19	C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	5-Entregables Intermedios	05/04/2023		05/04/2023		Sí	0.0
20	C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/04/2023		05/04/2023		Sí	0.79
21	C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/04/2023		05/04/2023		Sí	0.0
22	C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/04/2023		05/04/2023		Sí	1.18
23	C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/04/2023		05/04/2023		Sí	0.75
24	C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2023		05/07/2023		Sí	2.5
25	C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2023		05/07/2023		Sí	0.79
26	C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con	5-Entregables Intermedios	05/07/2023		05/07/2023		Sí	1.11



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado							
27	C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2023		05/07/2023		Sí	1.18
28	C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/07/2023		05/07/2023		Sí	1.12
29	C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2023	05/10/2023			No	0.83
30	C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2023	05/10/2023			No	0.79
31	C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2023	05/10/2023			No	0.0
32	C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2023	05/10/2023			No	1.18
33	C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	05/10/2023	05/10/2023			No	1.12
34	C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2023	22/12/2023			No	0.42
35	C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2023	22/12/2023			No	1.18
36	C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2023	22/12/2023			No	1.11
37	C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2023	22/12/2023			No	1.18
38	C4.I1. EJECUCIÓN - Informe de implementación del sistema de trazabilidad en la producción, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2023	22/12/2023			No	16.0
39	C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	5-Entregables Intermedios	22/12/2023	22/12/2023			No	0.75
40	HITOS 2024	5-Entregables Intermedios	01/01/2024	31/12/2024			No	20.76
41	HITOS 2025	5-Entregables Intermedios	01/01/2025	31/12/2025			No	19.02

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C2.I1. Porcentaje de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica		96.23 %	0.061	0.0587	04/03/2022	Abr-Jun
2	C2.I2. Porcentaje de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias		100.00 %	0.0013	0.0013	17/02/2022	Abr-Jun
3	C3.I1. Número de actores capacitados en temáticas RAM		100.00 %	1,550	1,550	17/02/2022	Abr-Jun
4	C5.I1. Número de actores capacitados en temáticas de inocuidad		98.05 %	27,500	26,964	17/02/2022	Abr-Jun
5	F.I1. Índice de exportaciones agropecuarias y agroindustriales		-	-	-	17/02/2022	-
6	C1.I1. Número de notificaciones a incumplimientos de normativa internacional por presencia de contaminantes en productos		75.00 %	16	12	17/02/2022	Abr-Jun
7	C4.I1. Porcentaje de implementación del sistema de trazabilidad en la producción primaria agropecuaria		-	-	-	01/01/2023	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,943,022.84 **
Costo Total:	28,152,671.38
Total Devengado:	1,412,409.46
% Costo Total Devengado:	5.02 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 5.02 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	985,575.64	10,781,152.82	0.00	11,766,728.46
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	781,760.11	1,491,262.73	0.00	2,273,022.84
Ppto. Codificado	781,760.11	1,161,262.73	0.00	1,943,022.84
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2023)		9,619,890.09		
Programado a Devengar	781,760.11	1,161,262.73	0.00	1,943,022.84
Ppto. Devengado	781,760.11	630,649.35	0.00	1,412,409.46
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 781,760.11	0.00	0.00	781,760.11
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	1,161,262.73	0.00	1,161,262.73
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	54.31 %	0.00 %	72.69 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

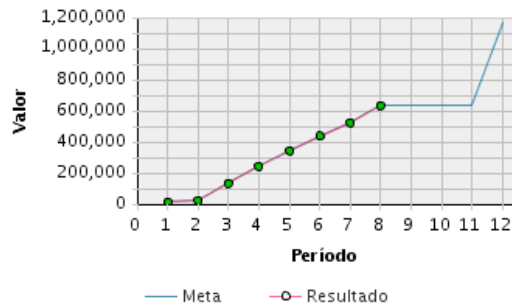

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	11,140.45	11,140.45	11,140.45	11,140.45	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.96 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	11,784.86	11,784.86	22,925.31	22,925.31	100.00 %		1.97 %
Mar	111,719.47	111,719.47	134,644.78	134,644.78	100.00 %		11.59 %
Abr	109,751.50	109,751.50	244,396.28	244,396.28	100.00 %		21.05 %
May	96,700.33	96,700.33	341,096.61	341,096.61	100.00 %		29.37 %
Jun	95,136.02	95,136.02	436,232.63	436,232.63	100.00 %		37.57 %
Jul	88,524.73	88,524.73	524,757.36	524,757.36	100.00 %		45.19 %
Ago	105,891.99	105,891.99	630,649.35	630,649.35	100.00 %		54.31 %
Sep	0.00		630,649.35				
Oct	0.00		630,649.35				
Nov	0.00		630,649.35				
Dic	530,613.38		1,161,262.73				
<b>Total</b>	<b>1,161,262.73</b>	<b>630,649.35</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la garantía de la inocuidad de los productos agropecuarios en su fase primaria de producción MEDIANTE el fortalecimiento de la vigilancia, control y certificación, así como la elaboración y actualización de la normativa.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN AL HITO 19: C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	C1.I1._Ejecución_Informes_notificaciones_recibidas_medios_signed-signed-signed-signed.pdf	05/04/2023
2	ASOCIACIÓN AL HITO 22: C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	C3.I1._Ejecución_informe_actores_capacitados_RAM-signed-signed-signed-signed.pdf	05/04/2023
3	006. DEFINICIÓN - Proyecto Nacional para mejoramiento del sistema de inocuidad en cadenas agroalimentarias - PRO INOCUIDAD Aprobado	1._Pro_Inocuidad.pdf	24/03/2022
4	006. PLANIFICACIÓN - Dictamen de prioridad para el "Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias con CUP: 133340 000.0000386568" Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	2._Dictamen_de_prioridad.pdf	24/03/2022
5	Acta del Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias	1._Acta_Proyecto_Inocuidad_18-03-2022f-signed-signed.pdf	23/03/2022
6	ASOCIACIÓN AL HITO 10: C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	inf_hito_C2.I2_III_trim_2022-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
7	ASOCIACIÓN AL HITO 10: C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado_OBSOLETO	Informe_HITOC2I2_BPA_III_TRIMESTRE-signed-signed-signed-signed.pdf	05/10/2022
8	ASOCIACIÓN AL HITO 10: unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias_OBSOLETO	Informe_Hito_BPA_II_TRIMESTRE-signed-signed-signed.pdf	05/07/2022
9	ASOCIACIÓN AL HITO 11: C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	inf_hito_C3.I1_III_trim_2022-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
10	ASOCIACIÓN AL HITO 11: C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado_OBSOLETO	Informe_hito_C3.I1._Número_actores_capacitados_RAM_JULIO-SEPTIEMBRE_2022-signed[5456]-signed-signed-signed-signed.pdf	05/10/2022

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ASOCIACIÓN AL HITO 11: Informe de actores capacitados en temáticas RAM_OBSOLETO	2._Informe__hito_2do_trimestre_componente_3-signed-signed.pdf	05/07/2022
12	ASOCIACIÓN AL HITO 12: actores capacitados en temáticas de inocuidad_OBSOLETO	1._Informe__hito_2do_trimestre_componente_5-signed-signed.pdf	05/07/2022
13	ASOCIACIÓN AL HITO 12: C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	INFORM_3-signed-signed.pdf	05/10/2022
14	ASOCIACIÓN AL HITO 13: C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	inf_hito_C1.11_IV_trim_2022-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
15	ASOCIACIÓN AL HITO 14: C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	inf_hito_C2.11_IV_trim_2022-signed-signed-signed_(1)-signed.pdf	03/07/2023
16	ASOCIACIÓN AL HITO 15: C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	inf_hito_C2.12_IV_trim_2022-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
17	ASOCIACIÓN AL HITO 16: C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias_OBSOLETO	2._informe_HITO_C212_BPA_IV_tirimestre-signed-signed-signed-signed.pdf	22/12/2022
18	ASOCIACIÓN AL HITO 16: C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	inf_hito_C3.11_IV_trim_2022-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
19	ASOCIACIÓN AL HITO 17: C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM_OBSOLETO	Informe_hito_C3.11._Número_actores_capacitados_RAM_OCTUBRE-DICIEMBRE_2022-signed-signed-signed-signed.pdf	23/07/2022
20	ASOCIACIÓN AL HITO 18: C3.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad_OBSOLETO	INFORM_3-signed-signed.pdf	23/12/2022
21	ASOCIACIÓN AL HITO 18: C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	inf_hito_C5.11_IV_trim_2022-signed-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
22	ASOCIACIÓN AL HITO 20: C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	C2.11._Ejecución_Informe_actores_orgánicos_sancionados-signed-signed-signed-signed.pdf	05/04/2023
23	ASOCIACIÓN AL HITO 21: C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	inf_hito_C2.12_I_trim_2023-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
24	ASOCIACIÓN AL HITO 21: C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado_OBSOLETO	C2.12._Ejecución_Informe_BPPSA-signed-signed-signed-signed-signed.pdf	05/04/2023
25	ASOCIACIÓN AL HITO 23: C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	C5.11._HITO_capacitaciones-signed-signed-signed.pdf	20/04/2023
26	ASOCIACIÓN AL HITO 24: C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	inf_hito_C1.11_II_trim_2023-signed-signed-signed-signed.pdf	05/07/2023
27	ASOCIACIÓN AL HITO 25: C2.11. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	inf_hit_C2.11_II_trim_2023-signed-signed-signed-signed.pdf	05/07/2023
28	ASOCIACIÓN AL HITO 26: C2.12. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	inf_hito_C2.12_II_trim_2023-signed-signed-signed-signed.pdf	05/07/2023
29	ASOCIACIÓN AL HITO 27: C3.11. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	inf_hito_C3.11_II_trim_2023-signed-signed-signed-signed.pdf	05/07/2023
30	ASOCIACIÓN AL HITO 28: C5.11. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	inf_hito_C5.11_II_trim_2023-signed-signed-signed-signed.pdf	05/07/2023
31	ASOCIACIÓN AL HITO 3 C1.11. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	inf_hito_C1.11_II_trim_2022-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
32	ASOCIACIÓN AL HITO 4: C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	inf_hito_C2.I1_II_trim_2022-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
33	ASOCIACIÓN AL HITO 5: C2.I2. EJECUCIÓN - Informe de unidades de producción con sistemas de gestión en Buenas Prácticas Agropecuarias, aprobado	inf_hito_C2.I2_II_trim_2022-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
34	ASOCIACIÓN AL HITO 6: C3.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores capacitados en temáticas RAM, aprobado	inf_hito_C3.I1_II_trim_2022-signed-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
35	ASOCIACIÓN AL HITO 7: C5.I1. EJECUCIÓN - Reportes y listas de asistencias actores capacitados en temáticas de inocuidad, aprobado	inf_hito_C5.I1_II_trim_2022-signed-signed-signed-signed-signed.pdf	03/07/2023
36	ASOCIACIÓN AL HITO 8: C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales), aprobado	3_Informe_hito_III_trimestre_041022_cft-signed-signed-signed-signed.pdf	05/10/2022
37	ASOCIACIÓN AL HITO 8: Informes de notificaciones recibidas_OBSOLETO	2_Informe_hito_trimestre_050722_cft-signed-signed.pdf	05/07/2022
38	Asociación al HITO 9: C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica, aprobado	3_Informe_Hito_C2.I1_TERCER_TRIMESTRE_Julio_-_Septiembre_2022_(1)-signed-signed-signed-signed.pdf	05/10/2022
39	ASOCIACIÓN AL HITO 9: informe de actores sancionados producción orgánica_OBSOLETO	1_Informe_hito_trimestre_actores_sancionados-signed-signed-signed-signed.pdf	05/07/2022
40	ASOCIACIÓN AL HTO 14: C1.I1. EJECUCIÓN - Informes de notificaciones recibidas por medios oficiales (Comercio Exterior, portales)	1_Informe_hito_C1.I1_EJECUCIÓN_Informe_notf_recibidas_por_medios_oficiales_signed-signed-signed.pdf	22/12/2022
41	ASOCIACIÓN AL HTO 15: C2.I1. EJECUCIÓN - Informe de actores sancionados en el sistema de gestión de producción orgánica	2_Informe_hito_C2.I1_CUARTO_TRIMESTRE_Octubre_-_Diciembre_2022-signed-signed.pdf	22/12/2022
42	ASOCIACIÓN RIESGO Capacitar a los actores en temas de cultura de inocuidad de alimentos	INFORME_RIESGO_GPR_NÚMERO_ACT._CAPACITADOS-signed-signed-signed-signed-signed.pdf	05/10/2022
43	Cédula presupuestaria ABRIL 2023	CEDULA_ABRIL_INOCUIDAD.pdf	03/05/2023
44	Cédula presupuestaria AGOSTO 2022	2_CEDULA_SALDOS_INOCUIDAD_AGOSTO.pdf	07/09/2022
45	Cédula presupuestaria AGOSTO 2023	4_CEDULA_AGOSTO_INOCUIDAD.pdf	04/09/2023
46	Cédula presupuestaria DICIEMBRE 2022	38_Cédula_Saldos_Disp._INOCUIDAD_23.12.2022.pdf	23/12/2022
47	Cédula presupuestaria ENERO 2023	CEDULA_INOCUIDAD_enero_2023.pdf	02/05/2023
48	Cédula presupuestaria FEBRERO 2023	6_CEDULA_SALDOS_INOCUIDAD_03-03-23.pdf	03/03/2023
49	Cédula presupuestaria JULIO 2022	1_CEDULA_INOCUIDAD_JULIO.pdf	05/08/2022
50	Cédula presupuestaria JULIO 2023	3_CEDULA_INOCUIDAD_JULIO.pdf	02/08/2023
51	Cédula presupuestaria JUNIO 2023	2_CEDULA_INOCUIDAD_JUNIO.pdf	03/07/2023
52	Cédula presupuestaria MARZO 2023	10.1_ced-sd_inocuidad_marzo.pdf	05/04/2023
53	Cédula presupuestaria MAYO 2022	0_cedula_presupuestaria_de_mayo_2022.pdf	15/08/2022
54	Cédula presupuestaria MAYO 2023	1_CEDULA_MAYO_INOCUIDAD.pdf	13/06/2023
55	Cédula presupuestaria MAYO 2023_OBSOLETO	Cédula_presupuestaria_MAYO_2023.pdf	05/06/2023
56	Cédula presupuestaria NOVIEMBRE 2022	35_Cédula_Saldos_Disp._INOCUIDAD_01.12.2022.pdf	01/12/2022
57	Cédula presupuestaria SEPTIEMBRE 2022	23_Cédula_mes_Septbre_INOCUIDAD.pdf	05/10/2022
58	Delegación de responsables del seguimiento de hitos e indicadores 2023	4_AGR-AGROCALIDAD_CIA-2023-000174-M_responsabilidad_de_hitos_e_indicadores.pdf	23/02/2023
59	Designación de líder del proyecto	2_AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000438-M_alcance_designación_líder_proyecto.pdf	25/10/2022
60	Designación de líder del proyecto DE	1_AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000412-M_solicitud_de_designación_líder_de_inocuidad.pdf	09/03/2023
61	Designación de líder del proyecto DE_hoja de ruta	1.1_Hoja_de_ruta_AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000412-M.pdf	09/03/2023
62	DOCUMENTACIÓN RELEVANTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN	3_CGE_-_levantamiento_analisis_PGC_2022-03-18-signed.pdf	18/03/2022

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
63	Informe final 2022	1._Informe_anual_proyecto_de_inversión_2022-signed-signed-signed.pdf	23/12/2022
64	Levantamiento de información relevantes 2023	3._CGE_-_levantamiento_de_informacin_relevante_y_analisis_INOCUIDAD.pdf	23/02/2023
65	Plan de acción_ENERO-MARZO 2023	1._ACR_I_trim_inocuidad.xls	20/06/2023
66	Plan de acción_ENERO-MARZO 2023_OBSOLETO	1.3_ACR_I_trim_inocuidad.xls	17/04/2023
67	Registro del historial de indicadores 2023	1._CGE_-_Registro_Historial_Indicadores_proyecto_inocuidad-signed.pdf	23/02/2023
68	Reporte a Abril del Proyecto Inocuidad	2022_Project_Highlights_2022_5_17.pdf	17/05/2022
69	Reporte a Marzo del Proyecto Inocuidad	2022_Project_Highlights_2022_4_5.pdf	06/04/2022
70	Solicitud de asignación para designación de líder	1._AGR-AGROCALIDAD_CIA-2022-000453-M_solicitud_de_designación_de_líder.pdf	25/10/2022

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cuichan Guanoluisa, Ismael Remigio	Especialista técnico del Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias	Analista de Certificación de Productos Primaria y Buenas Prácticas 3	ismael.cuichan@agrocalidad.gob.ec	
Moreno Valarezo, Carla Rebeca	Líder técnico del Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias	Directora de Inocuidad de los Alimentos	carla.moreno@agrocalidad.gob.ec	
Moreno Valarezo, Carla Rebeca	Líder de logística del Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias	Directora de Inocuidad de los Alimentos	carla.moreno@agrocalidad.gob.ec	
Quintana Garzón, Natalia Piedad	Líder de del Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias	Líder del Proyecto Nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias	natalia.quintana@agrocalidad.gob.ec	
Álvarez Vásquez, José Eduardo	Coordinador Administrativo del Proyecto nacional para el mejoramiento del sistema de la inocuidad en cadenas agroalimentarias	Analista de Certificación de Producción Primaria y Buenas Prácticas 3	jose.alvarez@agrocalidad.gob.ec	0984533899
